

**Raporti i vitit 2016****Tetor 01-31/10/2016**

1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave gjatë muajit tetor 2016, ka kryer këto aktivitete: Kërkesat për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e nevojave, shqyrtimin e kërkesave të banorëve të bashkësive lokale dhe inkorporimin e tyre në planet e Komunës, njoftimin me kohë të kompanive publike dhe subjekteve relevante, me qëllim të koordinimit të punëve, incizimin e gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e Prishtinës, si dhe kompletimin e dokumentacionit teknik për procedimin e tyre në organet kompetente, mbikëqyrjen e realizimit të projekteve konform marrëveshjes etj.

1.1. Shqyrtimi i kërkesave

Gjatë muajit tetor 2016, Drejtoria ka proceduar 182 kërkesa të ndryshme të bashkësive lokale dhe banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e rrugëve dhe kanalizimeve, kërkesa nga kompanitë publike - leje për gropim dhe intervenime për sanimin e defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve për kontrollimin e punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth definimit të zgjidhjes në terren etj. Nga numri i përgjithshëm prej 182 kërkesave të pranuar, 129 janë zgjidhur, ndërsa 53 kërkesa janë në përfundim e sipër.

1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe Identifikimin e nevojave

Duke marrë për bazë Ligjin mbi planifikimin hapësinorë, Ligjin mbi ndërtimin e objekteve investive, si dhe Ligjin për projektim, e në veçanti planet rregulluese, janë dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese për këto rrugë në zonat urbane dhe rurale.

1.3. Raportimi i menaxherëve të projekteve infrastrukturore

PRISHTINA



RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA

01

Projekti :	Ndërtimi i rrugës “Stanbolli” - faza e dytë	Vlera e projektit: 649.285,3 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik :120 ditë
Operatori :	Sh.p.k. Jehona Company	Nr 616 13 185 511 dt.20/03/2015
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn ;	Projekti i vitit 2015
Organi mbikëqyrës :	IC Consulente	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> Vendosja e shtyllave të ndriçimit 					
	Punët në realizim	Pregaditja për vendosjen e sinjalizimit vertikal dhe horizontal te trupit te rruges					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50 000.0	50 000.0	63745.57	76.693.24	50.066.60	50.000.00
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
		20.366.10	50.000.0	100.000.0	26.052.62		
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	<ul style="list-style-type: none"> Është urdhëruar operatori nga organi mbikëqyrës që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve. Kemi pengesa nga banorët e lagjes gjatë ekzekutimit të punimeve, gjegjësisht rreth pronave private. 						
Vlerësimi i progresit në projekt	<ul style="list-style-type: none"> Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik. Kemi vonesa të arsyeshme për shkak të mos shpronësimit të parcelave ne fillim të rrugës, si mungesë e dokumentacionit – shënimeve nga Drejtoria e Pronës. 						






RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 02					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës “ Enver Maloku” - faza e parë	Vlera e projektit: 1 187 768,19 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 140 ditë					
Operatori :	“Beni – Com” Sh.p.k	Nr.616 13 036 511 dt.18,10,2013					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn ;	Projekti i vitit : 2013					
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi, idh, Bujar Rama idgj.,Amire Krasniqi ide.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> ● Shenjëzimi horizontal i trupit të rrugës; ● Vendosja e shtyllave të ndriçimit. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Përgatitja për vendosjen e dritave LED të ndriçimit 					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		34.869,95 €	59.992,00€	80.311,00 €	32.500,00 €	102 869.80	312 508.30
	Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)	
	102.929.80	94.019.30	50.000.0	50.000.0	100.000.0		
Vonesat Shkalla e cilësisë	--			Mesatar			
Rekomandime masat për tu ndërmarë	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Është njoftuar Drejtoria e Prokurimit dhe D. e Pronës dhe Financave për probleme pronesor-juridike. 						
Vlerësimi i progresit në projekt	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Parashihen vonesa në projekt për shkak të problemeve pronesore - juridike dhe dislokimit te gypit furnizues F600 mm të ujësjellësit të paparapara me projekt 						




 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 03					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës “ Enver Maloku” – faza e dytë					Vlera e projektit: 847.542,44 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik :140 ditë	
Operatori :	Sh.p.k “Ledi Ing&Kastrioti”					Nr 616 14 042 511 dt.14/08/2014	
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn ;					Projekti i vitit 2014	
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi idh., Aferdita Sopi idgj., Amire Krasniqi ide. Habib Qorri idk., Behxhet Gashi, tek. ndërt.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	☞ Shenjëzimi vertikal dhe horizontal					
	Punët në realizim	☞ Ndërtimi i mureve mbrojtëse në fazën e parë					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
		Situacioni (XIII)	Situacioni (XIV)				
		50 000.00 €	50 000.00 €	66 691.00 €	51.388.0 €	51.300.0 €	60 000.00 €
		90 400.0 €	54 600.0	50.000.0€	50.500.0€	50.900.0 €	50.000.00
	50.000.00	50.000.00					
Vonesat Shkalla e cilësisë	--			Mesatar			
Rekomandime, masat për t’u ndërmarë	☞ Është njoftuar Drejtoria e Prokurimit dhe D. e Pronës dhe Financave për probleme pronëso-ro-juridike.						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Parashihen vonesa në projekt për shkak të problemeve pronësore - juridike Shpronësimet në tërësi ende nuk kanë përfunduar në pjesën e rrethrotullimit						





 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 04					
Projekti :	Implementim i projektit të nyjave në fund të rrugës “Avdyl Rama”, dislokimi i trafos, shtyllave elektrike dhe trajtimi i zonës	Vlera e projektit: 132,049.10 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 60 ditë					
Operatori :	Sh.p.k. “Veha Group” dhe “Arding” Sh.p.k	Nr.616 16 069 521 dt.08,06,2016					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra idn ;	Projekti i vitit : 2016					
Organi mbikëqyrës :	Behxhet Gashi , tek.ndert. Amire Krasniqi inxh. elektro.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<input checked="" type="checkbox"/> Vendosja e skajoreve të betonit C-25/30 <input checked="" type="checkbox"/> Vendosja e shtyllave të ndriçimit (betonit)					
	Punët në realizim	- Vendosja e kubezave të betonit					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50 000.0	50 000.0				
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime masat për t’u ndërmarre	Është obliguar operatori qe të bëjë sigurimin e gropës. Çdo fatkeqesi që ndodh si pasojë e mossaigurimit te gropës së ndërtimit, operatori bart përgjegjësinë.						
Vlerësimi i progresit në projekt	Punimet jane duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik. Për shkak të hapësirës së vogël në punishte ka ngecje te punimeve, duke e pasur parasysh që duhet krijuar hapësirë për qarkullimin e banoreve të lagjes.						





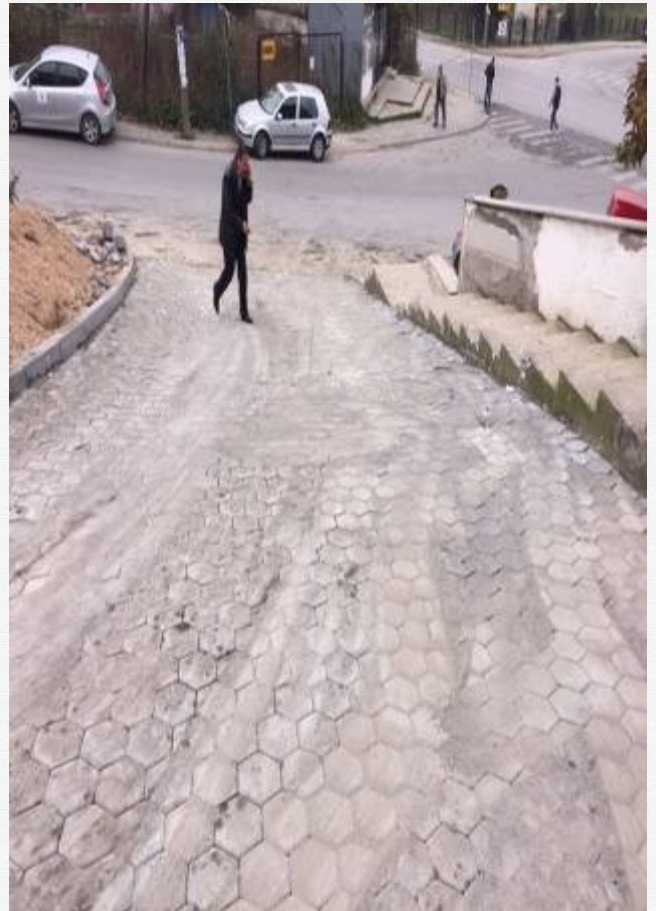



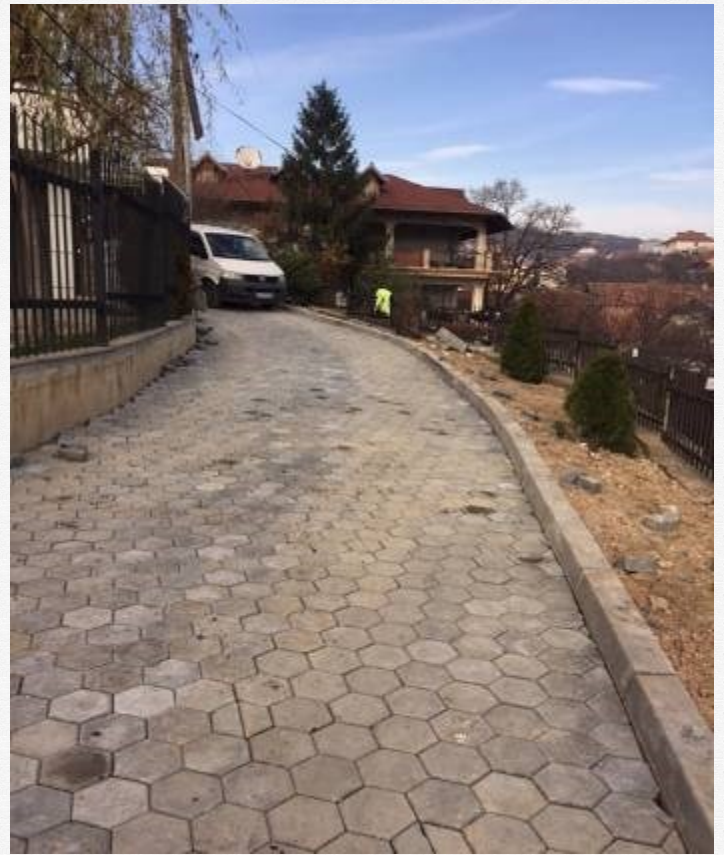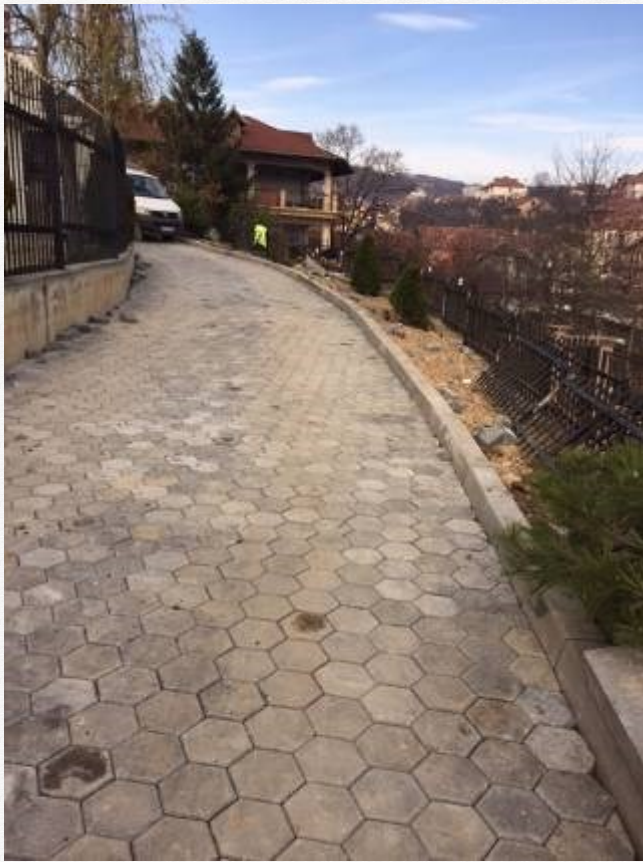


RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 05					
Projekti :	Rregullimi i shtratit të lumit Prishtina, faza I, segmenti Fusha e Pajtimit	Vlera e projektit: 398,401.78 €.					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 150 ditë					
Operatori :	“Rexha” sh.p.k & N.T.P.” Fidani – L” Sh.p.k. Prishtinë	616 14 021 511 26.05.2014					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emraidn	Projekti i vitit 2014					
Organi mbikëqyrës :	Fatmir Uka, idn, Bujar Rama, gjeod.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	1.Rregullimi i shtratit të lumit; 2.Punimi i murit mbrojtës; 3.Punimi i kanalizimit fekal.					
	Punët në realizim	- Projekti nuk ka përfunduar ende. Në vitin 2014, nuk është punuar për arsye të shpronësimit. Më pas ka pas të reshura dhe është vështirësuar punimi i kanalizimit, por me rregullimin e kohës do të vazhdohet me punët e mbetura.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)		
		50 000.0 €	50 000.0 €	50 000.0 €	50 000.0 €		
Rekomandime masat për tu ndërmarë	- Është obliguar operatori nga organi mbikëqyrës, që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve.						
Vlerësimi i progresit në projekt	- Punimet nuk janë ndërprerë deri në zgjidhjen e kontesteve pronësore – juridike.						

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 06					
Projekti :	Ndërtimi i bulevardit mbi Kurriz	Vlera e projektit: 977,725.51 €.					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 180 ditë					
Operatori :	“Rexha” sh.p.k & N.T.P.” Fidani - LSh.p.k” Prishtinë	616 15 025 511 12.06.2015					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra idn	Projekti i vitit 2015					
Organi mbikëqyrës :	Fevzi Jetullahu, Amire Krasniqi, Ramadan Nebihi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	1. Demolim i shtresave; 2.Punim i hidroizolimit; 3.Punimi i estrihut.					
	Punët në realizim	- Projekti ka filluar me fazën e demolimit sipas projektit dhe hidroizolimit					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Sit.I	Sit.II	Sit.III	Sit.IV	Sit.V	Sit.VI
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€
		Sit.VII	Sit.VIII	Sit.IX			
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€			
	Aneks kontrata	50,000.00€					
	Furnizimi me material	61,865.40€					
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	Është obliguar operatori nga organi mbikqyrës që të bëjë planin dinamik në zona.						
Vlerësimi i progresit në projekt	- Punimet janë duke u realizuar në bazë të projektit kryesor me detaje plotësuese nga projektuesi.						





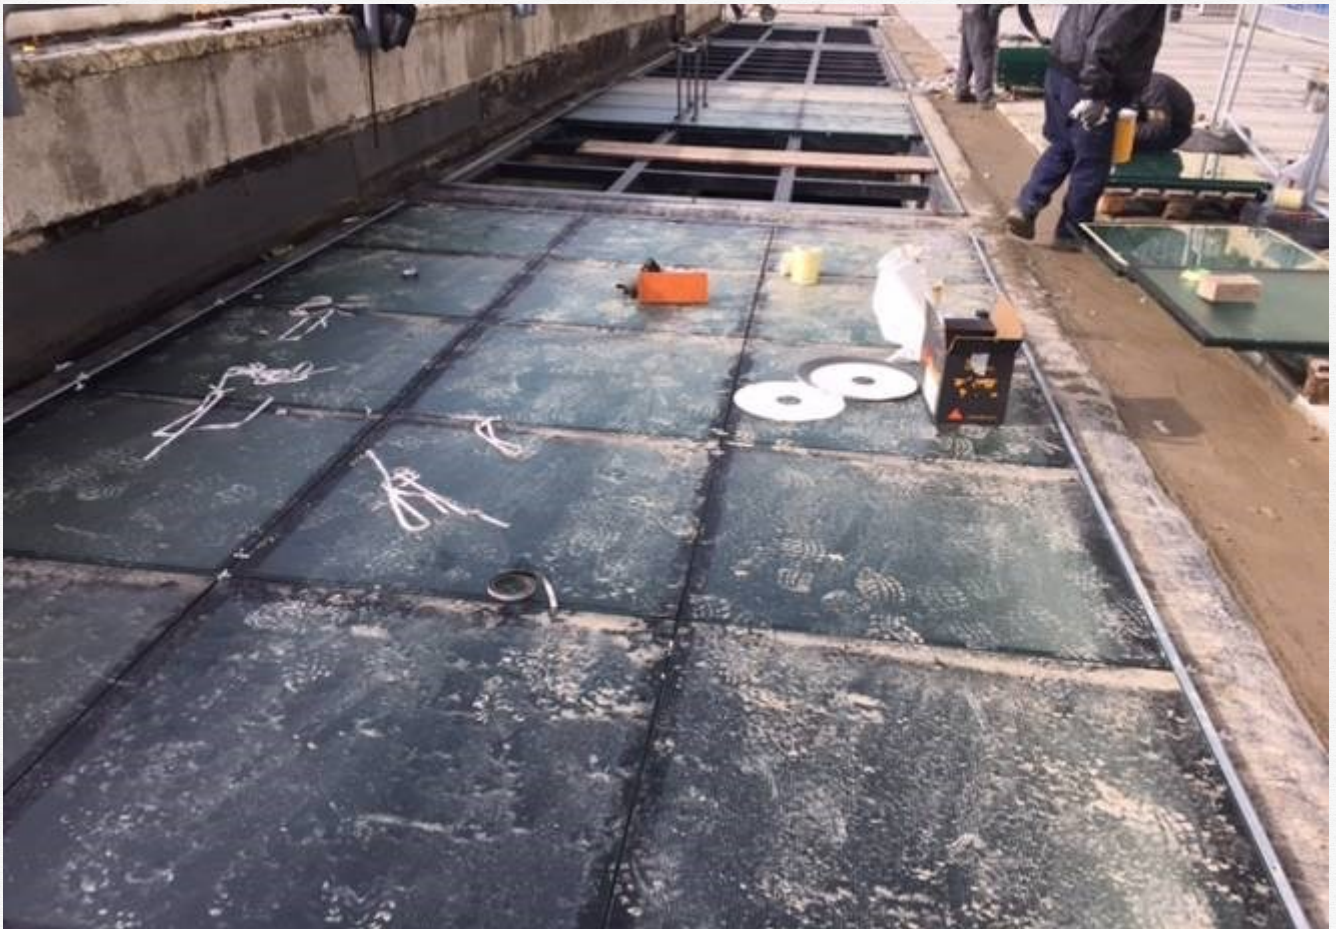

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 07					
Projekti :	Rikonstruktimi i rruges “ Garibaldi” dhe “Perandori Justinjan”, Prishtine	Vlera e projektit: 238,559.30 €.					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	N.N.T. “Eing Com” Prishtinë	616 15 114 521 06.07.2015					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra idn	Projekti i vitit 2015					
Organi mbikëqyrës :	Fevzi Jetullahu Amire Krasniqi Ramadan Nebihi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	1.Demolim i trotuarit dhe skajoreve, shtresim me tampon, ngjeshje dhe pllako					
	Punët në realizim	- Projekti eshte ne perfundim te punimeve, pozicioni I ndriçimit dhe uleset kane mbet si perfundim. Per permbylljen e punimeve.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Sit.I	Sit.II	Sit III	Sit IV		
		50,000.00€	31 462.71 €	50,000.00€	50,000.00€		
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë	- Është urdhëruar operatori nga organi mbikëqyrës që të respektojë kohën e planifikuar.						
Vlerësimi i progresit në projekt	- Punimet janë duke u realizuar në bazë të projektit ideor, me plotësime dhe ndryshime nga projektuesit e Drejtorisë së Urbanizmit.						

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 08					
Projekti :	Ndërtimi i kanalizimit fekal në Bardhosh , disa lagje në Barilevë dhe lagjen e 5-të Prugovc Nr. 616 16 044 511						Vlera e projektit: 373,144.00 €
Investitori :	Komuna e Prishtinë						Plani dinamik: 120 ditë
Operatori :	N.N.T.P.P “Gashi Ing ” adresa “Nebih Hodo Kuqi” – Suharekë						Inspektimi: 19.07.2016
Menaxheri i projektit :	Krenar Xhaferi Afërdita Sopi Irfete Zejneli						Projekti i vitit 2016
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Mobilizimi i ndërmarrjes për fillim të punimeve; - Punimimi i rrjetit të kanalizimit fekal në tri segmente në Barilevë; - Punimimi i rrjetit të kanalizimit fekal në një segmente në Prugovc.					
	Punët në realizim	- Janë duke vazhduar punimet në Bërnice dhe Bardhosh.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Vonesat Shkalla e cilësisë	Për momentin nuk parashihen vonesa			E knaqshme			
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë	<ul style="list-style-type: none"> - Është rekomanduar punëkryesi që të respektojë kontratën dhe cilësia e materialeve të jetë konformë kontratës; - Të rrisë dinamikën e punimeve. 						
Vlerësimi i progresit në projekt	- Deri më tani punimet janë duke u zhvilluar sipas kontratës.						

Foto 1



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 09
Projekti :	Ndërtimi rrugës “Perandori Justinjan” përball Katedrales – Prishtinë, nr. 616 15 148 521	Vlera e projektit: 211,870.40 €
Investitori :	Komuna e Prishtinë	Plani dinamik: 90 ditë
Operatori :	N.N.T “Eing Com” fshati Dumosh –K.Podujevë	Inspektimi: 22.07.2016
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli ; Krenar Xhaferi; Amire Krasniqi	Projekti i vitit 2015.

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Incizimi i gjendjes ekzistuese; -Evidentimi i instalimeve nëntokësore; -Demolimi i pjesës ekzistuese të asfaltit; -Gërmimi i trupit të rrugës; -Punimi i rrjetit ujësjellësit; -Punimi i kanalizimit atmosferik; -Punimi i kanalizimit fekal ; -Punimi i shtresës stabilizuese në pjesën e rrugës; - Punimi i shtresës së tamponit 0-63mm në pjesën e rrugës dhe trotuareve; -Punimi i shtresës së zhavorrit 0-31.5 mm në rrugë dhe një pjesë në trotuare; -Vendosja e skajorëve 15/30/100 me MB40 ; -Punimi i shtresës së bitozhavorit BZH22.; -Vendosja e skajorëve 8/20/100; -Shtrimi i pllakave në pjesë të trutoarit; Shtrimi i shtresës së AB; Vendosja e ulëseve; Vendosja e shportave; Punimi i ndriçimit publik. 					
	Punët në realizim	Plotësimi i atesteve të materialeve për punët e realizuara.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		39,149.90	50 000.00€	50 000.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Pagesa për kontratë të furnizimit në këtë projekt		9,404.72€			Situacioni i punëve shtesë: 20 999.59€		
Vonesat Shkalla e cilësisë		Vonesat do të ndodhin për shkak të punëve shtesë .			E favorshme		
Rekomandime masat për t’u ndërmarrë		Është rekomanduar punekryesi që të respektojë kontratën, cilësia e materialeve të jetë konformë kontratës dhe të rrisë dinamikën e punimeve.					
Vlerësimi i progresit në projekt		- Parashihen vonesa në projekt për shkak të punëve shtesë .					




RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 10					
Projekti :	Asfaltimi i rrugës në Hajvali	Vlera e projektit: 468,015.78 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 140 ditë					
Operatori :	Grupi i OE „Bageri & Ulpiana”	nr.identifikues: 616 14 116 511					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla idn ;	Projekti i vitit 2014					
Organi mbikëqyrës :	Fatmir Uka,Bujar Rama						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Ndërtimi i kanalizimit atmosferik, në gjatësi prej 1600 m; -Ndërtimi i kanalizimit fekal, në gjatësi prej 1600 m; -asfaltimi i rrugës.					
	Punimet në realizim-vërejtjet	-Punimet janë në përmbyllje. Vrejtje: Punimet janë stërzgjatur për shkakë të kontesteve pronësore					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		(1,2,3,4,5) (2015)					(
		341,142.61					



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 11					
Projekti :	Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotuaret e komunës së Prishtinës për vitin 2016.	Vlera e projektit: 298,070.00€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 12 muaj					
Operatori :	SHPK "Toifor"	nr.identifikues: 616 16 092 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla idn ;	Projekti i vitit 2016					
Organi mbikëqyrës :	Zyhrije Pllana ; Bexhet Gashi;						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-sanimi i gropave me asfalt; -sanimi i rrugëve me kubza; -furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave.					
	Punët në realizim e sipër	-sanimi i gropave me asfalt; -sanimi i rrugëve me kubza; -furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	Situacioni 2	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		gusht	shtator				
		32,525.50€	36,240.00€				




RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 12					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës “Hasan Remniku”, Kolovicë	Vlera e projektit: 186,929.08€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	OE „Gashi Ing”	nr.identifikues: 616 15 092 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla idn ;	Projekti i vitit 2015					
Organi mbikëqyrës :	Behgjet Gashi ; Azem Buzuku						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-kanalizimi fekal; -kanalizimi atmosferik; -shtruarja e rrugëve me shtresën finale-kubza.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë nw përmbyllje					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (1,2) 2015	Situacioni gusht	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		87,362.51€	50,000.00€				

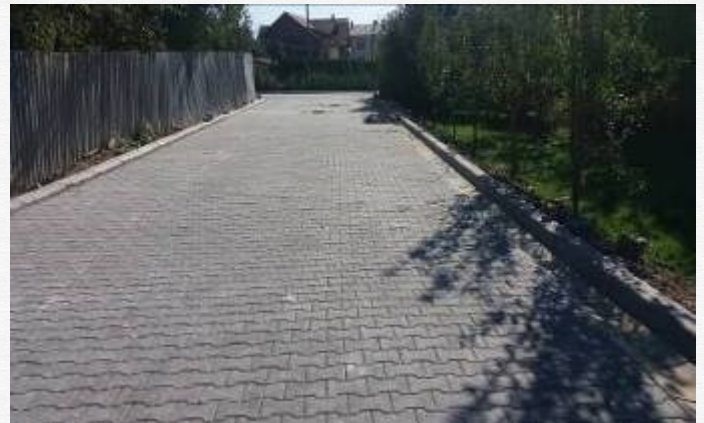

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 13					
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në lagjen “Hajvalia”	Vlera e projektit: 200,025.00€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 50 ditë					
Operatori :	OE „Gerlica Company”	nr.identifikues: 616 15 190 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla idn ;	Projekti i vitit 2015					
Organi mbikëqyrës :	Ramadan Nebihu ; Enolida						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-kanalizimi fekal 1A; -tamponizimi i disa rrugëve; -shtruarja e disa rrugëve me shtresën finale-kubza.					
	Punët në realizim e sipër	- Tash për tash kemi disa ndërprerje për shkakë të disa kontesteve pronësore.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (1)-2015	Situacioni (2)maj	Situacioni (3) qershor	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		25,000.00€	50,000.00€	50,000.00€			



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 14					
Projekti :	Ndërtimi i infrastrukturës në rrugën “Hysen Terpeza” dhe krahët e saj në lagjen “Veterniku”	Vlera e projektit: 317,005.30€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	OE „Gerlica Company”	nr.identifikues: 616 15 237 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn ;	Projekti i vitit 2015					
Organi mbikqyrës :	Zyhrije Pllana ; Azem Buzuku						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-një pjesë e kanalizimit fekal dhe atmosferik; -hapja e trasës dhe tamponizimi i disa rrugëve; -vendosja e skajorëve dhe shtrimi me kubza.					
	Punët në realizim e sipër	-punimet janë në përmbyllje.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V) shtator	Situacioni (VI)
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	

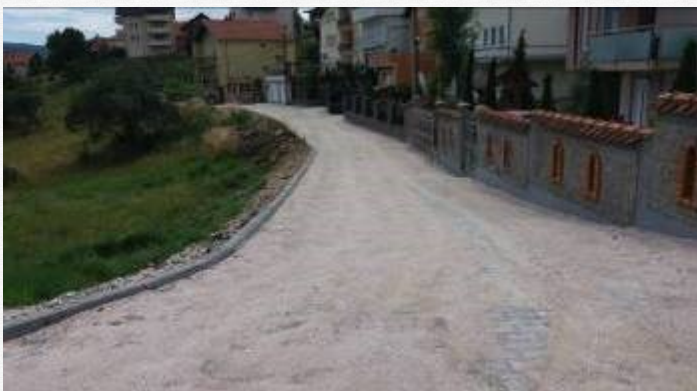

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 15					
Projekti :	Ndërtimi i në rrugëve në lagjet “Veterniku” dhe “Mati”	Vlera e projektit: 390,262.10€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	OE „Gerlica Company”	nr.identifikues: 616 16 057 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla idn ;	Projekti i vitit 2016					
Organi mbikëqyrës :	Behgjet Gashi ; Enolida Berisha						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-hapja e trasesë dhe tamponizimi i disa rrugëve; -vendosja e skajorëve dhe shtrimi me kubza.					
	Punët në realizim e sipër	--hapja e trasesë dhe tamponizimi i disa rrugëve; -vendosja e skajorëve dhe shtrimi me kubza.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)-gusht	Situacioni (II)	Situacioni (III) shtator	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €			




RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 16					
Projekti :	Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali-faza II.	Vlera e projektit: 414,828.79€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	SHPK "Vizion Capital Partners" dhe "Conex Group"	nr.identifikues: 616 16 088 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla idn ;	Projekti i vitit 2016					
Organi mbikëqyrës :	Zyhrije Pllana. Fevzi jetullahu ; Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-betonimi i themeleve, trajeve dhe shtyllave					
	Punët në realizim e sipër	-betonimi i shtyllave dhe përgatitja për pllakën e përdhesës					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I) shtator	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000.00€					



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 17					
Projekti :	Rindërtimi,sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve dytësore, si dhe rindërtimi,sanimi i kanalizimeve fekale parësore dhe dytësore.	Vlera e projektit: 314,913.50€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 12 muaj					
Operatori :	SHPK "Toifor"	nr.identifikues: 616 16 097 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla idn ;	Projekti i vitit 2016					
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi. Afërdita Sopi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-sanimi i kanalizimeve; -hapja, zgjerimi dhe tamponizimi i rrugëve rurale.					
	Punët në realizim e sipër	-sanimi i kanalizimeve; -hapja,zgjerimi dhe tamponizimi i rrugëve rurale.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I) shtator	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000.00€					



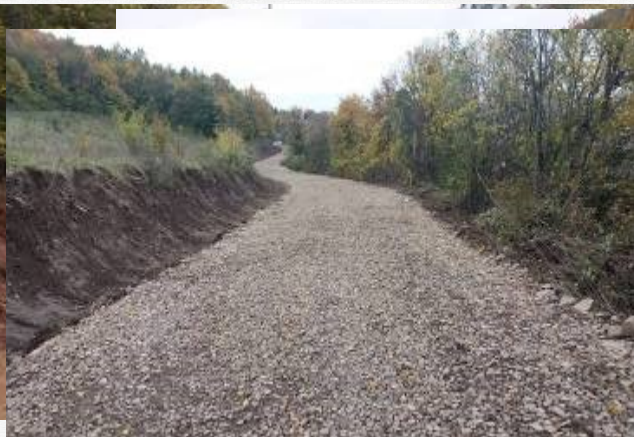


RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 18
Projekti :	Ndërtimi i kanalizimit fekal në lagjen "Kolovica"	Vlera e projektit: 71,923.50€
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: 40 ditë
Operatori :	"NOTI BETON" SHPK	Nr 616 15 139 521 dt.13/06/2016
Menaxheri i projektit :	Fevzi Jetullahu	Projekti i vitit 2015
Organi mbikqyrës :	Imer Mavriqi Ramadan Nebihi	
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara		
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Piketimi; - Kanalizimi fekal pjesërisht; - Punimi i pusetave; - Rregullimi i punishtes.

	Punët në realizim	Punimi i kanalizimit fekal					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I) me prerje	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		17,860.20€	35,603.30€	18,141.80€	€	€	
Vonesat Shkalla e cilësisë	Probleme pronësore, problem me reshje shiu, problem me ujëra nëntoksore						
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë	-						
Vlerësimi i progresit në projekt							



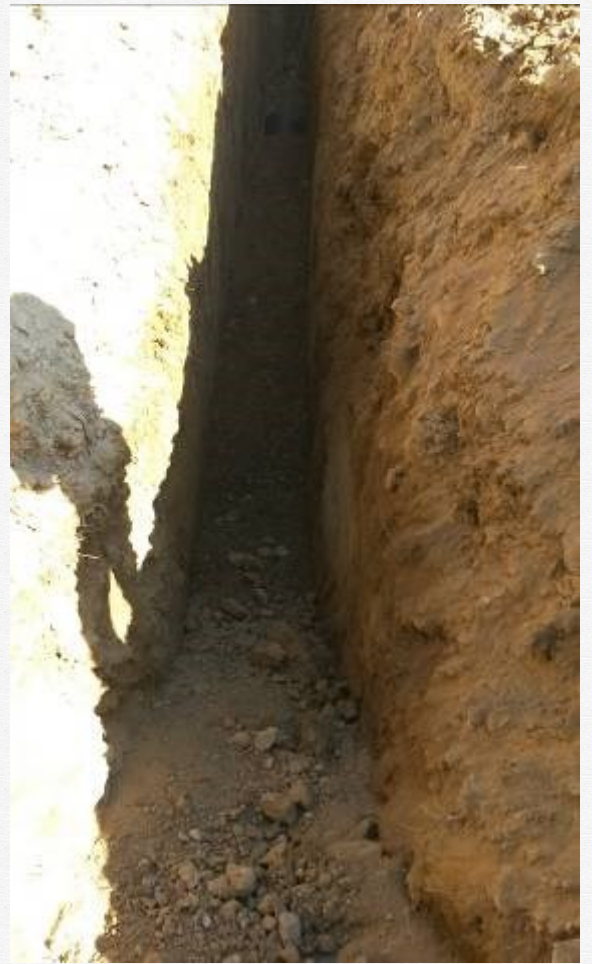

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 19					
Projekti :	Ndërtimi i kanalizimit fekal, rruga për Llukar, faza e parë	Vlera e projektit: 85,190.46€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik :90 ditë					
Operatori :	“KUSHTRIMI NM” SHPK	Nr 616 16 090 521 dt.13/06/2016					
Menaxheri i projektit :	Fevzi Jetullahu	Projekti i vitit 2016					
Organi mbikëqyrës :	Azem Buzuku Afërdita Sopi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Piketimi; - Kanalizimi fekal, pjesërisht.					
	Punët në realizim	Punimi I kanalizimit fekal.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		€	€	€	€	€	
Vonesat Shkalla e cilësisë		--					
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 20					
Projekti :	Ndërtimi i rrjetit të ujësjellsit në fshatin Slivovë	Vlera e projektit: 16,999.00€					
Investuesi :	Komuna Prishtinës	Plani dinamik: 30 ditë					
Operatori :	“BEREQETI” SHPK	Nr 616 15 276 521 dt.13/06/2016					
Menaxheri i projektit :	Fevzi Jetullahu	Projekti i vitit 2016					
Organi mbikëqyrës :	Imer Mavriqi, Afërdita Sopi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Piketimi; - Gropimi i kanalit; - Punimi i rezervuarëve; - Vendosja e pompave; - Punët elektrike; - Testimi . 					
	Punët në realizim	Rrjeti I ujësjellsit					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		€ 16,571.26	€	€	€	€	
Vonesat Shkalla e cilësisë		--					
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë		-					
Vlerësimi i progresit në projekt							





 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 21					
Projekti :	Ndërtimi i kolektorit beton arme dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Prishtina	Vlera e projektit: 2 192 854,60 €.					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 200 ditë					
Operatori :	Grupi i OE, „Noti Beton” sh.p.k&, „Ileaa-Gr” & H&B Consulting” me lider, „Noti Beton”	Nr.616 15 163 511 e dt.09.08.2016					
Menaxheri i projektit :	Fatmir Uka idn ;	Projekti i vitit : 2016					
Organi mbikëqyrës :	Imer Mavriqi, Fevzi Jetullahu, Hazir Krasniqi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	● Piketimi, gërmimi, armimi, betonimi i dyshemes (pllaka e poshtme).					
	Punët në realizim	● Gërmimi, armimi, betonimi i dyshemesë (pllaka e poshtme).					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacion (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50 035.94					
Vonesat Shkalla e cilësisë	Kontestet pronëso-ro-juridike me pronarët e parcelave që atakojnë vijën e kolektorit.				mirë		
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë	➤ Informimi nga investitori për pronarët e parcelave mbi kushtet e shpronësimit						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Parashihen vonesa ne projekt per shkak të kontestimeve të mundëshme nga komuniteti I këtyre vendbanimeve.						

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 22					
Projekti :	Hartimi i projekteve të infrastrukturës rrugore në Prishtinë	Vlera e projektit: 0.867 €, sipas specifikacionit.					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 45 ditë, për një projekt.					
Operatori :	„3D Project”, Prishtinë	Nr.616 16 012 221					
Menaxheri i projektit :	Fatmir Uka, idn	Projekti i vitit : 016/2017					
Organi mbikëqyrës :	Qazim Bajrami, Amira Krasniqi, Fevzi Bejtullahu, Hazir Krasniqi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	● Është dorëzuar lista e projekteve të hartuara te drejtori i DIKMK					
	Punët në realizim	● Është dorëzuar lista e projekteve në hartim e sipër te drejtori I DIKMK					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		48 194,23	60 902,32				
Vonesat Shkalla e cilësisë	Procedurat për plotësimin e dokumentacionit të shpronësimeve (fletat poseduese) dhe dokumente tjera të nevojshme që duhen të lëshohen nga organi kompetent.				Shumë e mirë		
Rekomandime masat për t'u ndërmarë							
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Parashihen vonesa në projekt për shkak të kontestimeve të mundëshme nga komuniteti në këto vendbanime.						

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 23					
Projekti :	Ndërtimi i infrastrukturës në Sofali dhe kanalizimit fekal në Besi.	Vlera e projektit: 140 088,95 € (e realizuar 131 904,83 euro)					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë(I realizuar 56 ditë pune)					
Operatori :	NPT,,ULPIANA’’, Prishtinë	Nr.616 15 238 512 dt.23.11.2015					
Menaxheri i projektit :	Fatmir Uka idn ;	Projekti i vitit : 2015					
Organi mbikqyrës :	Fevzi Bejtullahu, Ramadan Nebihi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	● gjitha të pozicionet e realizuara janë të psqyruara në situacionin përfundimtar.					
	Punët në realizim	☞ Projekti ka përfunduar					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II) (përfudimtar)				
		50 000,00 €	81 904,83				
Vonesat Shkalla e cilësisë	Vonesa të arsyeshme si shkak kontestave pronëso- juridike, pritjes së aprovimit nga organi përgjegjës i kërkesave të parashtruara nga komuniteti për vazhdimin e rrugëve tjera jo të parapara në paramasën dhe paralogarinë paraprake.				mirë		
Rekomandime masat për tu ndërmarë	Garancioni i defekteve të mundëshme në infrastrukturën e punuar është 3 vjet.						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Realizimi i këtij projekti ka zgjatur 56 ditë pune.						

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 24					
Projekti :	Ndërtimi i këndeve të lojërave në lagjën “Kalabria” LOT.1	Vlera e projektit: 49 852.56 € (e realizuar 49 608,42 €)					
Investuesi :	Komuna e Prishtinë	Plani dinamik : 85 ditë (I realizuar 48 ditë)					
Operatori :	NPT,,DAQA”	Nr.616 16 011 521 dt.19.04.2016					
Menaxheri i projektit :	Fatmir Uka idn ;	Projekti i vitit : 2016					
Organi mbikëqyrës :	Eleonida Berisha,Afërdita Sopi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	● Të gjitha pozicionet e realizuara janë të pasqyruara në situacionin përfundimtar.					
	Punët në realizim	🔄 Projekti ka përfunduar					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II) (përfundimtar)				
		25 000.00	24 608,42				
Vonesat Shkalla e cilësisë	Vonesa të arsyeshme, si domosdoshmëri e plotësimit të kriterëve teknike të materialeve të përdorura në realizimin e këtij projekti.		mirë				
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë	Garancioni i eleminimit të defekteve të mundëshme të projektit janë 3 vjet.						
Vlerësimi i progresit në projekt	Realizimi i këtij projekti ka zgjatur 48 ditë pune.						

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 25					
Projekti :	Ndërtimi i këndeve të lojërave në lagjen “Kodra e Trimave” LOT. 2	Vlera e projektit: 42 990.87 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 85 ditë					
Operatori :	„BEREQETI-ING” SHPK dhe „KEMA COMPANY” SHPK	Nr.616 16 011 521 dt.19.04.2016					
Menaxheri i projektit :	Fatmir Uka idn ;	Projekti i vitit : 2016					
Organi mbikqyrës :	Eleonida Berisha,Afërdita Sopi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> ● Incizimi gjeodezik i terrenit; ● Gërmimi; ● Betonimi I pllakës; ● Montimi I trupave ndriçues. 					
	Punët në realizim	☞ Punimi i pajisjeve (lodrave në uzinë).					
Vëllimi	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
Vonesat Shkalla e cilësisë	Caktimi i lokacionit dhe pajisja me leje ndërtimi	mirë					
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë	Nryshime në konceptin e planifikuar të hapsirës. Ndryshim I gjendjes së projektuar në letër,me atë të terrenit. Duhet të intervenohet edhe një here në zgjidhje, sepse mungon hapësira për lodrat e parapara në letër.						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Për shkak të problemeve të potecuarra mësipër, progresi I punimeve është i ngadalshëm.						

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 26				
Projekti :	Ndërtimi i rrugës në lagjën “Dulevit”- Suteskë	Vlera e projektit: 219 999.80 € (e realizuar 219 388,95 €)				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë (i realizuar 57 ditë)				
Operatori :	„EUROFAMIS” SHA, SUHAREKË	Nr.616 15 086 521 dt.13.04.2016				
Menaxheri i projektit :	Fatmir Uka idn ;	Projekti i vitit : 2016				
Organi mbikqyrës :	Krenar Gjaferi,Afërdita Sopi					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	● Sipas kushteve të kontratës(të gjitha pozicionet e përfunduara janë të pasqyruara në situacionin përfundimtar)				
	Punët në realizim	☞ Punimet kanë përfunduar				
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV) (përfundimtar)	
		50 000.00	50 000.00	50 000,00	69 388,95	
Vonesat Shkalla e cilësisë	Vonesa të arsyeshme si pasojë e kushteve klimatike, kontesteve pronësoro-juridike			mirë		
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë	➤ Garancioni i përmirësimit të defekteve të mundëshme vlen 3 vjet.					
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Punimet në realizimin e këtij projekti kanë zgjat 57 ditë pune.					

RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA
27

Projekti :	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Koliq, lagjja “Bicaj” dhe “Vol”	Vlera e projektit: 136 019.99 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 90 ditë
Operatori :	NTP. “Bashkimi” Koliq - Prishtinë	Nr.616 16 077 521.
Menaxheri i projektit : Organi mbikëqyrës:	*Halil Fejziu- idn. Afërdita Sopi. & Behxhet Gashi.	Projekti i vitit : 2016

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi Fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarjes; - Gërmimi i trupit të rrugës në tërë gjatësin e trasesë; - Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës; - Punimi i lëshesave në profilet e caktuara sipas projektit. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> - Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugës në shtresa me material sipas kontratës. 					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		10 ditë			Mesatar		
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë		<ul style="list-style-type: none"> - Matja e ngjeshmërisë dhe përgatitja për asfaltim. 					
Vlerësimi i progresit në projekt		<ul style="list-style-type: none"> - Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik. 					



PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA	
							28	
Projekti :	Rikonstruktimi i rrugës "Luan Haradinaj"					Vlera e projektit: 399,081.50 €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani Dinamik : 90 Ditë		
Operatori :	"Jehona" shpk					Nr.616 15 121 521 dt,6/08/2015		
Menaxheri i projektit	Dhurata Ramadani					2.09.2016 8.09.2016 21.09.2016 28.09.2016 30.09.2016 Projekti i vitit : 2015		
Organi mbikqyrës	Fevzi Jetullahu,id Amire Krasniqi,ide Ramadan Nebihi,teknik i ndërtimit							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara Muaji tetor								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Shtirirja dhe rafshimi i shtresës së zhavorit 32-64mm me trashësi të shtresës d=15cm(në gjendje të ngjeshur)ne pjesën e trotoreve, ana e djathtë. Shtirirja dhe rafshimi i shtresës së zhavorit 0-31,5 mm me trashësi të shtresës d=10cm(në gjendje të ngjeshur) në pjesën e trotoreve ana e djathtë. Vendosja e skajoreve 15/30/100 prej MB40 ne bazen e betonitd=20cm 28						
	Punët në realizim	Vendosja e skajoreve 8/20/100 prej MB40 ne bazen e betonitd=20cm Gërryerja e shtresës egzistuese të asfaltit t=4cm Pastrimi dhe lyerja me emulsion e tërë sipërfaqes e trupit të rrugës. Asfaltimi I trupit të rrugës me asphalt beton(material eruptive) t=4cm Wshhtë bërë lidhja e gypit të ujësjellsit për kronin që është donacion.						
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni	Situacioni	Situacioni	
		40,000.00	80,870.00	91,340.00				
Vonesat Shkalla e cilësisë								
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë		Të respektohet dinamika e punimeve në objekt. Mungon aktiviteti i mirëfilltë në trase.						
Vlerësimi i progresit në projekt								

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 29					
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve në lagjen "Kolovica", nr. 616 - 15-195- 521	Vlera e projektit: 347.023,00€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 90 Ditë					
Operatori :	OE "Kema Company" dhe "Ekskavatori"	Inspektimi: 7.09.2016 9.09.2016 13.09.2016 19.09.2016 23.09.2016 29.09.2016					
Menaxheri i projektit :	*Dhurata Ramadani idn:	Projekti i vitit : 2015					
Organi Mbikqyrës	*Behxhet Gashi, teknik i ndërtimit *Azem Buzuku , teknik i ndërtimit						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara - muaji shtator							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Rr. "Ndre Mjeda" krahu 12,13 janë shtruar me kubza betoni; Ndërtimi i kanalizimit atmosferik në rr. "Ndre Mjeda" krahu 13, e kryer; Ndërtimi i kanalizimit fekal në rr. "Ardhmëria", e kryer.					
	Punët në realizim	Vendosja e skajoreve 18/24cm prej betoni në rr. "Ardhmëria" Shtruarja me zhavor 0-60mm në trupin e rrugës; Shtruarja me zhavor 0-30mm në trupin e rrugës; Shqyrtimet e modulit të ngjeshjes janë bërë në prezencën e organit mbikqyrës Azem Buzuku; Shtruarja me kubza betoni pas shqyrtimit të modulit të ngjeshjes. Shqyrtimet janë bërë në prezencën e organit mbikqyrës Azem Buzuku.					
Vëllimi	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	000.00€
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë		Të rritet numri i punëtorëve.					
Vlerësimi i progresit në projekt							



Rr. "Ardhmëria" kyqja në rrjetin e kryesor të kanalizim fekal





RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA
30

Projekti :	Ndërtimi i infrastruktures në rrugë Çagllavicë - Ibër Lepenc - Prishtinë	Vlera e projektit 144,128.60 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: 90 ditë
Operatori :	OE „Linda “ Sh. p. k Ferizaj	616 15 147 521 Datë 25.09.2015.
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Buçaj, zyrtar i lartë për ndërtim urban	Projekti i vitit 2015
Organi mbikëqyrës :	Zyhrie Pllana zyrtare e lart për ndërtim, Amire Krasniqi zyrtare e lart për energjetik, Azem Buzuku zyrtar për ndërtim urban,	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Vendosja e pikave gjeodezike, Gërmimi i dheut për hapjen e trasesë së rrugës; Mbushja me material guror Mbushja dhe ngjeshja e materialit guror fraksion (0-60)mm Punimi I kanalizimit fekal ne tere gjatesin e rruges Punimi I kanalizimit atmosferik ne tere gjatesin e rruges Punimi I ujesjellesit ne tere gjatesin e rruges Punimi I ures mbi kanal in e iber lepenit Mbushja dhe ngjeshja e materialit guror fraksion (0-31)mm Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e bituagregatit 0-22mm Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja i asfaltbetonit 0-11 mm Punimi i ndriqimit Punimi i sinjalizimi horizontal dhe vertikal				
	Punët në realizim	Pastrim				
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)		
		50.000,00€	20.000,00€	50.000,00€		
	Vonesat Shkalla e cilësisë	Punimet kan përfunduar			E knaqeshme	
	Rekomandime masat për t'u ndërmarrë	Është përfunduar				

*** Foto të realizuar gjatë dhe pas përfundimit të punimeve**

Foto 1




Foto 3



Foto 2



Foto 4

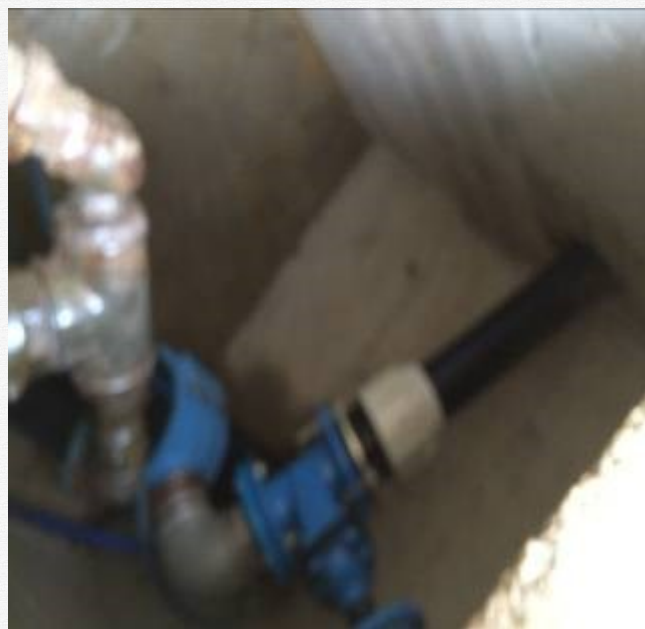

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 31					
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve me kubëza betoni në Lagjen e Spitalit në Prishtinë	Vlera e projektit 371,966.54 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: 50 ditë					
Operatori :	„Kema Company” dhe “Eskavatori”	616 15 196 521 dt. 27.10.2015.					
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Buçaj, zyrtar i lartë për ndërtim urban	Projekti i vitit 2015					
Organi mbikqyrës :	Ramadan Nebihi, zyrtar për ndërtim rural, Afërdita Sopi, zyrtare për gjeodezi,						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Gërmimi i gjerë i dheut në rrugica Tamponizimi i rrugicave dhe ngjeshja e tyre Vendosja e ansoreve Furnizimi dhe vendosja e kubezave në rrugica Punimi i kanalizimit fekal në rrugica					
	Punët në realizim	Të vazhdohet me shtrimin e kubzave, si dhe fugimin e sipërfaqeve të kubzuara					
Vëllimi Finan	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Vonesat Shkalla e cilësisë	Ka vonesa për aresye pronësore – pengesa për realizimin e punimeve.			E kënaqshme			
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë	Të vazhdohet me ndërtimin e kanalizimit fekal dhe pastaj kubezimin e rrugës.						
Vlerësimi i progresit në projekt	Progresi është i kënaqshëm, ka problem pronësoro-juridike						

*** Foto të realizuar gjatë dhe pas përfundimit të punimeve**

Foto 1



Foto 3



Foto 2



Foto 4



RAPORTI MBIKËQYRËS						SHIFRA 32	
Projekti :	"Rindërtimi i disa krahëve të rrugëve: " Shaban Shala", "Xhevat Begolli", "Ibrahim Kelmendi", "William Shekspir", "Gjon Serreqi", "Asllan Pireva" dhe "Rexhep Kabashi"					Vlera e projektit: 300,185.58 €.	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 120 ditë	
Operatori :	"Kema-Kompany"shpk dhe "Ekskavatori"					616 15 239 521 16.12.2015	
Menaxheri i projektit :	Dhurata Ramadani idn					Projekti i vitit 2015	
Organi mbikqyrës :	Ramadan Nebihi Azem Buzuku						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	1.Kanë përfunduar disa rrugë lidhëse dhe kanalizime në rr."Xhevat Begolli" dhe "Gjon Serreqi"					
	Punët në realizim	- Punimet jane duke u realizua pa ndonje pengësë, sipas paramasës.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Sit.I	Sit.II	Sit.III	Sit.IV	Sit.V	
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë	- Është urdhëruar operatori nga organi mbikqyrës që të respektojë kohën e planifikuar.						
Vlerësimi i progresit në projekt	- Punimet janë duke u realizuar në bazë të paramases dhe paralogarisë.						

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 33				
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve me kubëza beoni në lagjen "Mati"					Vlera e projektit: 396,508.42 €.
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 120 ditë
Operatori :	"Pro&Co group" dhe "Vizion Projekt"					616 15 217 521 08.12.2015
Menaxheri i projektit :	Dhurata Ramadani idn					Projekti i vitit 2015
Organi mbikqyrës :	Ramadan Nebihi Azem Buzuku					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	1.Kanë filluar të trajtohen disa rrugë dhe kanalizime				
	Punët në realizim	- Punimet janë duke u realizua pa ndonjë pengësë.				
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Sit. I	Sit.II	Sit.III		
		50,000.00€	100,000.00€	50,000.00€		
Rekomandime masat për tu ndërmarë	- Është urdhëruar operatori nga organi mbikëqyrës që të respektojë kohën e planifikuar.					
Vlerësimi i progresit në projekt	- Punimet janë duke u realizuar në bazë të paramasës dhe paralogarisë.					



RAPORTI MBIKËQYRËS**SHIFRA****34**

Projekti :	Ndërtimi i infrastrukturës në rrugën "Sali Matoshi" në Prishtinë dhe ndërtimi i rrugëve lokale në fshatin Grashticë" Nr.616 -15-221- 521	Vlera e projektit: 72,186.47 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë
Operatori :	N.N.SH "Co-ing"	Inspektimi: 09/10/2016dhe 26/10/2016
Menaxheri i projektit :	*Imer Mavriqi idn ;	Projekti i vitit : 2016
Organi Mbikqyrës	** Fevzi Jetullahu : Amira Krasniqi	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Punimet kanë përfundue në fshatin Grashticë dhe në rrugën "Sali Matoshi" në Prishtinë					
	Punët në realizim	-Kanë përfunduar punimet					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		€40 000	26.691,09€	000.0€	000.0€	000.0€	000.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë	Punimet janë krye sipas projektit,dhe punëkryesi e ka garancionin e punimeve,vonesa nuk ka sipas ditarit ndërtimor						
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë	Projekti është realizue në tërësi						



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 35					
Projekti :	"Implementimi i projektit "Blok pas bloku" në l. "Bregu i Diellit"						Vlera e projektit: 166,274.11 €.
Investuesi :	Komuna e Prishtinës - UN Habitat						Plani dinamik : 90 ditë
Operatori :	N.P.N " Vision Project"-Gjilan						616 16 072 521 19.08.2016
Menaxheri i projektit :	Dhurata Ramadani idn.						Projekti i vitit 2016
Organi mbikqyrës :	Enolida Berisha dhe Amire Krasniqi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Demolimi i betoneve ekzistuese -Gërmimi i dheut deri në kuotën e përafërt të kërkuar					
	Punët në realizim	- Projekti ka filluar në fazën e demolimit sipas projektit ideor të punuar nga Drejtoria e Urbanizimit dhe Un Habitat					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)		
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë	- Është urdhëruar operatori nga organi mbikëqyrës, që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, të sigurojë punishten,të punohet plani dinamik i punëve						
Vlerësimi i progresit në projekt	- Punimet janë duke u realizuar në bazë të projektit kryesor.						



RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA
36

Projekti :	<i>Ndërtimi i rrugëve në fshatin Koliq, lagjja "Qokaj"</i>	Vlera e projektit: 138 594.50 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik :90 ditë
Operatori :	NTP. "Bashkimi". Koliq-Prishtinë	Nr.616 16 080 521.
Menaxheri i projektit : Organi mbikqyrës:	*Halil Fejziu- idn. Afërdita Sopi. & Behxhet Gashi.	Projekti i vitit 2016

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi Fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarjes; - Gërmimi i trupit të rrugës në tërë gjatësinë e trasesë; - Punimi i lëshesave në profilet e caktuara sipas projektit. 					
	Punët në realizim	-Punimi i tamponizimit me material 0-63					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë	10 Ditë			Mesatar			
Rekomandime masat për tu ndërmarë	<ul style="list-style-type: none"> - Vazhdimi i tamponizimit me material 0-63 dhe 0-31 sipas kontratës. - Matja e ngjeshmërisë sipas kontratës. 						
Vlerësimi i progresit në projekt	- Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik.						



RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA
37

Projekti :	Ndërtimi i urave në pjesën perëndimore të Unazës qendrore"	Vlera e projektit: 1 969 163.08 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik :180 ditë
Operatori :	O.E. "REXHA" SH.P.K.-Prishtinë	Nr.616 15 236 511.
Menaxheri i projektit : Organi mbikqyrës:	*Halil Fejziu- idn. Afërdita Sopi; Imer Mavriqi & Behxhet Gashi.	Projekti i vitit 2016

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi Fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Matjet dhe piketimi i strukturës; - Pastrimi dhe përgatitja e terrenit; -Punimi i rrugëve ndihmëse; - Gërmimi i dheut për dy shtylla; -Armrimi dhe betonimi i shtyllës së parë. 					
	Punët në realizim	- Punimi i shtyllës së dytë – Armrimi i mureve dhe betonimi i tyre.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë	10 ditë			Mesatar			
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë	- Vazhdimi i punimit të shtyllave sipas kontratës-projektit.						
Vlerësimi i progresit në projekt	- Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik.						





PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 38	
Projekti :	Ndërtimi i rrugës Barilevë-Besi					Vlera e projektit: 965,582.96 €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani Dinamik : 180 Ditë		
Operatori :	“Rexha” shpk, "Benita Company"sh.p.k. dhe “Arhiko Ing” me lider "Rexha” sh.p.k					Nr.616 15 169 511 dt.01/10/2015		
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIL.					Projekti i vitit : 2015		
Organi mbikqyrës :	Krenar Xhaferi,Amire Krasniqi dhe Behxhet Gashi nga DIL.							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Është përfunduar piketimi i trasesë dhe përgatitja e punishtes.						
	Punët në realizim	Më 21.03.2016, kanë filluar punimet, edhe pse në disa pjesë ka probleme pronësore, por për momentin është duke u punuar në ato pjesë ku nuk ka probleme. Është duke u punuar në kanalizimin energjetik , ndriqimin publik, kanalizimin atmosferik,shtrirje e gjeotekstitit dhe mbushja me tampon fr.0-63mm ka filluar edhe montimi i gurëve anësor.						
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I-VI)	Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	
		300,000.00	50,000.00 20/09/16	50.000,00				
Vonesat Shkalla e cilësisë		E kënaqshme						
Rekomandime masat për tu ndërmarë		<i>Prioritet është zgjidhja e problemeve pronësore dhe jemi në kontakt me banorët ,pronat e të cilëve atakohen</i>						
Vlerësimi i progresit në projekt		Deri tash është hapur trasa në një gjatësi prej 2,5 km dhe janë duke u punuar të gjitha instalimet nëntoksore, nuk është duke u mundur të punohet me kapacitet të plotë, pasi që në disa pika ende nuk kemi mundur t’i zgjidhim disa probleme pronësore						






PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS						SHIFRA 39
Projekti :	Ndërtimi i rrugës Dabishevc-Mutivodë, Prishtinë						Vlera e projektit: 176,985.82 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës						Plani Dinamik : 90Ditë	
Operatori :	OE"Ulpiana & Bageri".						Nr.616 15 192 521 dt.27/10/2015	
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami						Projekti i vitit : 2015	
Organi mbikqyrës :	Fatmir Uka -Hazir Krasniqi							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Janë përfunduar punët e gërmimit dhe mbushjes						
	Punët në realizim	Mbushja me material rrethor, hapja e kanalit, punimi i lëshesave, mbushja me tampon o-63mm						
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)	
		50,000.00 14/09/16						
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk ka			E mirë				
Rekomandime masat për tu ndërmarrë								
Vlerësimi i progresit në projekt	Kushtet atmosferike kanë ndikuar që disa ditë most ë punohet.							






 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 40					
Projekti :	Ndërtimi i rrugicave në Llukar dhe Makovc	Vlera e projektit: 134,564.14 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik :60 ditë					
Operatori :	NNT-SHPK "Seti Commerc" nga Suhareka	Nr.616 16 050 521 dt.20/06/2016					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami	Projekti i vitit : 2016					
Organi mbikqyrës :	Afërdita Sopi dhe Ramadan Nebihi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Punimet kanë filluar më 20.07.2016 Është bërë piketimi i trasesë, si dhe gërmimi në të gjitha rrugicat në fshatin Llukar dhe Makovc Janë përfunduar 90% e rrugëve me pllaka dhe kanalizimi fekal					
	Punët në realizim	Shtruarja e pllakave te rruga në Llukar					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000,00 21/09/16					
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Pengesa kushtet atmosferike të cilat mund të ndikojnë në përfundimin e punimeve mbrenda planit dinamik					





 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 41					
Projekti :	Renovimi I stadiumit të Qytetit të Prishtinës	Vlera e projektit: 3,843,715.42 €					
Investuesi :	MKRS dhe Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik :14 muaj					
Operatori :	Konzorciumi “Al-Trade” sh.p.k dhe NP”Izolimi” Prishtinë	Nr.207-15-119-5-1-1 dt.20/06/2016					
Menaxheri i projektit :	Florim Grajçevci nga MKRS						
Organi mbikqyrës :	Qazim Bajrami nga DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Demolimi i mureve, parmakëve, instalimeve të ndryshme, gërmimi i dheut në fushën e lojës, pastrami i shkallëve të tribunave, përgatitja e armaturës për betonim të themeleve					
	Punët në realizim	Pastrimi I shkallëve të tribunave ,sanimi I shkallëve të dëmtuara dhe hidroizolimi.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Nuk është duke u punuar me kapacitet të plotë për shkak të ndërprerjes së punimeve nga Ministria e Planifikimit. Në punët konstruktive, është lejuar që të punohet vetëm në disa pozicione, si psh.hidroizolimet e tribunave.					





RAPORTI I PUNËS - TETOR 2016

SEKTORI I NDËRTIMEVE TË LARTA

Në raport përfshihen të gjitha kontratat me specifikat e tyre, vëllimi i punimeve, vlera financiare e realizuar, plani dinamik dhe vërejtjet eventuale si dhe minimum 4 fotografi nga tereni për vëllimin e punimeve. Lendet e pranuar , te zgjedhura dhe në procedurë

Nr. kontratave-projekteve	36 (4 të përfunduara 4 të ndërprera)		
Nr. i lëndëve të pranuar	2		
Nr. i lëndëve të kryera	2		
Vlerësime e projekteve			
Përgatitje të paramasave për tenderim			
Raportuesi	Ferit Fazliu, shef i Sektorit		
Vlera e projekteve	7,933,171.33 €	Te paguara 1,891,965.03 €	Mbetja: 6,041,206.30 €
Me poshtë japim raportet e bashkëpunëtorëve			

1. Raportuesja: ark. Burbuqe Agushi, inxh. e dipl.

Në raport përfshihen të gjitha kontratat me specifikat e tyre, vëllimi i punimeve, vlera financiare e realizuar, plani dinamik dhe vërejtjet eventuale si dhe minimum 4 fotografi nga tereni për vëllimin e punimeve. Lendet e pranuar , te zgjedhura dhe në procedurë

Nr. kontratave-projekteve	7		
Nr. i lëndëve të pranuar			
Nr. i lëndëve të kryera			
Vlerësime të projekteve			
Hapje të tenderëve			
SPECIFIKIMI I PROJEKTEVE			
PROJEKTI 1			
Projekti -Emërtimi	Rregullimi i oborreve dhe tereneve sportive		
Vlera e projektit:	511,933.50€		
Nr. i kontratës dhe data.	616 16 096 511 dt. 04.08.2016		
Investuesi	Komuna e Prishtinës		
Plani dinamik	Kontratë publike kornizë 36 muaj		
Operatori ekonomik	"NBT-ING" dhe NPN "Alfa-Ing" shpk, Suhareka		
Menaxheri i projektit :	Burbuqe Agushi		
Organi mbikëqyrës :	Ferdeze Bokshi Sadik Hajdini		
Projekti			
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	8.0%	
	Punët në realizim	92.0%	

Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacion i 1		
		Situacion i 2		
		Situacion i 3		
		Situacion i 4		
		Situacion i 5		
	Vlera e mbetur		Totali i paguar	_____ €
Vonesat Shkalla e cilësisë				
Rekomandime masat për tu ndërmarrë				
Vlerësimi i progresit në projekt		Pozitiv		
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE				
				



Projekti 2-

Projekti -Emërtimi	Rregullimi i oborrit të shkollës fillore "Ismail Qemajli"
Vlera e projektit:	178,704.48€
Nr i kontratës dhe data.	616 16 006 521 dt. 18.03.2016
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	89 ditë pune
Operatori ekonomik	"WIENA" shpk, Prishtinë
Menaxheri i projektit :	Burbuqe Agushi
Organi mbikëqyrës :	Muhamed Emra Enolida Berisha

Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	90%			
	Punët në realizim	10%			
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	25000.00€		
		Situacioni 2	50000.00€		
		Situacioni 3	35000.00€		
		Situacioni 4			
		Situacioni 5			
	Vlera e mbetur		Totali i paguar	11000.00 €	
Vonesat					
Shkalla e cilësisë					
Rekomandime masat për tu ndërmarë	Pas përmirësimit të motit punohet një shtresë e gomës se recikluar. Punohen rrethojat e terenit si dhe mbillet gjelbërimi.				
Vlerësimi i progresit në projekt	Pozitiv				

Fotot e ekzekutimit të punimeve

--	--



Projekti 3

Projekti -Emërtimi	“Furnizimi dhe montimi i inventarit dhe materialeve tjera për funksionalizimin e Qendrës për Business Process Outsourcing” (Qendra e Biznesit për Proces Transferime)
Vlera e projektit:	44.137,50 €
Nr i kontratës dhe data.	616 16 125 121
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	60 ditë pune
Operatori ekonomik	“FM GROUP SHPK & F CONSTRUKCTION SHPK” - Faton Mehmeti
Menaxheri i projektit :	Burbuqe Agushi
Organi mbikëqyrës :	Albina Berisha



Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi	Punët e realizuara		
	Punët në realizim		
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	
		Situacioni 2	
		Situacioni 3	
		Situacioni 4	
		Situacioni	

		5			
		Vlera e mbetur		Totali i paguar	
Vonesat Shkalla e cilësisë					
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë					
Vlerësimi i progresit në projekt					

Fotot e ekzekutimit të punimeve

Projekti 4

Projekti -Emërtimi		Riparimi dhe renovimi i objekteve të Brigadës së Zjarrfikësve	
Vlera e projektit:		64,558.02€	
Nr. i kontratës dhe data.		616 15 268 521, dt. 13.04.2016	
Investuesi		Komuna e Prishtinës	
Plani dinamik		60 ditë pune	
Operatori ekonomik		"Area" shpk, -Hodonovc, Kamenicë	
Menaxheri i projektit :		Burbuqe Agushi	
Organi mbikëqyrës :		Merita Dobërcani Malë Gashi	
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara			
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	45%	
	Punët në realizim	55%	
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	12128.85 €
		Situacioni 2	14273.10€
		Situacioni 3	
		Situacioni 4	
		Situacioni 5	
	Vlera e mbetur	Totali i paguar	26,401.95€
Vonesat , shkalla e cilësisë			
Rekomandime masat për tu ndërmarë		Te punohet në tarraca dhe punët keramike neper banja	
Vlerësimi i progresit në projekt			
Fotot e ekzekutimit të punimeve			
			



5) Ndërtimi i sallës së edukatës fizike sh. "Shtjefën Gjeqovi" - nr. 616 15 156 521 - menaxhere e projektit.

Punimet në terren nuk kanë mundur të fillojnë, sepse për këtë projekt nuk është lëshuar leja e ndërtimit, me arsyetim se nuk ka hapësirë të mjaftueshme për ta realizuar këtë objekt.

6) Ndërtimi i shkollës në l. "Kalabria", nr. 616 15 135 511 - Mbikëqyrëse për realizim të kontratës.

7) Ndërtimi i objektit të institucionit parashkollor në lagjen "Kodra e Trimave" nr. 616 15 123 521 dt. 16.09.2015 - mbikëqyrëse

2. Raportuesja: ark. Mejrushe Sejdullahu, inxh e dipl.

Në raport përfshihen të gjitha kontratat me specifikat e tyre, vëllimi i punimeve, vlera financiare e realizuar, plani dinamik dhe vërejtjet eventuale si dhe minimum 4 fotografi nga terreni për vëllimin e punimeve. Lendet e pranuar, te zgjedhura dhe në procedurë


Nr. kontratave-projekteve	6 kontrata (4 menaxherë dhe dy mbikëqyrje)
Nr. i lëndëve të pranuar	1
Nr. i lëndëve të kryera	1
SPECIFIKIMI I PROJEKTEVE	
Projekti 1	
Projekti -Emërtimi	„ Ndërtimi i sallës së edukatës fizike dhe rikonstruktimi i objektit të SHF "Eqrem Çabej" (aktualisht shkolla "7 Shtatori")
Vlera e projektit:	220,032.61 €
Nr i kontratës dhe data.	Nr. 616 14 076 521 të datës 29.10.2014
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	100 ditë
Operatori ekonomik	sh.p.k. "OLTI TRASING"
Menaxheri i projektit :	Mejrushe Sejdullahu
Organi mbikëqyrës :	Ferdeze Bokshi Merita Rushiti Avdurrahman Krasniqi Daut Humolli

Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Gjate vitit 2015, është realizuar ngjyrosja brenda e dy objekteve, fasada termoizolimi, vendosja e olluqeve dhe vendosja e epoksidit.			
	Punët në realizim	Për shkak te problemeve me lokacion, nuk kane filluar punimet te,, Salla e edukates fizike'' në këtë shkollë.			
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	42,394.82€		
		Situacioni 2			
		Situacioni 3			
		Situacioni 4			
		Situacioni 5			
		Vlera e mbetur	177,637.79	Totali i paguar	42,394.82€
Vonesat Shkalla e cilësisë					
Rekomandime masat për tu ndërmarë	Te zgjidhet problemi i lokacionit.				
Vlerësimi i progresit në projekt					

Fotot e ekzekutimit të punimeve



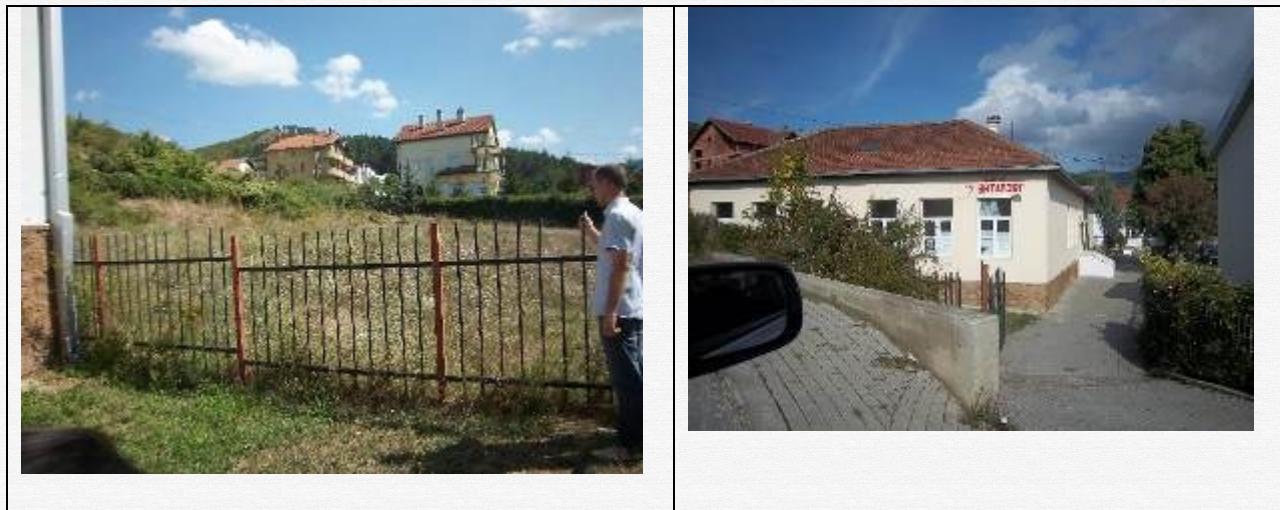

Projekti 2			
Projekti -Emërtimi		„Rikonstruktimi dhe mirëmbajtja e nyjave sanitare “kontrate kornize 3-vjeçare	
Vlera e projektit:		349,989.00€ (116.663.0 € për vitin 2016)	
Nr i kontratës dhe data.		nr. 616 16 023 521 dt. 19.04.2016.	
Investuesi		Komuna e Prishtinës	
Plani dinamik		36	
Operatori ekonomik		N.N.P „Euro Construction“	
Menaxheri i projektit :			
Mbikëqyrja			
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara			
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	IP në Hajvali, Kuzhina qendrore në Gërmi Nyjat sanitare në objektin e Komunes së vjetër Punimet në Bibliotekën e qytetit Nyjat sanitare në Bashkësinë lokale në l. “Tophane” Nyjat sanitare te parashkollorët në shkollën „Ismail Qemali” Nyjat sanitare te sh. “Sami Frashëri 2”, tri grupacione për nxënës dhe tri grupacione për arsimtarë. Nyjayt sanitare te sh. “Xhemail Mustafa”, një grupacion	
	Punët në realizim	Nyjat sanitare te shkolla „Gjergj Fishta” Nyjat sanitare te shkolla „Nazim Gafurri”	
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	16,378.03 €
		Situacioni 2	52,946.01 €
		Situacioni 3	34,944.78 €
		Situacioni 4	
		Situacioni	

	5			
	Vlera e mbetur	116.663,00 € për vitin 2016	Totali i paguar	104,268.82 €
Vonesat Shkalla e cilësisë				
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë	Kemi kërkuar nga punëkryesit që të angazhoi më shumë ekipe për të përfunduar punët sipas dinamikës			
Vlerësimi i progresit në projekt	Përfundimi i punimeve në shkollat „Gjergj Fishta“ dhe „Nazim Gafurri“			

Fotot e ekzekutimit të punimeve





Projekti 3			
Projekti -Emërtimi	„Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në shkollën „Shkëndija” në Hajvali. Aneks kontrata „Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në shkollën „Shkëndija” në Hajvali.		
Vlera e projektit:	181,069.10 € Aneks kontrata 11,957.98 €		
Nr i kontratës dhe data.	Kontrata bazë: nr 616 14 070 521 të datës 01.10.2014 Aneksi : nr 616 15 287 525 të datës 03.05.2016		
Investuesi	Komuna e Prishtinës		
Plani dinamik	90 dite		
Operatori ekonomik	sh.p.k „Rexha”		
Menaxheri i projektit :	Mejrushe Sejdullahu		
Organi mbikëqyrës :	Armend Mujaj		
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara			
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Të gjitha punët e vrazhda, mbulimi i kulmit, fasada, vendosja e dritareve. Dyshemeja, nyjat sanitare .	
	Punët në realizim	Regullimi i trotuareve, punimi i cokolës dhe suvatimi nga ana e brendshme	
Vëllimi	Situacionet	Situacioni 1	50,000.00 €
		Situacioni 2	50,000.00 €

(Pagesat e proceduara)	Situacioni 3	50,000.00 €		
	Situacioni 4			
	Punetët shtesë	11,957.98 €		
	Vlera e mbetur	31,069.10 €	Totali i paguar	150,000.00 € 11,957.98 €(p.Shtesë)
Vonesat Shkalla e cilësisë	Vonesa për shkak të mangësive në projekt			
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë	Projekti ka përfunduar , ka mbetur ekipi i mbikëqyrjes me i pranua punimet.			
Vlerësimi i progresit në projekt	Gjatë këtij muaji ka patur progres në projekt. 99% kanë përfunduar punimet.			
Fotot e ekzekutimit të punimeve				
				



Projekti 4		
Projekti -Emërtimi	Rikonstruimi i çerdhes në lagjen „Sofalia”	
Vlera e projektit:	39,370.00 €	
Nr i kontratës dhe data.	Nr. 616 16 089 521, të datës 19.07.2016	
Investuesi	Kuvendi Komunal Prishtinë	
Plani dinamik	45 ditë	
Operatori ekonomik	sh.p.k. “OLTI TRASING”	
Menaxheri i projektit :	Mejrushe Sejdullahu	
Organi mbikëqyrës :	Ylber Jashari Krenar Xhaferi Amire Krasniqi	
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara		
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Demolimi i mureve , nyjave sanitare dhe dyert e dritaret që janë paraparë me projekt.
	Punët në realizim	Instalimet e ujësjellësit, kanalizimit dhe instalimet elektrike

Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	21,572.00 €		
		Situacioni 2			
		Situacioni 3			
		Situacioni 4			
		Situacioni 5			
	Vlera e mbetur	17,798.00 €	Totali i paguar	21,572.00 €	
Vonesat Shkalla e cilësisë					
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë	Të përfundojnë punimet sipas dinamikës që e ka prezantuar punëkryesi				
Vlerësimi i progresit në projekt					
Fotot e ekzekutimit të punimeve					
					
					
5. Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen „Mati 1” - mbikëqyrëse					
6. Ndërtimi i shkollës në lagjen “Arbëria” Prishtinë- mbikëqyrëse					

3. Raportuesi: Besim Qelaj, inxh. i dipl.

Në raport përfshihen të gjitha kontratat me specifikat e tyre, vëllimi i punimeve, vlera financiare e realizuar, plani dinamik dhe vërejtjet eventuale si dhe minimum 4 fotografi nga terreni për vëllimin e punimeve. Lendet e pranuar, të zgjedhura dhe në procedurë

Nr. kontratave-projekteve	1
Nr. i lëndëve të pranuar	0
Nr. i lëndëve të kryera	0
Vlerësimi i projekteve	

SPECIFIKIMI I PROJEKTEVE

Projekti 1¹


Projekti -Emërtimi	“Rikonstruktimi dhe mirëmbajtëja e kulmeve të disa shkollave”
Vlera e projektit:	233,454.00 €
Nr i kontratës dhe data.	616-16-052-521 Datë 06.07.2016
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	3 vjet
Operatori ekonomik	“Olti Trasing”Sh.p.k
Menaxheri i projektit :	Besim Qelaj
Organi mbikëqyrës :	*Ylber Jashari **Hyrishahe Morina

Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> -Rikonstruktimi i kulmit të sallës së Kuvendit të Komunës së Prishtinës (Demontimi i llamarinës egzistuese, demolimi i listellave, montimi i llamarinës së rrafshët); -Rikonstruktimi i kulmit të objektit të Inspektionit(Rikonstruktimi i ullukëve, lagimi i tjegullave të vjetëra dhe montimi i atyre të reja); -Rikonstruktimi i kulmit të çerdhës “Dielli”(Rikonstrumi i ullukëve, largimi i tjegullave të vjetëra dhe vendosëja e atyre të reja, rikonstruimi i llamarinave të brinjëzuar); -Rikonstruktimi i kulmit të shkollës “Asim Vokshi” (Demolimi i llamarinave të dëmtuar, montimi i llamarinave të reja, demolimi i ullukëve të dëmtuar, montimi i ullukëve të rinj); -Rikonstruktimi i kulmit të shkollës “Abdyl Frashëri”(Demolimi i ullukëve të dëmtuar, montimi i ullukëve të rinj); -Rikonstruktimi i kulmit të shkollës “Avni Rrustemi” Mramor

¹ Nëse janë me shume se një projekt, plotësohen për secilin projekt të dhënat e projektit. Fotot e projektit duhet të prezentojnë fillimin e punimeve dhe gjendjen aktuale të zhvillimit të punimeve

		<p>(Montimi i llamarinë së brinjëzuar);</p> <p>-Rikonstruktimi i kulmit të çerdhës “Lulevera” (Rikonstruktmi i ullukëve, largimi i llamarinave të dëmtuara, vendosja e llamarinave të reja të brinjëzuara);</p> <p>-Rikonstruktimi i kulmit të çerdhës “Buzëqeshja” (largimi i llamarinave të dëmtuara, vendosja e llamarinave të reja të brinjëzuara);</p> <p>-Rikonstruktimi i kulmit të Hamamit (largimi i llamarinave, dërrasave dhe trajeve të dëmtuara, vendosja e trajeve, drrasave dhe llamarinave të reja të brinjëzuara).</p> <p>-Ndërtimi i murit ndarës në shkollën e Shashkocit.</p>		
	Punët në realizim	<p>-Rikonstruktimi i dhomës së kaldasë te shkolla “Avni Rrustemi” Mramor (Montimi i dërrasave, sterodurit, si dhe i llamarinë së brinjëzuar, si dhe suvatimi i jashtëm dhe i brendëshëm).</p> <p>-Rikonstruktimi i dhomës së kaldasë te shkolla në Busi (Montimi i dërrasave, sterodurit, si dhe i llamarinë së brinjëzuar, si dhe suvatimi i jashtëm dhe i mbrendëshëm).</p> <p>- Rikonstruktimi i dhomës së kaldasë te shkolla në Grashticë (Montimi i dërrasave, sterodurit si dhe i llamarinë së brinjëzuar, si dhe suvatimi i jashtëm dhe i mbrendëshëm).</p> <p>-Rikonstruktimi i kulmit të shkolla “Elena Gjika” (largimi i llamarinave të dëmtuar, si dhe vendosja e llamarinave të reja të brinjëzuara).</p> <p>-Rikonstruktimi i dhomës së kaldasë te shkolla “Avni Rrustemi” lagjja “Halitaj” Mramor (Demontimi i derë, si dhe muratimi i saj me blloka argjile, hapja e derës së re për dhomën e kaldatojës), si dhe renovimi i kulmit të shkollës.</p>		
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1		
		Situacioni 2		
		Situacioni 3		
		Situacioni 4		
		Situacioni 5		
	Vlera e mbetur	233,454.00 €	Totali i paguar	€00,00.00
Vonesat Shkalla e cilësisë		Vonesa nuk ka	E mirë	
Rekomandime masat për t’u ndërmarrë	Duhet të rrisim dinamikën e punimeve për shkak se po afrohet sezoni dimror			
Vlerësimi i progresit në projekt	I mirë			
Fotot e ekzekutimit të punimeve				

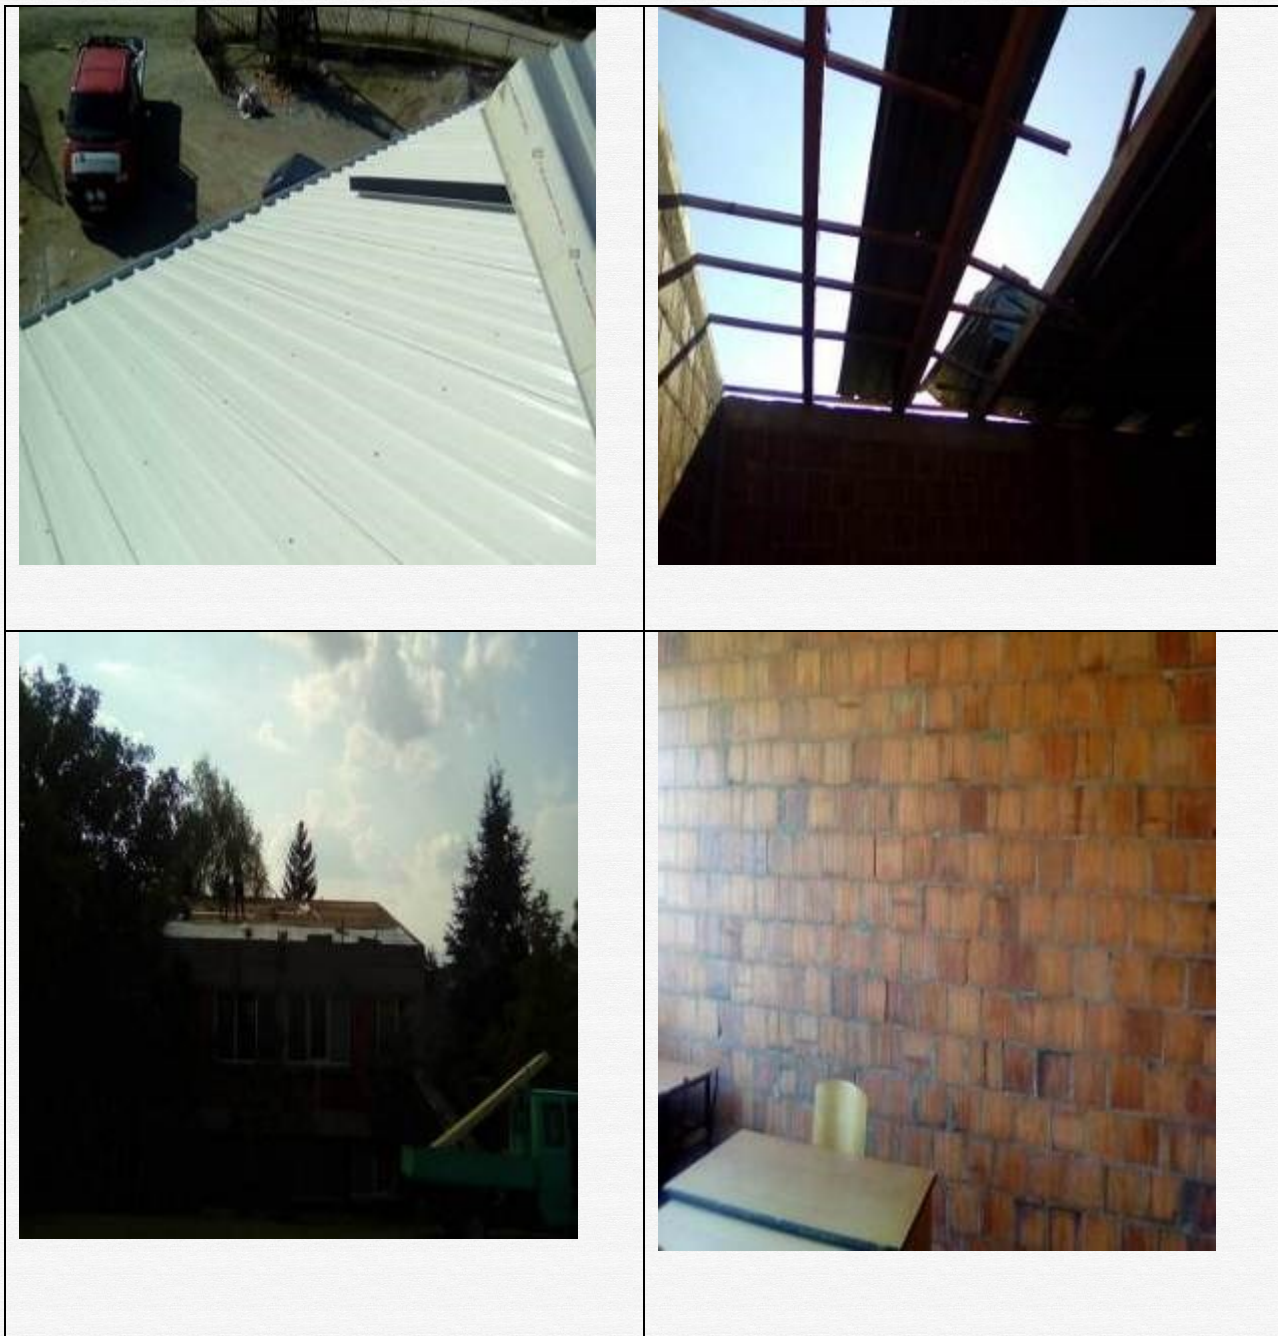


4. Raportuesja : Ferdeze Bokshi, inxh e dipl ,



Në raport përfshihen të gjitha kontratat me specifikat e tyre, vëllimi i punimeve, vlera financiare e realizuar, plani dinamik dhe vërejtjet eventuale si dhe minimum 4 fotografi nga terreni për vëllimin e punimeve. Lendet e pranuar , të zgjedhura dhe në procedurë

Nr. kontratave-projekteve	5
Nr. i lendeve të pranuar	
Nr. i lendeve të kryera	
Vlerësimi i projekteve	
SPECIFIKIMI I PROJEKTEVE	

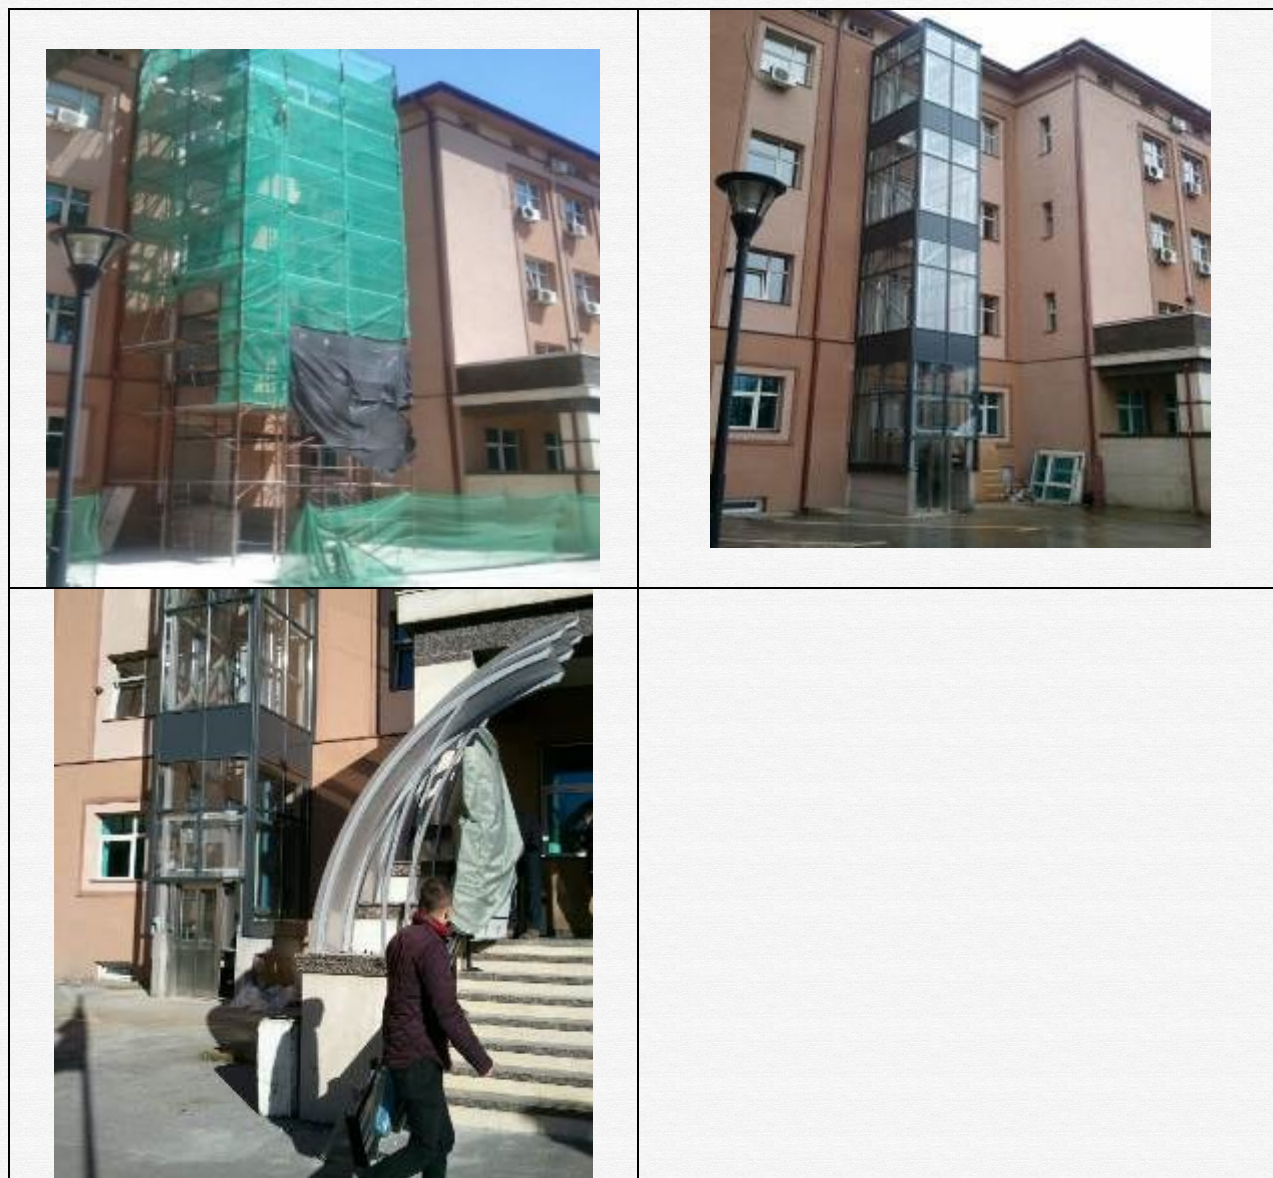Projekti 1				
Projekti -Emërtimi	1. " Furnizimi dhe vendosja e ashensorit të jashtëm në objektin e vjetër të Komunës së Prishtinës, si dhe punët përcjellëse".			
Vlera e projektit:	52,838.00 €			
Nr i kontratës dhe data.	1. 616-15 252 121,/ dt. 01.04.2016,			
Investuesi	Komuna e Prishtinës			
Plani dinamik	Sipas kontratës (kontrate kornizë) 60 ditë			
Operatori ekonomik	SH.P.K. "Hymeri Klemann" Prishtinë			
Menaxheri i projektit :	Ferdeze Bokshi, idn.			
Organi mbikëqyrës :	Për mbikëqyrjen e ndërtimit të ashensorit: 1. Ferdeze Bokshi, menaxhere, 2. Armend Mujaj, mbikëqyrës, 3. Daut Humolli, mbikëqyrës, 4. Avdurrahman Krasniqi, mbikëqyrës.			
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara				
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Ndërtimi konstruksionit të ashensorit dhe vendosja e pajisjeve të ashensorit.		
	Punët në realizim	Ndërtimi i ashensorit panoramik dhe punimet përcjellëse.		
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	Të pregad. për pagese: 29,020.60 €	
		Situacioni 2		
		Situacioni 3		
		Situacioni 4		
		Situacioni 5		
	Vlera e mbetur	0.00 €	Totali i paguar	00.00 €
Vonesat Shkalla e cilësisë			Tejklalim i planit dinamik -	
Rekomandime masat për tu ndërmarë	Pas përfundimit të objektit			
Vlerësimi i progresit në projekt	Projekti në përfundim			
Fotot e ekzekutimit të punimeve				



Projekti2	
Projekti -Emërtimi	" Ndërtimi i aneksit të shkollës fillore "Faik Konica" në Prishtinë
Vlera e projektit:	173,677.58 €
Nr i kontratës dhe data.	1. 616-16 032 521, dt. /13.06.2016,
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	Sipas kontratës (kontrate kornizë) 60 ditë
Operatori ekonomik	SH.P.K. "EN GROUP" Prishtinë, "Kodra e Diellit", rruga:"A. Zhitia",B.I.
Menaxheri i projektit :	Ferdeze Bokshi, idn.

Organi mbikëqyrës :		Për mbikëqyrjen e ndërtimit të ashensorit: 1. Ferdeze Bokshi, menaxhere, 2. Albina Berisha - Maloku, mbikëqyrëse, 3. Fevzi Jetullahu, mbikëqyrës, 4. Amire Krasniqi, mbikëqyrëse.			
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara					
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Demolimi i aneksit - korridorit ekzistues, pastrimi i terrenit, hapja e themeleve të reja.			
	Punët në realizim	Ndërtimi i themeleve të reja, si dhe punimet në vazhdim.			
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	€		
		Situacioni 2			
		Situacioni 3			
		Situacioni 4			
		Situacioni 5			
	Vlera e mbetur	0.00 €	Totali i paguar	00.00 €	
Vonesat Shkalla e cilësisë			Pas përfundimit të objektit -		
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë					
Vlerësimi i progresit në projekt					
Fotot e ekzekutimit të punimeve					
					
3. "Rregullimi i oborreve dhe terreneve sportive" në fshatin Balaj, K. e Prishtinës					
4. "Rregullimi i oborreve dhe terreneve sportive" në Komunën e Prishtinës,					
5. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike dhe rikonstruktimi i objektit të SHF "Eqrem Çabej" (aktualisht shkolla "7 Shtatori"					

5. Raportuesja : ark.Vjosa Rexhepi, inxh e dipl

Në raport përfshihen të gjitha kontratat me specifikat e tyre, vëllimi i punimeve, vlera financiare e realizuar, plani dinamik dhe vërejtjet eventuale si dhe minimum 4 fotografi nga terreni për vëllimin e punimeve. Lendet e pranuar, të zgjedhura dhe në procedurë				
Nr. kontratave-projekteve	12 (3 të përfunduara)			
Nr. i lëndëve të pranuar	2			
Nr. i lëndëve të kryera				
Vlersimi i projekteve				
Projekti 1				
Projekti -Emërtimi	<i>Renovimi i Dispanserit të Mushkërive dhe i ambulancave shëndetësorë në fshatrat e Prishtinës – LOT 2</i>			
Vlera e projektit:	41,264.53 €			
Nr i kontratës dhe data.	616 15 233 521, dt. 21.01.2016			
Investuesi	Komuna e Prishtinës			
Plani dinamik	-30(tridhjet) ditë			
Operatori ekonomik	"Tribuna"sh.p.k. -Prishtinë			
Menaxheri i projektit :	Vjosa Rexhepi . inxh.dip.arch.			
Organi mbikëqyrës :	<i>Merita Rushiti, inxh. i hid.</i> <i>Avduhrraman Krasniqi, inxh. i elek.</i>			
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara				
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<i>Punimet në të gjitha ambulancat në fshatra si: Mramor, Rimanishte, Slivove, Shkabaj dhe Viti janë realizuar.</i>		
	Punët në realizim			
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	Loto1	10,000.00 €
		Situacioni 2	Loto1	10,000.00 €
		Situacioni 3	Loto1	10,000.00 €
				11,264.53 €
	Vlera e mbetur	0€	Totali i paguar	41,264.53 €
Vonesat Shkalla e cilësisë		-	-	

Rekomandime masat për t'u ndërmarrë	
Vlerësimi i progresit në projekt	<i>Punimet janë zhvilluar sipas planit dinamik</i>
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
	
	

PROJEKTI 2			
Projekti -Emërtimi	<i>Renovimi i Dispanserit të Mushkërive në Prishtinë –LOT 1</i>		
Vlera e projektit:	22.527.62€		
Nr i kontratës dhe data.	616 15 233 521, dt. 21.01.2016		
Investuesi	Komuna e Prishtinës		
Plani dinamik	-30(tridhjet) ditë		
Operatori ekonomik	"Tribuna" sh.p.k.-Prishtinë		
Menaxheri i projektit :	Vjosa Rexhepi . inxh.dip.arch.		
Organi mbikëqyrës :	Merita Rushiti inxh. i hid. Avduhrraman Krasniqi inxh. i elek.		
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara			
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	.	
	Punët në realizim	<i>Punimet në Dispanzerin e Mushkrive etazha e katit ka përfunduar me lirim të hapësirës së etazhes së parë-përdhës punimet kanë filluar.</i>	
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	10.000,00€
		Situacioni 2	
		Situacioni 3	
		Situacioni 4	
	Vlera e mbetur	22.527.62€	Totali i paguar
Vonesat Shkalla e cilësisë		-	-
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë			
Vlerësimi i progresit në projekt			
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve			




Projekti 3			
Projekti -Emërtimi	<i>Ndërtimi i këndeve të lodrave për fëmija –pjesa I.</i>		
Vlera e projektit:	79,749.46€		
Nr i kontratës dhe data.	616 15 228 521, dt.13.04.2016		
Investuesi	Komuna e Prishtinës		
Plani dinamik	-40 (dyzet) ditë		
Operatori ekonomik	"Tribuna" sh.p.k.,-Prishtinë		
Menaxheri i projektit :	Vjosa Rexhepi . inxh.dip.arch.		
Organi mbikëqyrës :	Bch Albina Berisha Valbons Gashi		
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara			
Vëllimi fizik	Punët e realizuara		
	Punët në realizim	<i>Punimet në Breg të Diellit kanë filluar, janë në fazën e shtruarjes së zhavorrit Në Dardani janë shtruar kabëzat, po ashtu dhe shtresa e betonit për përgatitje të dyshemesë së dërrasave</i>	
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)		
	Vlera e mbetur		Totali i paguar
Vonesat Shkalla e cilësisë			
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë			
Vlerësimi i progresit në projekt			
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve			



Projekti 4			
Projekti -Emërtimi	<i>Ndërtimi i këndeve të lodrave për fëmija – pjesa II.</i>		
Vlera e projektit:	37,604.01€		
Nr i kontratës dhe data.	616 15 228 521, dt.13.04.2016		
Investuesi	Komuna e Prishtinës		
Plani dinamik	-40 (dyzet) ditë		
Operatori ekonomik	"Tribuna" sh.p.k.,-Prishtinë		
Menaxheri i projektit :	Vjosa Rexhepi . inxh.dip.arch.		
Organi mbikëqyrës :	Bch Albina Berisha Valbons Gashi		
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara			
Vëllimi fizik	Punët e realizuara		
	Punët në realizim	<i>Punimet në Breg të Diellit kanë filluar, janë në fazën e shtruarjes së zhavorrit Në Dardani janë shtruar kabëzat, po ashtu dhe shtresa e betonit për përgatitje të dyshemesë së dërrasave</i>	
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)		
	Vlera e mbetur		Totali i paguar
Vonesat			
Shkalla e cilësisë			
Rekomandime masat për tu ndërmarë			
Vlerësimi i progresit në projekt			
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve			



PROJEKTI 5			
Projekti -Emërtimi		<i>"Rikonstruktimi dhe gëlqerosja e shkollave të Prishtinës"</i>	
Vlera e projektit:		<i>Vlera indikative sipas kontratës është 254,064.3€</i> <i>Vlera vjetore sipas kontratës është 84,688.10€</i>	
Nr i kontratës dhe data.		616 16 084 521, dt.25.07.2016	
Investuesi		Komuna e Prishtinës	
Plani dinamik		Kontrata përfundon në periudhë 36 muaj	
Operatori ekonomik		N.T.TP"Ulpiana"-Prishtinë	
Menaxheri i projektit :		Vjosa Rexhepi . inxh.dip.arch.	
Organi mbikëqyrës :		Ylber Jashari Amire Krasniqi	
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara			
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<i>Punimet kanë përfunduar në shkollat "Elena Gjika", "Sami Frashëri" - I dhe II, "Hilmi Rakovica" dhe çerdhja "Xixëllonja"</i>	
	Punët në realizim	<i>Punimet kanë përfunduar në shkollat "Elena Gjika", "Sami Frashëri" - I dhe II, "Hilmi Rakovica" dhe çerdhja "Xixëllonja,I", "Gzimi Ynë"</i>	
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	52,154.34 €
			81,737.79 €
	Vlera e mbetur		Totali i paguar
Vonesat Shkalla e cilësisë		-	-
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë			
Vlerësimi i progresit në projekt			
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve			

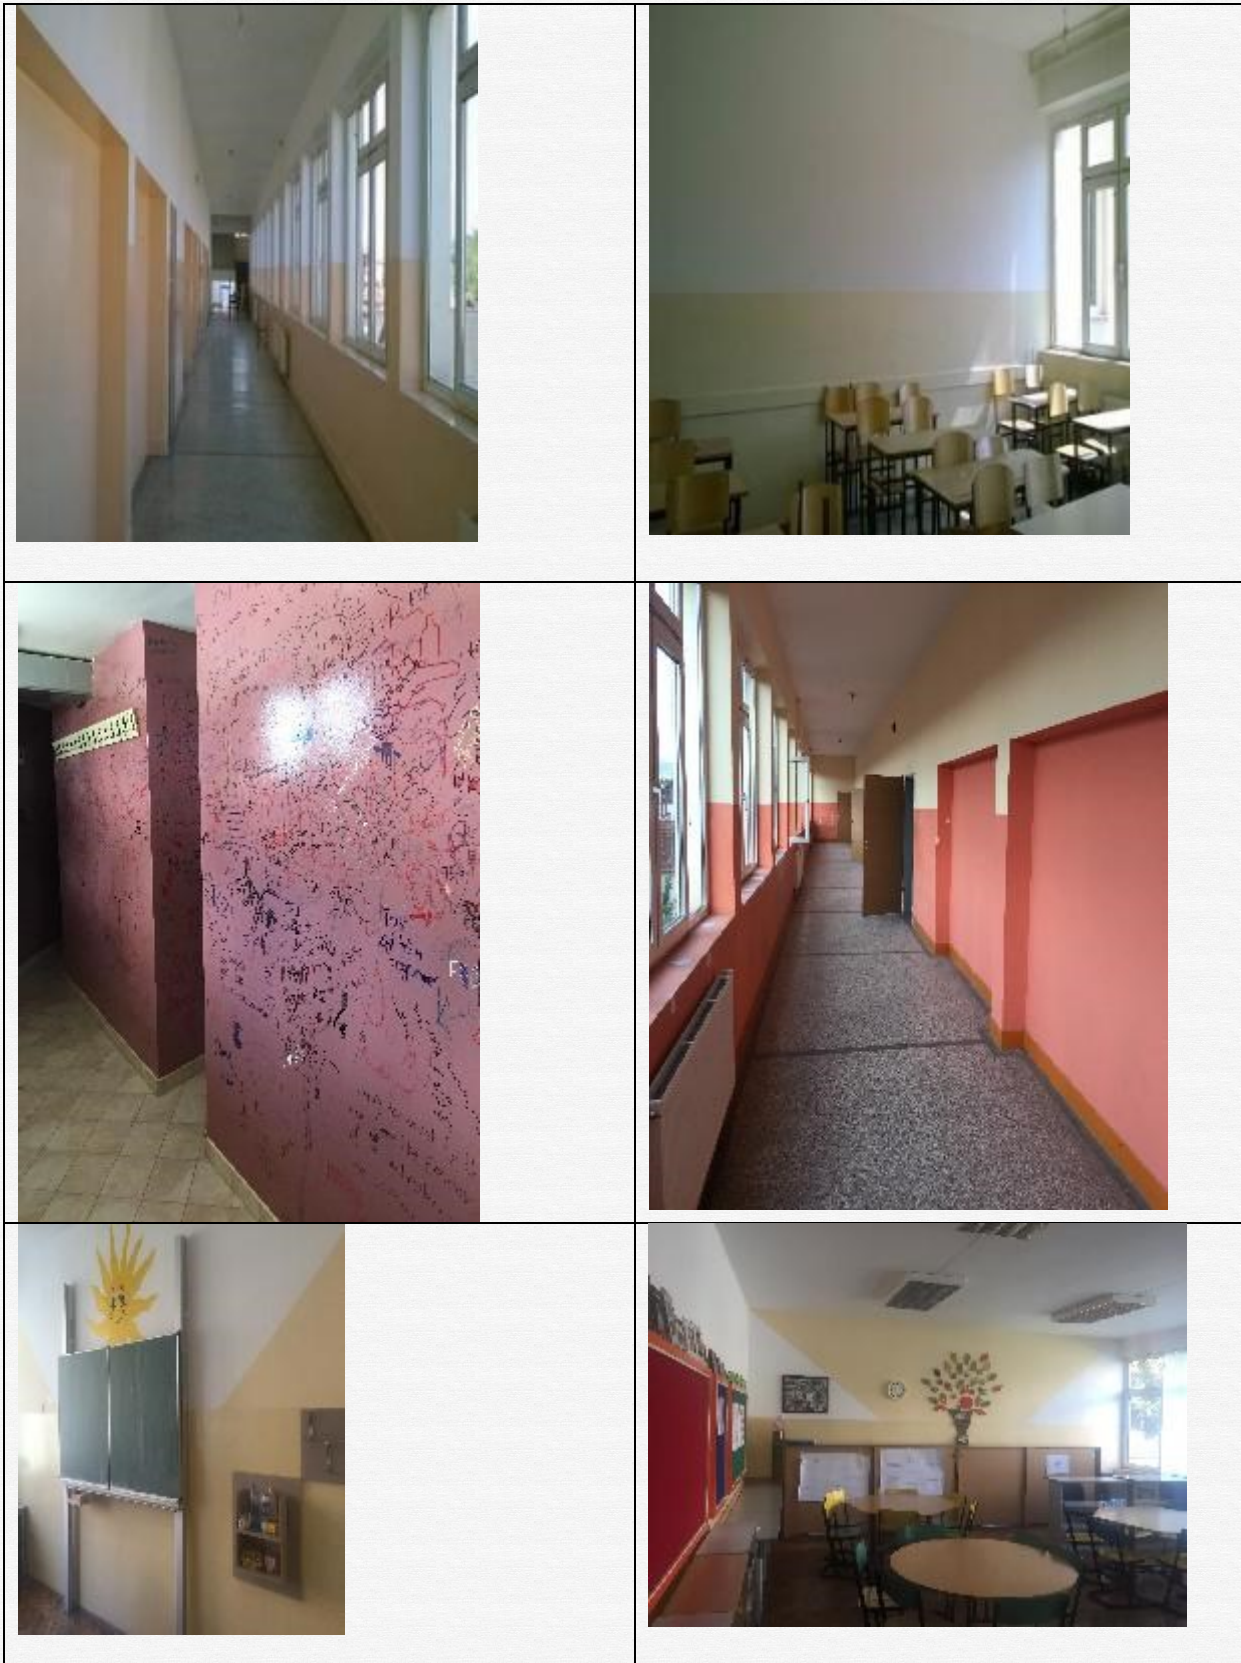

PROJEKTI 6			
Projekti -Emërtimi		<i>Konkurs projekti: Këndi i librave në Prishtinë</i>	
Vlera e projektit:		1,200.00 €	
Nr i kontratës dhe data.		616 15 03431, dt.14.06.2016	
Investuesi		<i>Komuna e Prishtinës</i>	
Plani dinamik		15 (pesëmdhjetë) ditë	
Operatori ekonomik		<i>"STUDIO 11" sh.p.k.,-Prishtine</i>	
Menaxheri i projektit :		<i>Vjosa Rexhepi arch</i>	
Organi mbikëqyrës :		<i>Ylber Jashari Krenar Xhaferi Amire Krasniqi</i>	
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara			
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<i>Projekti zbatues i punuar sipas projektit ideor dhe detyrës projektuese është dorëzuar</i>	
	Punët në realizim		
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)		
	Vlera e mbetur		Totali i paguar
Vonesat Shkalla e cilësisë			
Rekomandime masat për tu ndërmarrë			
Vlerësimi i progresit në projekt			

PROJEKTI 7			
Projekti -Emërtimi	<i>Konkurs projekti:Tregu i Luleve ne Prishtine</i>		
Vlera e projektit:	1,293.75€		
Nr i kontratës dhe data.	616 15 040 431, dt.16.06.2016		
Investuesi	<i>Komuna e Prishtinës</i>		
Plani dinamik	15 (pesëmbëdhjetë) ditë		
Operatori ekonomik	<i>"Alfa Productt"sh.p.k.,-Prishtinë</i>		
Menaxheri i projektit :	<i>Vjosa Rexhepi arch.</i>		
Organi mbikëqyrës :	<i>Ylber Jashari Krenar Xhaferi Amire Krasniqi</i>		
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara			
Vëllimi fizik	Punët e realizuara		
	Punët në realizim	<i>Projekti ideor është punuar dhe është përcjellë nga stafi i Drejtorisë së Urbanizimit. Ka vërejtje, të cilat duhet të përmisohen.</i>	
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)		
	Vlera e mbetur		Totali i paguar
Vonesat Shkalla e cilësisë			
Rekomandime masat për tu ndërmarë			
Vlerësimi i progresit në projekt			
Fotografi nga projekti			



Projekti 8			
Projekti -Emërtimi	Ndërtimi i çerdhës "Arbëria", në Prishtinë		
Vlera e projektit:	435,414.67 €		
Nr i kontratës dhe data.	nr.616 15 235 521, dt.07 08 2015		
Investuesi	Komuna e Prishtinës		
Plani dinamik	-180 (njëqind e tetëdhjetë) ditë		
Operatori ekonomik	NT. "Plejja" Kamenicë		
Menaxheri i projektit :	Besa Ajoazi, zyrtare e IOM-it		
Organi mbikëqyrës :	Vjosa Rexhepi . inxh.dip.arch. Merita Rushiti inxh. i hid. Avduhrraman Krasniqi inxh. i elek. Daut Humolli inxh. i mak.		
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara			
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Punimet janë realizuar, është bërë pranim i përkohshëm – kemi dhënë disa vërejtje, kompania ka mbetur t'i plotësojë – përmirësojë.	
	Punët në realizim		
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Avans10%	43,541.47 €
		Situacioni 1	87,082.93 €
		Situacioni 2	130,624.40 €
		Situacioni 2	174,165.87 €
		Vlera e mbetur	
Vonesat Shkalla e cilësisë		-	-
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë			
Vlerësimi i progresit në projekt	☺ Punimet jane zhvilluar sipas planit dinamik		
Fotot e ekzekutimit të punimeve			



Projekti 9			
Projekti -Emërtimi	"Instalimi i ngrohjes qendrore ne shkollat te fshatrave"		
Vlera e projektit:	99,391.85€		
Nr i kontratës dhe data.	Nr.61616091521		
Investuesi	Komuna e Prishtinë		
Plani dinamik	90 dite		
Operatori ekonomik	N.P.I.E"TERMOINSTALL"		
Menaxheri i projektit :	Vjosa Kyqyku		
Organi mbikëqyrës :	Daut Humolli Valbona Vrenezi		
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara			
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Instalimet i sistemit gypor të brendshëm janë përfunduar në shkollën: Nëna Tereza në Vranidoll, Teuta në Grashticë, Isa Boletini, Busi,Hajkobil,	
	Punët në realizim	Vazhdojnë punimet me instalimin e sistemit gypor te shkolla Dabishec,Ballabannë prithe të adaptimit të shtëpizave për kalda.	
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	40000.0
		Situacioni 2	
		Situacioni 3	
		Situacioni 4	
		Situacioni 5	
	Vlera e mbetur	€	Totali i paguar
Vonesat Shkalla e cilësisë		-	-
Rekomandime masat për tu ndërmarë			
Vlerësimi i progresit në projekt			



Projekti 10			
Projekti -Emërtimi	<i>Rregullimi dhe adaptimi QMF-ne në Tophane,ish Objekti i Gjykatës se Qarkut</i>		
Vlera e projektit:	47.942.50 €		
Nr i kontratës dhe data.	616 15 247 521, dt.25.11.2015		
Investuesi	Kuvendi Komunal Prishtinë		
Plani dinamik	-40(tridhjet) ditë		
Operatori ekonomik	"Tribuna" sh.p.k.,-Prishtinë		
Menaxheri i projektit :	Vjosa Rexhepi . inxh.dip.arch.		
Organi mbikëqyrës :	Bch Ylber Jashari Merita Rushiti inxh. i hid. Avduhrraman Krasniqi inxh. i elek.		
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara			
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<i>Punimet janë realizuar</i>	
	Punët në realizim		
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	20,000.00 €
			27.942.50 €
	Vlera e mbetur		Totali i paguar
Vonesat Shkalla e cilësisë		-	-
Rekomandime masat për tu ndërmarë			
Vlerësimi i progresit në projekt	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Punimet jane zhvilluar sipas planit dinamik</i>		
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve			



PROJEKTI 11			
Projekti -Emërtimi	<i>Renovimi i objektit të Qendrës së Mjekësisë Urgjente në Prishtinë</i>		
Vlera e projektit:	42,437.62 €		
Nr i kontratës dhe data.	<i>nr.616 15 235 521, dt.08.12.2015</i>		
Investuesi	<i>Kuvendi Komunal Prishtinë</i>		
Plani dinamik	<i>-30(tridhjet) ditë</i>		
Operatori ekonomik	<i>NNP "AREA", Kamenicë</i>		
Menaxheri i projektit :	<i>Vjosa Rexhepi . inxh.dip.arch.</i>		
Organi mbikëqyrës :	<i>Bch Hyrishahe Morina Merita Rushiti inxh. i hid. Avduhrraman Krasniqi inxh. i elek. Daut Humolli inxh. i mak.</i>		
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara			
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<i>Punimet janë realizuar</i>	
	Punët në realizim		
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	20,000.00 €
		Situacioni 2 dhe përfundimtar	21,341.59 €-
	Vlera e mbetur	1,096.03 €	Totali i paguar
Vonesat Shkalla e cilësisë		-	-
Rekomandime masat për tu ndërmarë			
Vlerësimi i progresit në projekt	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Punimet janë zhvilluar sipas planit dinamik</i>		
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve			



PROJEKTI 12			
Projekti -Emërtimi	<i>Hartimi i projekteve të vogla dhe të mesme për objekte të reja rikonstruktim, adaptim dhe mirëmbajtje</i>		
Vlera e projektit:	23,455.00 €		
Nr i kontratës dhe data.	616 16 106 221, dt.27.09.2016		
Investuesi	Komuna e Prishtinës		
Plani dinamik	45 (dyzet e pesë) ditë. Kontrata përfundon në periudhë 12 muaj		
Operatori ekonomik	N.N.P. "Pro Art"& N.P.N Proing ",-Prishtine		
	Vjosa Rexhepi arch		
Organi mbikëqyrës :	Ylber Jashari Krenar Xhaferi Amire Krasniqi Daut Havolli		
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara			
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<i>Është përgatitur plani i menaxhimit dhe është startuar me hartimin e projekteve si;</i> <i>1. Adaptimi i sallës së edukatës fizike në Barilëve dhe</i> <i>2. Projekti i parkut-lokacioni salla "1 Tetori"</i>	
	Punët në realizim		
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)		
		Vlera e mbetur	
Vonesat Shkalla e cilësisë			
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë			
Vlerësimi i progresit në projekt			

6. Raportuesja: Ganimete Nitaj, inxh e dipl

Në raport përfshihen të gjitha kontratat me specifikat e tyre, vëllimi i punimeve, vlera financiare e realizuar, plani dinamik dhe vërejtjet eventuale si dhe minimum 4 fotografi nga terreni për vëllimin e punimeve. Lendet e pranuar , te zgjedhura dhe në procedurë				
Nr. kontratave-projekteve	8			
Nr. i lendeve te pranuar				
Nr. i lendeve te kryera				
Vlerësimi i projekteve				
SPECIFIKIMI I PROJEKTEVE				
Projekti 1²				
Projekti -Emërtimi	<i>Ndërtimi i objektit të IP "Kodra e Trimave"</i>			
Vlera e projektit:	498,468.27 euro,			
Nr. i kontratës dhe data.	616 15 123 521 dt 16 09 2015			
Investuesi	<i>Komuna e Prishtinës</i>			
Plani dinamik	<i>120 ditë</i>			
Operatori ekonomik	<i>N.N Euro Ing</i>			
Menaxheri i projektit :	<i>Ganimete Nitaj</i>			
Organi mbikëqyrës :	<i>Burbuqe Agushi,Merita Rushiti,Avdurrahman Krasniqi,Daut Humolli</i>			
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara				
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<i>Themelet, pllaka në tokë, shtyllat e përdhësës, pllaka e përdhësës, shtyllat e katit, pllaka e katit, shkallët e brendshme.</i>		
	Punët në realizim	Pllaka e katit, atika, muratimi		
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	101,000.00	
		Situacioni 2		
		Situacioni 3		
		Situacioni 4		
		Situacioni 5		
	Vlera e mbetur	397,468.00€	Totali i paguar	101,000.00 €
Vonesat Shkalla e cilësisë		-	-	

² Nëse janë me shume se një projekt, plotësohen për secilin projekt të dhënat e projektit. Fotot e projektit duhet të prezantojnë fillimin e punimeve dhe gjendjen aktuale të zhvillimit të punimeve

Rekomandime masat për t'u ndërmarrë	Të punohet sipas kontratës dhe projektit
Vlerësimi i progresit në projekt	Punimet e vazhda janë në përfundim, projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik.

Fotot e ekzekutimit të punimeve

Këtu vendos



fotografite

Këtu vendos fotografitë



Këtu vendos fotografitë



Këtu vendos fotografitë



Projekti 2

Projekti -Emërtimi

Rregullimi i oborreve, rrethojave dhe fushave sportive ne

		disa shkolla të komunës së Prishtinës” – pjesa e dytë			
Vlera e projektit:		€			
Nr i kontratës dhe data.		1. Nr. kontrates nr. 616 14 089 521/24.10.2014			
Investuesi		Komuna e Prishtinës			
Plani dinamik		Sipas kontratës, 90 ditë			
Operatori ekonomik		. SH.P.K. “P and I” Projektimi ,			
Menaxheri i projektit :		Ganimete Nitaj			
Organi mbikëqyrës :		Ferdeze Bokshi, mbikëqyrëse, Merita Doberqani, mbikëqyrëse, Avdurrahman Krasniqi, mbikëqyrës.			
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara					
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Ndërtimi i murit mbrojtës nga BA dhe rrafshimni i terrenit sportiv.			
	Punët në realizim	Punimet në vazhdim si asfaltimi i terrenit sportive etj. sipas projektit...			
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1			
		Situacioni 2			
		Situacioni 3			
		Situacioni 4			
		Situacioni 5			
	Vlera e mbetur	0.00 €	Totali i paguar00 €	
Vonesat Shkalla e cilësisë			Pas përfundimit të objektit -		
Rekomandime masat për tu ndërmarë					
Vlerësimi i progresit në projekt					
Foto nga ekzekutimi i punimeve					



Projekti 3			
Projekti -Emërtimi		Ekzekutimi i punimeve me pleksigllas në disa shkolla dhe punime tjera	
Vlera e projektit:		31.900,00 €	
Nr i kontratës dhe data.		61616121521	
Investuesi		Komuna e Prishtinës	
Plani dinamik		12 muaj	
Operatori ekonomik			
Menaxheri i projektit :		Ganimete Nitaj,inxh e dipl	
Organi mbikëqyrës :		Ylber Jashari Valbona Verrnezi	
Vëllimi fizik	Punët e realizuara		
	Punët në realizim		
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	
		Situacioni 2	
		Situacioni 3	
		Situacioni 4	
		Situacioni 5	
	Vlera e mbetur		
Vonesat Shkalla e cilësisë			
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë			
Vlerësimi i progresit në projekt			
Fotot e ekzekutimit të punimeve			
			



Projekti 4			
Projekti -Emërtimi	"Rikonstruimi dhe gëlqerosja e disa shkollave"		
Vlera e projektit:	122,819.27€		
Nr i kontratës dhe data.	616 15 079 521		
Investuesi	Komuna e Prishtinës		
Plani dinamik			
Operatori ekonomik	"TRIBUNE SH.P.K"		
Menaxheri i projektit :	Ganimete Nitaj		
Organi mbikëqyrës :	Mejrushe Sejdullahu, Merita Rushiti, Avdurrahman Krasniqi, Daut Humolli		
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara			
Vëllimi fizik	Punët e realizuara		
	Punët në realizim	Janë përfundua të gjitha punët, me përjashtim të laboratorit të SHMT "28 Nëntori"	
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	52,557.09€
		Situacioni 2	16,264.48€
		Situacioni 3	
		Situacioni 4	
		Situacioni 5	
	Vlera e mbetur	53,997.7€	Totali i paguar
Vonesat Shkalla e cilësisë		-	-
Rekomandime masat për t'u ndërmarë			

Vlerësimi i progresit në projekt	Është duke bisedua me DUNMM për çëshje të lokacionit
Fotot e ekzekutimit të punimeve	

Projekti 5			
Projekti -Emërtimi	"Rregullimi i oborreve dhe ndërtimi i rrethojave të disa shkollave të Prishtinës		
Vlera e projektit:	249,670.42€		
Nr i kontratës dhe data.	616 13 118 521		
Investuesi	Komuna e Prishtinës		
Plani dinamik			
Operatori ekonomik	"N.N.ZHVILLIMI"		
Menaxheri i projektit :	Ganimete Nitaj		
Organi mbikëqyrës :			
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara			
Vëllimi fizik	Punët e realizuara		
	Punët në realizim	Janë përfundua të gjitha punët, me përjashtim të shtresës së asfaltit në terrenin sportiv në l. "Mati"	
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	50,000.00 €
		Situacioni 2	50,000.00 €
		Situacioni 3	50,000.00 €
		Situacioni 4	50,000.00 €
		Situacioni 5	44,477.36 €
	Vlera e mbetur	5,223.06€	Totali i paguar
Vonesat Shkalla e cilësisë		-	-
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë			
Vlerësimi i progresit në projekt			
Fotot e ekzekutimit të punimeve			


6. Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen „Mati 1” vlera e projektit është 1,458,452.95€, punimet nuk kanë filluar
7. Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen „Arbëria” faza II , vlera e projektit është : 737,832.96 € ,punimet janë ndërprerë për shkak të pronës.
8. Ndërtimi i shkollës në lagjen “Kalabria”, vlera e projektit është 1,458,452.95 €; punimet nuk ka fillua për shkak të problemeve pronësore

7. Raportuesi: Ylber Jashari

Në raport përfshihen të gjitha kontratat me specifikat e tyre, vëllimi i punimeve, vlera financiare e realizuar, plani dinamik dhe vërejtjet eventuale si dhe minimum 4 fotografi nga tereni për vëllimin e punimeve. Lendet e pranuar , te zgjedhura dhe në procedurë			
Nr. kontratave-projekteve	9		
Nr. i lendeve te pranuar	0		
Nr. i lendeve te kryera	0		
SPECIFIKIMI I PROJEKTEVE			
Projekti -Emërtimi	Renovimi i ngrohjes së bibliotekës “Hivzi Sulejmani”, si dhe renovime të tjera sipas nevojës		
Vlera e projektit:	24,975.00 €		
Nr i kontratës dhe data.	Nr. prok. 616 16 059 521 – 31.05.2016		
Investuesi	Komuna e Prishtinës		
Plani dinamik	30 ditë		
Operatori ekonomik	Termovizion		
Menaxheri i projektit :	Ylber Jashari		
Organi mbikëqyrës :	Hyrishahe Morina, Daut Humolli		
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara			
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kontrata e përfunduar	
	Punët në realizim	Kontrata e përfunduar	
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	
		Situacioni 2	
		Situacioni 3	
		Situacioni	

		4			
		Situacioni			
		5			
		Vlera e mbetur	0	Totali i paguar	24,610.00€ €
Vonesat					
Shkalla e cilësisë					
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë					
Vlerësimi i progresit në projekt					

Foto gjatë ekzekutimit të punimeve

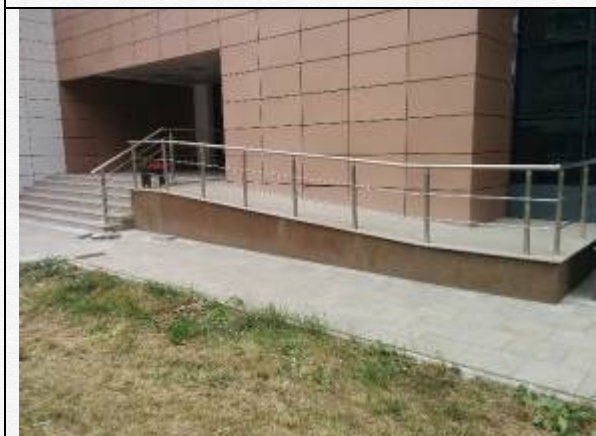


2	Rikonstruktimi dhe mirëmbajtja e kulmeve të shkollave
3	Renovimi dhe adoptimi i QKMFV-ve në l. "Tophane", ish-objekti i Gjykatës së Qarkut
4	Renovimi në disa qendra dhe ambulanca mjekësorë në Prishtinë
5	Konkurs projektimi, Këndi i librave në Prishtinë
6	Konkurs projektimi, Tregu i luleve në Prishtinë

7	Rikonstruktimi dhe gëlqerosja e shkollave të Prishtinës
8	Rikonstruktimi i çerdhes në lagjen "Sofalia"
9	Rekonstruktimi dhe mirëmbajtja e kulmeve të shkollave
10	Ekzekutimi i punimeve me pleksigllas në disa shkolla dhe punime të tjera
	Fotografitë dhe detalet e ekzekutimit të kontratave i gjeni te menaxherët e projektit, ku ne ju kemi raportuar

8. Raportuesja: Hyrishahe Morina, Bch e ndërtimit

Në raport përfshihen të gjitha kontratat me specifikat e tyre, vëllimi i punimeve, vlera financiare e realizuar, plani dinamik dhe vërejtjet eventuale si dhe minimum 4 fotografi nga tereni për vëllimin e punimeve. Lendet e pranuar, te zgjedhura dhe në procedurë

Nr. kontratave-projekteve	4-(kater)			
Nr. i lëndëve të pranuar	0-(zero)			
Nr. i lëndëve të kryera	0-(zero)			
Vlerësim të tenderit	1			
SPECIFIKIMI I PROJEKTEVE				
Projekti -Emërtimi	Ndërtimi i stadiumit të futbollit në fshatin Hajvali			
Vlera e projektit:	96,954.14€			
Nr i kontratës dhe data.	616 14 176 521 - 19.12.2014			
Investuesi	Komuna e Prishtinës			
Plani dinamik	45 ditë			
Operatori ekonomik	NNP "Zhvillimi"			
Menaxheri i projektit :	Bahtije Uka			
Organi mbikëqyrës :	Hyrishahe Morina, Merita Rushiti, Avdurrahman Krasniqi			
Vëllimi fizik	Punë në realizim			
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1		
		Situacioni 2		
		Situacioni 3		
		Situacioni 4		
		Situacioni 5		
		Vlera e mbetur		Totali i paguar
Vonesat Shkalla e cilësisë				
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë				

Vlerësimi i progresit në projekt	Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali, ka problem me ulje - rrëshqitje të dheut
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
	
	
2. Rikonstruktimi dhe mirëmbajtja e kulmeve të disa shkollave	
3. Ndërtimi i sistemit të ujitjes për fushën në Hajvali-Faza e parë	
4. Renovimi i ngrohjes së bibliotekës "Hivzi Sulejmani", si dhe renovime të tjera sipas nevojës.	
Fotografitë dhe detalet e ekzekutimit të kontratave i gjeni te menaxherët e projektit ku ne ju kemi raportuar.	

9. Raportuesja: Albina Berisha , Bch e arkitektures	
Në raport përfshihen te gjitha kontratat me specifikat e tyre, vëllimi i punimeve, vlera financiare e realizuar, plani dinamik dhe vërejtjet eventuale si dhe minimum 4 fotografi nga tereni për vëllimin e punimeve. Lendet e pranuar , te zgjedhura dhe në procedurë	
Nr. kontratave-projekteve	3
Nr. i lëndëve të pranuar	0
Nr. i lëndëve të kryera	0
SPECIFIKIMI I PROJEKTEVE	
1. Ndërtimi i dy këndeve të lojërave për fëmijë, pjesa I.	
2. Ndërtimi i dy këndeve të lojërave për fëmijë, pjesa II.	
3. Ndërtimi i aneksit të shkollës fillore “Faik Konica” në Prishtinë.	
Fotografitë dhe detalet e ekzekutimit të kontratave i gjeni te menaxherët e projektit, ku ne ju kemi raportuar	
10. Raportuesi: Sadik Hajdini, tek i ndërtimit	
Në raport përfshihen te gjitha kontratat me specifikat e tyre, vëllimi i punimeve, vlera financiare e realizuar, plani dinamik dhe vërejtjet eventuale si dhe minimum 4 fotografi nga tereni për vëllimin e punimeve. Lendet e pranuar , te zgjedhura dhe në procedurë	
Nr. kontratave-projekteve	3
Nr. i lëndëve të pranuar	
Nr. i lëndëve të kryera	
Vlerësim të tenderit	
SPECIFIKIMI I PROJEKTEVE	
1. Rregullimi i oborreve dhe terreneve sportive,	
2. Rikonstruktimi dhe mirëmbajtja e nyjave sanitare	
3. Pastrimi i objekteve të Komunës	

Drejtori:

Hysen DURMISHI, Ing.dipl.ndërt.

Prishtinë, tetor 2016
