

Raporti i vitit 2021 Maj 01-31.05.2021

1. Drejtoria e Shërbimeve Publike Mbrojtje dhe Shpëtim

Sektorë në kuadër të drejtorisë:

1. Sektori për shërbime publike;
2. Sektori për menaxhimin e mbeturinave dhe mjedisit;
3. Sektori për mbrojtje dhe shpëtim;
4. Sektori për transport dhe trafik.

Punonjësit në kuadër të sektorëve:

1. Sektori për shërbime publike ka 8 punonjës;
2. Sektori për menaxhimin e mbeturinave dhe mjedisit ka 4 punonjës;
3. Sektori për mbrojtje dhe shpëtim ka 10 punonjës;
4. Sektori për transport dhe trafik ka 3 punonjës;

Funksionet kryesore të drejtorisë sipas sektoreve

Funksionet e sektorit për shërbime publike:

- Jep pëlqim për shfrytëzimin e hapësirave publike në përputhje me planet dhe rregulloret komunale;
- Në bazë të ligjit dhe udhëzimeve administrative, bënë trajtimin e qenve endacakë.
- Organizon sigurimin, rregullimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike përmes inventarizimit;
- Në bashkëpunim me banorët, bën rregullimin dhe riparimin e ashensorëve në banesat kolektive;
- Organizon dhe mbikëqyrë mirëmbajtjen verore dhe dimërore të shesheve, rrugëve dhe trotuareve në zonën urbane dhe rurale të komunës;
- Bën planifikimin dhe menaxhimin e mirëmbajtjes, rikonstruktimit, zgjerimit dhe modernizimit të rrjetit të ndriçimit publik;
- Është përgjegjëse për ndriçimin publik;
- Bën rregullimin dhe mirëmbajtjen e monumenteve, fontanave dhe krojeve publike;

Funksionet e sektorit për menaxhimin e mbeturinave dhe mjedisit:

- Mbikëqyrë mbledhjen, transportimin deri në deponi të mbeturinave nga amvisëritë, institucionet dhe lokalet afariste, mbeturinave të vëllimshme, mbeturinave ndërtimore, mbeturinave të biodegradueshme dhe kompostimin e tyre, si dhe llojeve tjera të mbeturinave të cilat janë në kompetencë të nivelit lokal;
- Angazhohet për zvogëlimin gradual të ndotjes, degradimit dhe dëmit mjedisor, si dhe zvogëlimin ose ndalimin e atyre aspekteve ekonomike dhe te aktiviteteve të tjera që përbëjnë rrezik për shëndetin e njeriut dhe mjedisin;
- Angazhohet për zvogëlimin gradual të ndotjes, degradimit dhe dëmit të mjedisit përmes eliminimit të deponive ilegale dhe aktiviteteve tjera relevante;

- Përcakton lokacionin e kontejnerëve;
- Informon publikun për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit;
- Në përputhje me ligjet dhe aktet komunale, përgatit programin për uljen e nivelit të ndotjes së mjedisit dhe propozon projekte për mbrojtjen e mjedisit, në bashkëpunim me institucione qendrore e lokale dhe donatorë;
- Përkujdeset për ruajtjen e ujërave sipërfaqësore dhe atyre nëntokësore nga ndotësit;
- Mbikëqyrë administrimin e vlerave natyrore, si: ajri, uji, toka, pyjet, lëndët minerale dhe të mirat natyrore publike;

Funksionet e sektorit për mbrojtje dhe shpëtim:

- Vlerëson rrezikshmërinë nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësi të tjera brenda territorit të komunës, si dhe harton planet për mbrojtje;
- Kujdeset për funksionimin dhe aktivizimin e Sistemit të Alarmit Publik në rast të rrezikut;
- Është përgjegjës për organizimin e qytetarëve në forcat për mbrojtje dhe shpëtim, në rast nevojë si dhe propozimin për themelimin e Komitetit për Mbrojtje dhe Shpëtim;
- Në përputhje me ligjet dhe në rast nevojë është përgjegjëse për koordinimin e punëve me institucionet qendrore dhe komunat tjera në fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit.
- Në rastet e jashtëzakonshme, i propozon Kryetarit të Komunës shpalljen e gjendjes Emergjente, si dhe masave që duhet të ndërmerren për përballimin e situatës;
- Kujdeset për mirëmbajtjen dhe funksionalizimin e strehimoreve publike;
- Bën pranimin e informatave nga qytetarët, subjektet Komunale dhe i dërgon për personin apo subjektin që i dedikohen (Qendra e thirrjeve);
- Në përputhje me ligjet dhe aktet komunale, harton Planin për Mbrojtje nga Zjarri, Planin Operativ Emergjent dhe Planin nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë tjera;
- Ndërmerr masa për parandalimin dhe zvogëlimin e pasojave nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera;
- Në raste emergjente nga fatkeqësit natyrore dhe fatkeqësi tjera bën evakuimin dhe strehimin e përkohshëm të qytetarëve:
- Bashkëpunon me BPZ-në gjatë intervenimeve emergjente dhe intervenimeve nga zjarri;
- Kujdeset për furnizim me ujë të pishëm me cisterna dhe rezervuarë të veçant, në rast nevojë;
- Ndërmerr masa preventive për parandalimin e vërshimeve përmes pastrimit të Shtratit të lumenjeve, kanalizimit atmosferike, pastrimi i proskave, kanaleve të hapura dhe portave hyrëse;
- Bën monitorimin dhe vëzhgimin e kamerave të sigurisë në Qendren e thirrjeve;
- Ndërmerr masa gjatë rasteve emergjente:
- Bënë regjistrimin e objekteve të vjetra dhe objekteve tjera me rrezikshmëri të lartë, zonave me rrezikshmëri të lartë nga shembjet e dheut dhe vërshimet;

Funksionet e sektorit për transport dhe trafik:

- Koordinon aktivitetin dhe jep pëlqimin për veprimtarinë e transportit publik të udhëtarëve dhe mallrave, me kompanitë publike dhe private;
- Cakton linjat dhe rendin e udhëtimit për transportin publik të udhëtarëve, sinjalizimin e vend ndaljeve për autobusë, pritoreve të udhëtarëve;
- Cakton lokacionet për parkimin e veturave auto-taksi;
- Menaxhon sektorin me “Merimangë”, sipas rregullores, dhe përgatit procedurat për ankand publik për automjetet e konfiskuara, që kalojnë afatin e paraparë me ligj;
- Bashkëpunon me policinë për rregullimin e komunikacionit dhe ngritjen e sigurisë në komunikacion, në veçanti afër shkollave dhe institucioneve parashkollore;

- Kujdeset për sinjalizimin vertikal dhe horizontal të rrugëve ekzistuese dhe rregullon komunikacionin në qytetin e Prishtinës;
- Ndërtimi i nyjave të reja të semaforëve në udhëkryqet e qytetit dhe mirëmbajtja e semaforëve ekzistues;
- Vendos për mbylljen e përkohshme të rrugëve, për shfrytëzimin e tyre në raste të veçanta (festa shtetërore, punë të veçanta në interes të shtetit dhe komunës dhe punë të ngjashme);
- Eshtë kompetente për dhënjën e lejeve që i përkasin Komunës, për vendosjen e sinjalizimit;
- Mbikëqyrë kushtet e sigurisë së jetës dhe shëndetit të njerëzve në vendndërtim dhe rreth tij, gjatë zhvillimit të punimeve.

2. Shqyrtimi i kërkesave

Gjatë muajit Maj drejtorja ka proceduar 200 kërkesa të ndryshme: për shfrytëzim të hapësira para lokaleve, reklama, transport, parkingje, siguri në trafik për emergjenca (vërshime, zjarre, shembje të rrugëve, trotuareve, drunjtëve të ndryshëm), për shitje ambulante, për mbeturina. Nga numri i përgjithshëm prej 200 kërkesave të pranuar, të gjitha të përfunduara.

Rastet e intervenimeve Emergjente-5

Lëndët e Komisionit për mbeturina-245

Lëndët për shfrytëzim të hapësira publike-50

Lëndët e Komisionit për shfrytëzim të hapësira para lokaleve-8

Lëndët për reklama-0

Rastet e pranuar në Qendren e thirrjeve-616

Rastet e pranuar nga brigada e zjarrëkufësëve-61

2.1. Dërgimi i kërkesave për Hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimi i nevojave

Pergatitja e projekteve paramasave dhe specifikimeve për projektet e planifikuara gjatë kësaj perjudhe.


3.1. Raportimi i Menaxhereve të projekteve dhe Kontratave


Drejtoria	Drejtoria e Shërbimeve Publike Mbrojtje dhe Shëtim
Spektori	Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim, Menaxhimin e mbeturinave dhe Ambientit, Transportit dhe Trafikut.
Drejtoresha	Medina Braha
Raportoi	Habib Qorri, Fatmir Bilalli, Dukagjin Gashi / shef sektori
Kontrolli – Përpunoi	
Periudha raportuese	01-31.05.2021 muaji Maj
Menaxhëret e projekteve dhe Organi mbikqyrës	Habib Qorri Dukagjin Gashi

	Fatmir Bilalli Xhemshit Gashi Bashkim Gashi Enver Kadriu Afrim Gashi Xhevdet Ibrahimaj Halil Halili Lumnije Hyseni Xhemile Gashi Sabri Gashi
--	---

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					1
Projekti :	Mobileria urbane-Furnizimi dhe vendosja priturve për autobus të transportit publik të udhëtareve	Vlera e projektit: 292,500.00€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik					
Operatori :	“Selmans Network” shpk “BM Group”	Nr.616-19-5545-1-1-1 dt.30.10.2019					
Menaxheri i projektit :	Halil Halili	Projekti i vitit: 2019					
Organi mbikëqyrës :	Habib Qorri Enver Kadru						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Deri me tani janë instaluar 35 konstruksionet të pritoreve sipas lokacionet të kërkuara nga Komuna e Prishtinës					
	Punët në realizim	Janë duke u realizuar bazamentet në lokacionet dhe prodhimin dhe furnizimin me elementet baze të pritores (LCD).					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		/	/	/	/	/	
Vonesat Shkalla e cilësisë	Vonesa janë për shkaqe që ndryshimeve në projekte dhe mangësi në specifika teknike për të kompletuar pritoren						
Rekomandime masat për tu ndërmarë	Rekomandimet që duhen të ndermirën për shkak të vonesave nga OE duke bazuar në kushtet e kontratës duhen të ndërmarrën masa për ndërprerje të kontratës.						
Vlerësimi i progresit në projekt							

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					2	
Projekti :	Ndërtimi i impiantit të Kompostimit					Vlera e projektit: 139,782.20 €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik 90 Ditë		
Operatori :	"Noti-Beton" SH.P.K					616-19-5495-5-2-1 30.09.2019		
Menaxheri i projektit	Nazmije Tora					Projekti i vitit: 2020		
Organi mbikëqyrës :	Dukagjin Gashi, Seniha Bajraktari							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Jane realizuar te gjitha punët ne baze te pozici Janë realizuar te gjitha punët nga pozicionet e kontratës: 1.Punet përgatitore dhe matjet gjeodezike. 2.Punet tokësore 3.Shtresat konstruktive 4.Largimi i ujërave atmosferike 5.Objektet 7.Ndriqimi						
	Punët në realizim	Nga pozicioni 5 dhe 6 punët janë kryer pjesërisht. Kane mbetur edhe një pjese e mbulesës (kulmit) te objekteve përcjellëse si dhe furnizimi me zyrën administrative(kontejnerë).						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		18,041.20€	19,741.77	66,050.00€				
Vonesat Shkalla e cilësisë	Vonesat ne punime kanë qenë për shkak të rastit të Pandemisë si dhe kushteve atmosferike.							
Rekomandime masat për tu ndërmarë	Kompanisë i mbetet qe të plotësoj edhe kërkesat për përmirësim të gjendjes fizike të hapësirës për rreth objekteve si dhe ta bëje furnizimin me kontejnerë-zyrë administrative sipas përshkrimit në kontratë.							
Vlerësimi i progresit në projekt								

 RAPORTI MBIKËQYRËS		3					
Projekti :	Kontrata në Shtëpi	Vlera e projektit: 1,614,174.00 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik					
Operatori :	KRM 'Pastrimi'	Nr.14-024/01-34297/21 dt.23.02.2021					
Menaxheri i projektit :	Lumnije Hyseni	Projekti i vitit: 2021					
Organi mbikëqyrës :	1. Xhevdet Ibrahimaj 2. Afrim Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	1.Mbledhja,largimi dhe transportimi i mbeturinave të amvisërisë. 2.Mbledhja,largimi dhe transportimi i mbetjeve urbane 61,19 ton 3.Mbledhja dhe largimi i mbetjeve inerte 9.05 ton. 4. Faturimi dhe shpërndarje e faturave për mbeturina 62.000 5. Larja dhe dezinfektimi i lokacioneve edhe kontejnerëve 6.Lokimi dhe dislokimi i kontejnerëve sipas kërkesës nga ana e komunës 22.					
	Punët në realizim	Të gjitha pikat e lartë cekura					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI
		237,364.00€	238,219.00€				
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarë		Për arritjen e evitimit të deponive ilegale rekomandojmë që pas largimit të mbeturinave të vendosen rrethojat në hapësirat e pastruara dhe mundësisht të gjelbërimi i tyre					
Vlerësimi i progresit në projekt		Ka filluar largimi i mbeturina inerte nga deponia ilegale tek fusha e Pajtitimit					

 RAPORTI MBIKËQYRËS		4				
Projekti :	Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qyteti, deblokimi i kanalizimit atmosferik-LOT 1	Vlera e projektit: 261,722.50 €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik				
Operatori :	“Dardania”, SH.P.K.–VITI 2020	Nr.616 18 025 211 dt.20/05/2019				
Menaxheri i projektit :	Bujar Abazi	Projekti i vitit: 2019-2022				
Organi mbikëqyrës :	Afrim Gashi					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A :1 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë B :6 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë C :29 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë D :165 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në muaj) : 1 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (4 herë në muaj) : 6 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (1 herë në muaj) : 38 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (1 herë në muaj) : 165rrugë				
	Punët në realizim	Larja dhe fshirja e rrugëve të kategorisë A ,B, C, D Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A, B, C, D				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)	Situacioni (XIII)	Situacioni (XIV)
		22,818.59€	30,815.12€	20,264.36€	19,978.24€	1,444.94€
Vonesat						
Shkalla e cilësisë						
Rekomandime masat për tu ndërmarë						
Vlerësimi i progresit në projekt		Punët janë në realizim				

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS				5
Projekti :	Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qyteti, deblokimi i kanalizimit atmosferik-LOT 2	Vlera e projektit:				245,418.44 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik				
Operatori :	“EL-BAU”, SH.P.K.–VITI 2020	Nr.616 18 025 211 dt.20/05/2019				
Menaxheri i projektit :	Bujar Abazi	Projekti i vitit:				2019-2022
Organi mbikëqyrës :	Dukagjin Gashi					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A :2 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë B :2 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë C :27 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë D :123 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në muaj) :2 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (4 herë në muaj) : 2 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (1 herë në muaj) : 27 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (1 herë në muaj) : 123 rrugë				
	Punët në realizim	Larja dhe fshirja e rrugëve të kategorisë A”, A ,B, C, D Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A”, A, B, C, D				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)	Situacioni (XIII)	Situacioni (XIV)
		17,158.74€	22,721.49€	21,161.26€	13,444.83€	
Vonesat						
Shkalla e cilësisë						
Rekomandime masat për tu ndërmarë						
Vlerësimi i progresit në projekt		Punët janë në realizim				

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					6
Projekti :	Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qyteti, deblokimi i kanalizimit atmosferik-LOT 3	Vlera e projektit: 409,969.38 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik					
Operatori :	“Toifor”, SH.P.K.–VITI 2020	Nr.616 18 025 211 dt.23/08/2019					
Menaxheri i projektit :	Bujar Abazi	Projekti i vitit: 2019-2022					
Organi mbikëqyrës :	Halil Halili						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A” :7 sheshet Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A :9 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë B :24rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë C :20 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë D :60rrugë Larja e rrugëve të kategorisë A” (4 herë në muaj) :7 sheshet Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në muaj) :9 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (4 herë në muaj) : 24 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (1 herë në muaj) : 20rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (1 herë në muaj) : 60 rrugë					
	Punët në realizim	Larja dhe fshirja e rrugëve të kategorisë A”, A ,B, C, D Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A”, A, B, C, D					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)	Situacioni (XIII)	Situacioni (XIV)	
		29,035.75€	35,229.99€	25,665.09€	.00€	22,506.32€	
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Punët janë në realizim					


PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					7
Projekti :	Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qyteti, deblokimi i kanalizimit atmosferik-LOT 4	Vlera e projektit: 194,391.28 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik					
Operatori :	“NITI-N” SH.P.K –VITI 2020	Nr.616 18 025 211 dt.20/05/2019					
Menaxheri i projektit :	Bujar Abazi	Projekti i vitit: 2019-2022					
Organi mbikëqyrës :	Xhemajl Vllasaliu						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A :2 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë B :5 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë C :35 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë D :99 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në muaj) :2 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (4 herë në muaj) : 5 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (1 herë në muaj) : 35 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (1 herë në muaj) : 99 rrugë					
	Punët në realizim	Larja dhe fshirja e rrugëve të kategorisë A ,B, C, D Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A, B, C, D					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)	Situacioni (XIII)	Situacioni (XIV)	
		19,437.79€	24,130.99€	14,165.60€	15,683.22€	7,612.97€	
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Punët janë në realizim					


PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					8
Projekti :	Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qyteti, deblokimi i kanalizimit atmosferik-LOT 5	Vlera e projektit: 213,680.72 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik					
Operatori :	“ZAHIRI” SH.P.K –VITI 2020	Nr.616 18 025 211 dt.20/05/2019					
Menaxheri i projektit :	Bujar Abazi	Projekti i vitit: 2019-2022					
Organi mbikëqyrës :	Enver Kadriu						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A : 2 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë B : 7 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë C : 27 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë D : 115 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në muaj) : 2 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (4 herë në muaj) : 7 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (1 herë në muaj) : 27 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (1 herë në muaj) : 115 rrugë					
	Punët në realizim	Larja dhe fshirja e rrugëve të kategorisë A ,B, C, D Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A, B, C, D					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)	Situacioni (XIII)	Situacioni (XIV)	
		21,539.94 €	25,534.72€	21,933.11€	16,332.13€	1,754.64€	
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Punët janë në realizim					

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					9
Projekti :	Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qyteti, deblokimi i kanalizimit atmosferik-LOT 6	Vlera e projektit: 257,543.06 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik					
Operatori :	“VE-MOR” SH.P.K –VITI 2020	Nr.616 18 025 211 dt.20/05/2019					
Menaxheri i projektit :	Bujar Abazi	Projekti i vitit: 2019-2022					
Organi mbikëqyrës :	Bashkim Sadiku						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A :8 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë B :5rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë C :38 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë D :116 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në muaj) :8 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (4 herë në muaj) : 5 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (1 herë në muaj) : 38 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (1 herë në muaj) : 116 rrugë					
	Punët në realizim	Larja dhe fshirja e rrugëve të kategorisë A ,B, C, D Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A, B, C, D					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)- KRIPA DHE RËRA	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)	Situacioni (XIII)	
		13,441.57€	36,965.65€	13,026.99€	5,039.02€	7,081.93€	
	Situacioni (XIV)						
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Punët janë në realizim					


PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS				13	
Projekti :	Shërbimet e Transportit Publik në Komunën e Prishtinës	Vlera e projektit:		2,935,122.60 €			
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik		60 dite			
Operatori :	“Trafiku Urbanë”	Nr.1449					
Menaxheri i projektit	Enver Kadriu	Projekti i vitit:		20.07.2018			
Organi mbikëqyrës :	Halil Halili						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara						
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (XII)	Situacioni (XIII)	Situacioni (XIV)	Situacioni (XV)		
		394,900.67€	366,620.91€	416,700.36€	396,834.00€		
Vonesat							
Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Kontrata është në realizim					

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS							14	
Projekti :	Verndosja, rregullimi dhe riparimi i Ashensorëve								Vlera e projektit: 155,345.00€	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës								Plani dinamik 365 ditë	
Operatori :	SH.P.K "Rima Engineering Group 2004 L.L.C"								Nr.616 20 068 521 dt.18.12.2020	
Menaxheri i projektit :	Bashkim Sadiku								Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :	Enver Kadriu									
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara										
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kanë përfunduar punimet e kafazëve nga banorët në 7 hyrje								
	Punët në realizim	Janë duke u realizuar punimet në ndërtimin e kafazëve nga Banorët në 2 hyrje								
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI	Situacioni VII	Situacioni VIII	Situacioni IX
		Situacioni X	Situacioni XI	Situacioni XII	Situacioni XIII	Situacioni XIV	Situacioni XV	Situacioni XVI	Situacioni XVII	Situacioni
Vonesat Shkalla e cilësisë	Për shkak të kushteve atmosferike punimet kan filluar me dt. 01.03.2021									
Rekomandime masat për tu ndërmarë										
Vlerësimi i progresit në projekt	Jemi në realizim të kontratës mbenda afatit të paraparë janë realizuar 9 ndërtime të kafazeve në 9 hyrje nga banorët jemi në pritje të furnizimit të setit të ashensorëve nga OE.									

 RAPORTI MBIKËQYRËS		15				
Projekti :	Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim atmosferik, Fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese Loto – I -	Vlera e projektit: 84,249.20 €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik				
Operatori :	“Agro Invest 1” Shpk & “Is Company” Shpk.	Nr.616 20 060 521 dt.10.08.2020				
Menaxheri i projektit :	Fatmir Bilalli	Projekti i vitit: 2020				
Organi mbikëqyrës :	Enver Kadriu					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kontrata në realizim				
	Punët në realizim					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		6,743.50€	60,888.20€			
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk ka pasë vonesa					
Rekomandime masat për tu ndërmarë	Puna është duke vazhduar sipas kontratës					
Vlerësimi i progresit në projekt						

 RAPORTI MBIKËQYRËS		16				
Projekti :	Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim atmosferik, Fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese Loto – II -	Vlera e projektit: 25,000.00 €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik				
Operatori :	“NITI-N” SH.P.K	Nr.616 20 060 521 dt.10.08.2020				
Menaxheri i projektit :	Fatmir Bilalli	Projekti i vitit: 2020				
Organi mbikëqyrës :	Dukagjin Gashi					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëlimi fizik	Punët e realizuara	Renovimi i Fontanave; Sheshi “Edit Durham”, “Ibrahim Rugova” izolim, vendosja e pllakave, reflektorve. Pastrimi dhe renovimi i fontanave sheshi “Zahir Pajaziti”, “Nëna Tereze” ndriçimi me reflektor i monumenteve sheshi “Skënderbeu” Sheshi “Edit Durham” monumenti i “KFOR”. Pastrimi i fontanave dhe monumenteve sipas kontratës ne gjith Komunen e Prishtinës.				
	Punët në realizim	Vendosja e reflektorëve dhe mirëmbajtja e fontanave Vazhdim I punëve nga muaji I kalua.				
Vëlimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		14,564.00 €				
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk ka vonesa					
Rekomandime masat për tu ndërmarë						
Vlerësimi i progresit në projekt	Punët janë duke shkuar sipas kontratës					

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 17
Projekti :	"Riorganizimi i kontejnerëve, kontejnerëve të rinjë, rregullimi i platformave, furnizimi me komposter dhe shporta"					Vlera e projektit: 82,790.06 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik 60 dite	
Operatori :	N.N.P. "Ndërtimtari" - Podujevë					Nr.616 20 3070 5-2-1 dt.04.09.2020	
Menaxheri i projektit :	Xhevdet Ibrahimaj					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :	Lumnije Hyseni dhe Xhemshit Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Punët në projektin "Riorganizimi i kontejnerëve, kontejnerëve të rinjë, rregullimi i platformave, furnizimi me komposter dhe shporta", kanë filluar më 04.09.2019 deri më datën 22.09.2020, ku pas kësaj date punimet janë ndërprerë për arsye të pezullimit të punime nga Kabineti i Kryetarit si rrjedhojë e ankesave dhe kundërshtimeve të qytetarëve. Pas fillimit të punimeve për muajin Dhjetor ka pas shumë pengesa në teren nga qytetarët, por gjatë kësaj periudhe janë realizuar këto punë : <ul style="list-style-type: none"> - Piketimi i lokacioneve, - Prerja e asfaltit – betonit, - Largimi i kubëzave varësisht nga terreni - Gërmimi i lokacioneve dhe largimi i materialit deri në deponi, - Vendosja e armaturës dhe betonimi i pllakave të lokacioneve për kontejner, - Betonimi i mureve të lokacioneve për kontejner, - Punimi i konstruksioneve për lokacionet e vendosjes së kontejnerëve, - Montimi dhe vendosja e platformave në pikat e caktuara (19 sosh) 					
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		26.290,31 €					
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk ka pas						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt	Punët e parapara sipas kontratës nuk kanë mund të realizohen për arsye të pezullimit të punimeve nga kabineti i Kryetarit si rrjedhojë e ankesave dhe kundërshtive të qytetarëve						

 RAPORTI MBIKËQYRËS		18					
Projekti :	Mirëmbajtja e hapësirave publike te rrugëve dhe trotuareve në viset rurale Loto – I-	Vlera e projektit: 40,000.00 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik					
Operatori :	“Erë - Lisi” SH.P.K	Nr.616 20 106 521 dt.03.11.2020					
Menaxheri i projektit :	Xhymshit Gashi	Projekti i vitit: 2020					
Organi mbikëqyrës :	Xhemajl Vllasaliu						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Mbledhja e mbeturinave dhe fshirja e hapësirave publike, Mbledhja e mbeturinave, fshirja dhe larja e hapësirave publike					
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		2,763.01€					
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk ka pasë vonesa në punë						
Rekomandime masat për tu ndërmarë							
Vlerësimi i progresit në projekt							

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					19
Projekti :	Mirëmbajtja e hapësirave publike te rrugëve dhe trotuareve në viset rurale Loto – II -	Vlera e projektit:					100,000.00 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik					
Operatori :	“Light and More” Shpk & SH.P.K.N.N“Global Ing”	Nr.616 20 106 521 dt.03.11.2020					
Menaxheri i projektit :	Xhymshit Gashi	Projekti i vitit:					2020
Organi mbikëqyrës :	Habib Qorri						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Rivendosja e pengesave nga goma, Nivelizim dhe grederim i rrugës, Vendosja e gomave për ndarje fizike të shiritave, Demontimi i trupave ndriçues të dëmtuar në nënkalime, Krasitje e degëve, barishteve, therrave dhe bimëve tjera, Montimi i kanaleve për kabllot 3-5mm në nënkalime, Instalimi i kabllove 3x2.5mm në nënkalime, Montimi i dritave modulare 45w në nënkalime,					
	Punët në realizim	Janë duke vazhduar .					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		14,188.00€	18,131.00€	20,345.19€			
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk ka pasë vonesa në punë						
Rekomandime masat për tu ndërmarë	Puna është duke vazhduar sipas kontratës						
Vlerësimi i progresit në projekt							

 RAPORTI MBIKËQYRËS		20				
Projekti :	Mirëmbajtja e hapësirave publike te rrugëve dhe trotuareve në viset rurale Loto – III -	Vlera e projektit: 100,000.00 €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik				
Operatori :	“Light and More” Shpk & SH.P.K.N.N“Global Ing”	Nr.616 20 106 521 dt.03.11.2020				
Menaxheri i projektit :	Xhymshit Gashi	Projekti i vitit: 2020				
Organi mbikëqyrës :	Fatmir Bilalli					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Ngjyrosja e rrethojës me lartësi mbi 1.3m, Lyerja e fasadës në mure – 1.5mm, Ndjyrosja e mureve me ngjyrë.				
	Punët në realizim	Janë duke vazhduar ngjyrosjet ne te njejtat vende.				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		26,848.47€				
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk ka pasë vonesa në punë					
Rekomandime masat për tu ndërmarë	Puna është duke vazhduar sipas kontratës					
Vlerësimi i progresit në projekt						

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					21	
Projekti :	Ndërtimi i strehimoreve për qentë endacak dhe trajtimi i tyre	Vlera e projektit: 108,587.40€						
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik Ditë						
Operatori :	SH.P.K "Gama Ing"	616 20 142 521 dt.29.12.2020						
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Gashi	Projekti i vitit: 2020						
Organi mbikëqyrës :	Ylber Jashari Bashkim Sadiku Afrim Gashi							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara							
	Punët në realizim							
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		00.00€						
Vonesat Shkalla e cilësisë	Për shkak të kushteve atmosferike dhe punimet fillojnë me përmirësimin e kushteve atmosferike							
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt								


PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					22	
Projekti :	Mirëmbajtja e Semaforëve						Vlera e projektit: 50,000.00€	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës						Plani dinamik Ditë	
Operatori :	NTSH "Ekoinvest"						616 20 088 221 dt.04.09.2020	
Menaxheri i projektit :	Habib Qorri						Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :	Bashkim Sadiku Enver Kadriu Halil Halili							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Intervenime të ndryshme në nyjet semaforike sipas nevojës dhe dëmtimeve të ndryshme.						
	Punët në realizim	Kontratë është në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		12,821.00€	19,325.00€	16,330.00€				
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk kemi pasur vonesa							
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt	Kontrata është duke u realizuar sipas kushteve të kontratës dhe nevojave që paraqiten në teren nga defektet.							

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					23	
Projekti :	Mirëmbajtja e ndriçimit publik –LOT 1-emergjente	Vlera e projektit:						20,000.00€
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik						Ditë
Operatori :	NSH “MVR-ELEKTROMONTUES”	616 21 003 225						dt.08.02.2021
Menaxheri i projektit :	Xhymshit Gashi	Projekti i vitit:						2021
Organi mbikëqyrës :	Bashkim Sadiku Afrim Gashi Enver Kadriu Halil Halili							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Intervenime të ndryshme në rrugët sipas listës dhe kërkesave sipas nevojës dhe dëmtimeve të ndryshme.						
	Punët në realizim	Kontratë është në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		8,513.90€						
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk kemi pasur vonesa							
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt	Kontrata është duke u realizuar sipas kushteve të kontratës dhe nevojave që paraqiten në teren nga defektet.							

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					24	
Projekti :	Mirëmbajtja e ndriçimit publik –LOT 3-emergjente	Vlera e projektit:						20,000.00€
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik						Ditë
Operatori :	SH.P.K “DARDANIA”	616 21 003 225						dt.08.02.2021
Menaxheri i projektit :	Xhymshit Gashi	Projekti i vitit:						2021
Organi mbikëqyrës :	Bashkim Sadiku Afrim Gashi Enver Kadriu Halil Halili							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Intervenime të ndryshme në rrugët sipas listës dhe kërkesave sipas nevojës dhe dëmtimeve të ndryshme.						
	Punët në realizim	Kontratë është në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		5,505.90€	7,969.40€					
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk kemi pasur vonesa							
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt	Kontrata është duke u realizuar sipas kushteve të kontratës dhe nevojave që paraqiten në teren nga defektet.							

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					25	
Projekti :	Mirëmbajtja e ndriçimit publik –LOT 4- emergjente	Vlera e projektit:						8,000.00€
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik						Ditë
Operatori :	SH.P.K “RISAMONT”	616 21 003 225						dt.08.02.2021
Menaxheri i projektit :	Xhymshit Gashi	Projekti i vitit:						2021
Organi mbikëqyrës :	Bashkim Sadiku Afrim Gashi Enver Kadriu Halil Halili							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Intervenime të ndryshme në rrugët sipas listës dhe kërkesave sipas nevojës dhe dëmtimeve të ndryshme.						
	Punët në realizim	Kontratë është në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		4,717.00€						
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk kemi pasur vonesa							
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt	Kontrata është duke u realizuar sipas kushteve të kontratës dhe nevojave që paraqiten në teren nga defektet.							

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					25	
Projekti :	Mirëmbajtja e ndriçimit publik –LOT 5- emergjente	Vlera e projektit:						12,000.00€
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik						Ditë
Operatori :	N.T.SH “INLINE ENGINEERING”	616 21 003 225						dt.08.02.2021
Menaxheri i projektit :	Xhymshit Gashi	Projekti i vitit:						2021
Organi mbikëqyrës :	Bashkim Sadiku Afrim Gashi Enver Kadriu Halil Halili							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Intervenime të ndryshme në rrugët sipas listës dhe kërkesave sipas nevojës dhe dëmtimeve të ndryshme.						
	Punët në realizim	Kontratë është në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		3,395.00€	8,224.49€					
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk kemi pasur vonesa							
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt	Kontrata është duke u realizuar sipas kushteve të kontratës dhe nevojave që paraqiten në teren nga defektet.							

		<h1 style="text-align: center;">RAPORTI MBIKËQYRËS</h1>					26		
Projekti :	Mirëmbajtja e ndriçimit publik –LOT 6- emergjente	Vlera e projektit:						20,000.00€	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik						Ditë	
Operatori :	N.N.P “NDRIQIMI”	616 21 003 225						dt.08.02.2021	
Menaxheri i projektit :	Xhymshit Gashi	Projekti i vitit:						2021	
Organi mbikëqyrës :	Bashkim Sadiku Afrim Gashi Enver Kadriu Halil Halili								
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara									
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Intervenime të ndryshme në rrugët sipas listës dhe kërkesave sipas nevojës dhe dëmtimeve të ndryshme.							
	Punët në realizim	Kontratë është në realizim							
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)			
		4,129.00€							
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk kemi pasur vonesa								
Rekomandime masat për tu ndërmarë									
Vlerësimi i progresit në projekt	Kontrata është duke u realizuar sipas kushteve të kontratës dhe nevojave që paraqiten në teren nga defektet.								

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					27	
Projekti :	Mirëmbajtja e rrugëve rurale në loton 1	Vlera e projektit:						67.621,70€
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 35						Ditë
Operatori :	“EL-BAU” sh.p.k.	616 20 088 221						dt.20.05.2020
Menaxheri i projektit :	Habib Qorri	Projekti i vitit:						2019
Organi mbikëqyrës :	Xhemshit Gashi							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Mirëmbajtja e rrugëve rurale në loton 1 Pastrimi dhe largimi i borës nga rrugët rurale, hedhja e kripës dhe rërës si dhe largimi i shembjeve të dheut nga rrugët. Në loton 1 janë të planifikuara të mirëmbahen 37 rrugë.						
	Punët në realizim	Kontratë është në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		24,910.00€	19,061.10€	21,879.21€	21,998.58€			
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk kemi pasur vonesa							
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt	Kontrata është duke u realizuar sipas kushteve të kontratës dhe nevojave që paraqiten në teren nga defektet.							

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					28	
Projekti :	Mirëmbajtja e rrugëve rurale në loton 2	Vlera e projektit:						81.754,59€
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 35						Ditë
Operatori :	“VZ COMPANY” sh.p.k.	616 19 179 211						dt.20.05.2020
Menaxheri i projektit :	Habib Qorri	Projekti i vitit:						2019
Organi mbikëqyrës :	Sabri Gashi							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Mirëmbajtja e rrugëve rurale në loton 2 Pastrimi dhe largimi i borës nga rrugët rurale, hedhja e kripës dhe rërës si dhe largimi i shembjeve të dheut nga rrugët. Në loton 3 janë të planifikuara të mirëmbahen 30 rrugë.						
	Punët në realizim	Kontratë është në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		16.218,00€	25,555.63	35,727.29€	26,052.72€			
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk kemi pasur vonesa							
Rekomandime masat për tu ndërmarre								
Vlerësimi i progresit në projekt	Kontrata është duke u realizuar sipas kushteve të kontratës dhe nevojave që paraqiten në teren nga defektet.							


PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					29	
Projekti :	Mirëmbajtja e rrugëve rurale në loton 3	Vlera e projektit:					62.943,91€	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik					Ditë	
Operatori :	“DARDANIA” sh.p.k.	616 19 179 211					dt.20.05.2020	
Menaxheri i projektit :	Habib Qorri	Projekti i vitit:					2019	
Organi mbikëqyrës :	Xhevdet Ibrahimaj							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Mirëmbajtja e rrugëve rurale në loton 3 Pastrimi dhe largimi i borës nga rrugët rurale, hedhja e kripës dhe rërës si dhe largimi i shembjeve të dheut nga rrugët. Në loton 3 janë të planifikuara të mirëmbahen 22 rrugë.						
	Punët në realizim	Kontratë është në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		15,594.00€	22,556.31	22,552.81€	22,120.80€			
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk kemi pasur vonesa							
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt	Kontrata është duke u realizuar sipas kushteve të kontratës dhe nevojave që paraqiten në teren nga defektet.							

Viti 2021	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor
Rastet	694	583	601	498	616							

Viti 2021	Te hyrat nga pag. e mbetur.	Te hyrat nga Hortikultura	Konfiskimi i Automjeteve	Taks nga shfrytëzimi i Hapësirave publike	Provizion	Gjithsej
Janar	194,542.10€	6,780.00€	3,122.50€	5,478.30€	2.00€	209,924.90€
Shkurt	195,859.75€	15,523.00€	3,371.50€	9,953.50€	4.00€	224,711.75€
Mars	213,607.21€	17,504.00€	4,175.00€	2,488.80€	4.00€	237,779.01€
Prill	176,227.39€	16,761.00€	4,600.00€	1,656.80€	4.00€	199,249.19€
Maj	164,151.94€	15,879.00€	8,592.75€	425.00€	4.00€	189,052.69€
Qershor						
Korrik						
Gusht						
Shtator						
Tetor						
Nëntor						
Dhjetor						
TOTALI:						1,060,717.54€



Qendra Komunale, pranimi i rasteve-thirrjeve në telefonat kujdestar pa pagesë 24/7"

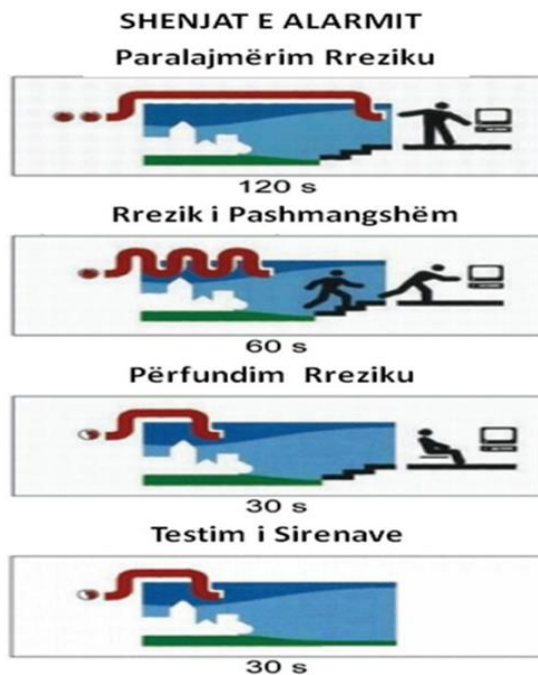

Testimi i sistemit të alarmimit publik pa zë, më 03.05.2021

RREZIK NGA AJRI - Sinjali i alarmimit rrezik nga ajri është: 60 sekonda zë valor pa ndërprerë.

RREZIK NGA MJETET KIMIKE, BIOLOGJIKE DHE RADIOLOGJIKE - Sinjali i alarmimit rrezik nga mjetet kimike, biologjike dhe radiologjike është: tre zëra valorë nga 20 sekonda, me dy pauza nga 15 sekonda në mes (20 sek. zë valor + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë valor + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë valor).

RREZIK NGA FATKEQËSITË ELEMENTARE DHE NATYRORE - Sinjali i alarmimit rrezik nga fatkeqësitë elementare dhe natyrore është: dy zëra të njëtrajtshëm me nga 20 sekonda dhe një zë valor prej 20 sekondave në mes (20 sek. zë i njëtrajtshëm + 20 sek. zë valor + 20 sek. zë i njëtrajtshëm).

RREZIK NGA ZJARRI - Sinjali i alarmimit rrezik nga zjarri është: tre zëra të njëtrajtshëm nga 20 sekonda dhe dy pauza nga 15 sekonda në mesë (20 sek. zë i njëtrajtshëm + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë i njëtrajtshëm + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë i njëtrajtshëm).

KALIMI I RREZIKUT - Sinjali i alarmimit kalimi i rrezikut është: 60 sekonda zë i njëtrajtshëm pa ndërprerë.



Mirëmbajtja e sistemit të alarmimit publik dhe testimi i tyre çdo muaj, si dhe R-L, kamerave dhe pajisjeve tjera teknike në qendër.

**Zyrtarë i lartë i energjetikës
Bashkim Sadiku**

**Drejtores :
Medina Braha**

**Maj 2021
Prishtinë.**
