

Raporti i vitit 2020 Dhjetor 01-31.12.2020

1. Drejtoria e Shërbimeve Publike Mbrojtje dhe Shpëtim

Drejtoria e Shërbimeve Publike Mbrojtje dhe Shpëtim është e ndarë në katër sektorë;

- *Spektori për Shërbime Publike;*
- *Spektori për Menaxhimin e Mbeturinave dhe Ambientit;*
- *Spektori për Mbrojtje dhe Shpëtim;*
- *Spektori i Transportit dhe Trafikut;*

1.1 Spektori për Shërbime Publike

Drejtoria e Ky sektor merret me menaxhimin dhe shfrytëzimin e hapësirave publike në përputhje me planet komunale, është përgjegjëse për dhënie e lejeve për shfrytëzimin e hapësirave publike, mirëmbajtjen, modernizimin dhe zgjerimin e ndriçimit publik, përkujdeset për ashensorët (riparimi dhe rregullimi), kujdeset për mirëmbajtjen dhe funksionimin normal të fontanave dhe monumenteve publike, kryen edhe punë të tjera, në bazë të ligjeve të aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së Drejtorisë.

1.2 Spektori për menaxhimin e Mbeturinave dhe Ambientit:

Organizon mirëmbajtjen verore dhe dimërore të rrugëve lokale dhe në vendbanime, pastrimin e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, mbikëqyrë realizimin e punëve për rregullimin e gjelbërimit dhe shqyrton kërkesat e ndryshme, kujdeset për menaxhimin, kontrollimin dhe pastrimin e të gjitha shesheve që i përkasin komunës, organizon dhe menaxhon mbledhjen e mbeturinave dhe zhvillon projekte të ndryshme që ndikojnë në përmirësimin e shërbimit të mbledhjes së mbeturinave, zvogëlimin e ndotjes dhe promovimin e uljes së sasisë së mbeturinave, organizon mirëmbajtjen dhe zhblokimin e rrjetit të kanalizimit atmosferik dhe planet për ngrohtoret lokale, organizon sigurimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike, hapësirave gjelbëruese, parqeve publike dhe varrezave, organizohet për zvogëlimin gradual të ndotjes, degradimit dhe të dëmit mjedisor, si dhe zvogëlimin ose ndalimin e atyre aspekteve ekonomike dhe të aktiviteteve të tjera që përbëjnë rrezik për shëndetin e njeriut dhe mjedisin.

1.3 Spektori për Mbrojtje dhe Shpëtim:

Merret me parandalimin e fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera, vlerëson rrezikshmërinë e tyre brenda territorit të komunës, shpëtimin e njerëzve dhe të mirave materiale, si dhe harton planet operative për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera siç janë; tërmetet, vërshimet, rrëshqitjet e dheut, ortelet e borës, erëra të fuqishme, breshër, borë me acar, thatësi, zjarre, bllokim të rrugëve, shpërthim i sëmundjeve infektive që ndikojnë në njerëz, kafshë ose bimë si dhe fatkeqësi tjera të shkaktuara nga natyra apo njerëzit.

1.4 Spektori i Transportit dhe Trafikut:

Koordinon aktivitetin dhe jep pëlqimin për veprimtarinë e transportit publik të udhëtarëve dhe mallrave, me kompanitë publike dhe shoqatat e taksistëve individualë dhe operatorëve juridikë, sipas rregulloreve; cakton linjat dhe rendin e udhëtimit për transportin publik të udhëtarëve, menaxhon sektorin me “merimangë”, sipas rregullores, organizon procedurat për ankand publik për automjetet e konfiskuara, që kalojnë afatin e paraparë me ligj, bashkëpunon me policinë për rregullimin e komunikacionit dhe ngritjen e sigurisë në komunikacion, kujdeset për sinjalizimin vertikal dhe horizontal të rrugëve ekzistuese dhe rregullon komunikacionin në qytetin e Prishtinës, vendos për mbylljen e përkohshme të rrugëve për shfrytëzimin e tyre.

2. Shqyrtimi i kërkesave

Gjatë muajit Janar drejtoria ka proceduar 256 kërkesa të ndryshme: për shfrytëzim të hapësira para lokaleve, reklama, transport, parkingje, siguri në trafik për emergjenca (vërshime, zjarre, shembje të rrugëve, trotuareve, drunjtëve të ndryshëm), për shitje ambulante, për mbeturina. Nga numri i përgjithshëm prej 256 kërkesave të pranuar, të gjitha të përfunduara.

Rastet e intervenimeve Emergjente 5

Lëndët e Komisionit për mbeturina 164

Lëndët e Komisionit për shfrytëzim të hapësira para lokaleve 79

Lëndët për reklama 8

Rastet e pranuar në Qendren e thirrjeve 404

2.1. Dërgimi i kërkesave për Hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimi i nevojave

Pergatitja e projekteve paramasave dhe specifikimeve për projektet e planifikuara gjatë kësaj perjudhe.

3.1. Raportimi i Menaxhereve te projekteve dhe Kontratave

Drejtoria	Drejtoria e Shërbimeve Publike Mbrojtje dhe Shëtim
Sektori	Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim, Menaxhimin e mbeturinave dhe Ambientit, Transportit dhe Trafikut.
Drejtores	Medina Braha
Raportoi	Habib Qorri, Fatmir Bilalli, Dukagjin Gashi / shef sektori
Kontrollon – Përpunon	
Periudha raportuese	01- 31.12.2020 muaji Dhjetor
Menaxhëret e projekteve dhe Organi mbikqyrës	Habib Qorri Dukagjin Gashi Fatmir Bilalli Xhemshit Gashi Bashkim Gashi Enver Kadriu Afrim Gashi Xhevdet Ibrahimaj Halil Halili Lumnije Hyseni Xhemile Gashi Sabri Gashi

		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 1	
Projekti :		Mobileria urbane-Furnizimi dhe vendosja priturve për autobus të transportit publik të udhëtareve					Vlera e projektit: 292,500.00€	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		“Selmans Network” shpk “BM Group”					Nr.616-19-5545-1-1-1 dt.30.10.2019	
Menaxheri i projektit :		Halil Halili					Projekti i vitit: 2019	
Organi mbikëqyrës :		Habib Qorri Enver Kadru						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Deri me tani janë instaluar 35 konstruksionet të pritoreve sipas lokacionet të kërkuara nga Komuna e Prishtinës						
	Punët në realizim	Janë duke u realizuar bazamentet në lokacionet dhe prodhimin dhe furnizimin me elementet baze të pritores (LCD).						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		/	/	/		/		
Vonesat Shkalla e cilësisë		Vonesa janë për shkaqe qe ndryshimeve ne projekte dhe mangësi në specifika teknike për të kompletuar pritoren						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë		Rekomandimet qe duhen të ndermirën për shkak të vonesave nga OE duke bazuar në kushtet e kontratës duhen të ndërmarrën masa për ndërprerje të kontratës						
Vlerësimi i progresit në projekt								

		RAPORTI MBIKËQYRËS					2	
Projekti :		Rregullimi dhe rrethimi i varrezave të Komunës së Prishtinës					Vlera e projektit: 100,00.00 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		I.P.N.EU SHPK					Nr.616 19 059 521 dt.29.04.2020	
Menaxheri i projektit :		Habib Qorri					Projekti i vitit: 2019	
Organi mbikëqyrës :		Xhemshit Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara							
	Punët në realizim							
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		9,711.00€						
Vonesat Shkalla e cilësisë		Nuk është punuar asgjë jemi ne pritje.						
Rekomandime masat për tu ndërmarë		Për shkak të vonesave për realizimin e kontratës kemi propozuar të ndërmerren masat ligjore për shkëputje të kontratës pasi që deri më tani kompania nuk ka vazhduar me punime.						
Vlerësimi i progresit në projekt								

		RAPORTI MBIKËQYRËS				SHIFRA 3	
Projekti :	Ndërtimi i implantit të Kompostimit				Vlera e projektit: 139,782.20 €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës				Plani dinamik 90 Ditë		
Operatori :	"Noti-Beton" SH.P.K				616-19-5495-5-2-1 30.09.2019		
Menaxheri i projektit	Nazmije Tora				Projekti i vitit: 2020		
Organi mbikëqyrës :	Dukagjin Gashi, Seniha Bajraktari						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Jane realizuar te gjitha punët ne baze te pozici Janë realizuar te gjitha punët nga pozicionet e kontratës: 1.Punet përgatitore dhe matjet gjeodezike. 2.Punet tokësore 3.Shtresat konstruktive 4.Largimi i ujërave atmosferike 5.Objektet 7.Ndriqimi					
	Punët në realizim	Nga pozicioni 5 dhe 6 punët janë kryer pjesërisht. Kane mbetur edhe një pjese e mbulesës (kulmit) te objekteve përcjellëse si dhe furnizimi me zyrën administrative(kontejnerë).					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		18,041.20€	19,741.77	66,050.00€			
Vonesat Shkalla e cilësisë		Vonesat ne punime kanë qenë për shkak të rastit të Pandemisë si dhe kushteve atmosferike.					
Rekomandime masat për tu ndërmarrë		Kompanisë i mbetet qe të plotësoj edhe kërkesat për përmirësim të gjendjes fizike të hapësirës për rreth objekteve si dhe ta bëje furnizimin me kontejnerë-zyrë administrative sipas përshkrimit në kontratë.					
Vlerësimi i progresit në projekt							

		RAPORTI MBIKËQYRËS					4
Projekti :	Kontrata në Shtëpi					Vlera e projektit: 1,440,000.00 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :	KRM ‘Pastrimi’					Nr.	
Menaxheri i projektit :	Lumnije Hyseni					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :	1. Xhevdet Ibrahimaj 2. Afrim Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	1.Mbledhja,largimi dhe transportimi i mbeturinave të amvisërisë. 2.Mbledhja,largimi dhe transportimi i mbetjeve urbane 48,82 ton 3.Mbledhja dhe largimi i mbetjeve inerte 48.26 ton. 4. Faturimi dhe shpërndarje e faturave për mbeturina 58.000 5. Larja dhe dezinfektimi i lokacioneve edhe kontejnerëve 6.Lokimi dhe dislokimi i kontejnerëve sipas kërkesës nga ana e komunës 02.					
	Punët në realizim	Të gjitha pikat e lartë cekura					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI
		222,455.29€	222,335.00€	342,818.00€	222,311.00€	243,593.00	227,603.000€
Vonesat							
Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarë		Për arritjen e evitimit të deponive ilegale rekomandojmë që pas largimit të mbeturinave të vendosen rrethojat në hapësirat e pastruara dhe mundësisht të gjelbërimi i tyre					
Vlerësimi i progresit në projekt		Gjatë këtij muaji është eliminuar deponia masive e mbeturinave inerte, në lagjen Kodra e Trimave,rr.Selman Kadrija ku jane larguar 1.600 m³.					

		RAPORTI MBIKËQYRËS					5	
Projekti :		Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qyteti, deblokimi i kanalizimit atmosferik-LOT 1					Vlera e projektit: 261,722.50 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		“Dardania”, SH.P.K.–VITI 2020					Nr.616 18 025 211 dt.20/05/2019	
Menaxheri i projektit :		Bujar Abazi					Projekti i vitit: 2019-2022	
Organi mbikëqyrës :		Afrim Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A :1 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë B :6 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë C :29 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë D :165 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në muaj) : 1 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (4 herë në muaj) : 6 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (1 herë në muaj) : 38 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (1 herë në muaj) : 165rrugë						
	Punët në realizim	Larja dhe fshirja e rrugëve të kategorisë A ,B, C, D Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A, B, C, D						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)-KRIPA DHE RËRA	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		16,456.75€	17,388.89€	30,573.69€	23,575.59€	13,919.52€		
		Situacioni (VI)	Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)- KRIPA DHE RËRA	Situacioni (IX)	Situacioni (X)		
		37,882.82€	29,766.91€	16,456.75€	9,002.05€	22,818.59€		
Vonesat								
Shkalla e cilësisë								
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt		Punët janë në realizim						

		RAPORTI MBIKËQYRËS					6	
Projekti :		Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qyteti, deblokimi i kanalizimit atmosferik-LOT 2					Vlera e projektit: 245,418.44 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		“EL-BAU”, SH.P.K.–VITI 2020					Nr.616 18 025 211 dt.20/05/2019	
Menaxheri i projektit :		Bujar Abazi					Projekti i vitit: 2019-2022	
Organi mbikëqyrës :		Dukagjin Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A :2 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë B :2 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë C :27 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë D :123 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në muaj) :2 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (4 herë në muaj) : 2 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (1 herë në muaj) : 27 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (1 herë në muaj) : 123 rrugë						
	Punët në realizim	Larja dhe fshirja e rrugëve të kategorisë A”, A ,B, C, D Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A”, A, B, C, D						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)-KRIPA DHE RËRA	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		26,500.20€	12,355.40€	23,491.29€	16,861.10€	11,957.99€		
		Situacioni (VI)	Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)- KRIPA DHE RËRA	Situacioni (IX)	Situacioni (X)		
		44,077.04€	19,052.68€	33,760.20€	8,442.95€	17,158.74€		
Vonesat								
Shkalla e cilësisë								
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt		Punët janë në realizim						

		RAPORTI MBIKËQYRËS					7	
Projekti :		Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qyteti, deblokimi i kanalizimit atmosferik-LOT 3					Vlera e projektit: 409,969.38 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		“Toifor”, SH.P.K.–VITI 2020					Nr.616 18 025 211 dt.23/08/2019	
Menaxheri i projektit :		Bujar Abazi					Projekti i vitit: 2019-2022	
Organi mbikëqyrës :		Halil Halili						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A” :7 sheshet Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A :9 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë B :24rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë C :20 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë D :60rrugë Larja e rrugëve të kategorisë A” (4 herë në muaj) :7 sheshet Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në muaj) :9 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (4 herë në muaj) : 24 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (1 herë në muaj) : 20rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (1 herë në muaj) : 60 rrugë						
	Punët në realizim	Larja dhe fshirja e rrugëve të kategorisë A”, A, B, C, D Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A”, A, B, C, D						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)-KRIPA DHE RËRA	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		23,177.60€	24,317.22€	35,539.21€	26,184.39€	21,679.03€		
		Situacioni (VI)	Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)- KRIPA DHE RËRA	Situacioni (IX)	Situacioni (X)		
		36,251.98€	36,896.23€	23,177.60€	17,653.75€	29,035.75€		
Vonesat								
Shkalla e cilësisë								
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt		Punët janë në realizim						

		RAPORTI MBIKËQYRËS					8	
Projekti :		Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qyteti, deblokimi i kanalizimit atmosferik-LOT 4					Vlera e projektit: 194,391.28 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		“NITI-N” SH.P.K –VITI 2020					Nr.616 18 025 211 dt.20/05/2019	
Menaxheri i projektit :		Bujar Abazi					Projekti i vitit: 2019-2022	
Organi mbikëqyrës :		Xhemajl Vllasaliu						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A :2 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë B :5 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë C :35 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë D :99 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në muaj) :2 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (4 herë në muaj) : 5 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (1 herë në muaj) : 35 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (1 herë në muaj) : 99 rrugë						
	Punët në realizim	Larja dhe fshirja e rrugëve të kategorisë A ,B, C, D Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A, B, C, D						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I) KRIPA DHE RËRA	Situacioni (II)	Situacioni (III)-	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		16,595.02€	12,317.93€	24,149.59€	16,497.79€	14,768.57€		
		Situacioni (VI)	Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)- KRIPA DHE RËRA	Situacioni (IX)	Situacioni (X)		
		34,811.30€	16,668.32€	16,273.40€	10,787.01€	19,437.79€		
Vonesat								
Shkalla e cilësisë								
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt		Punët janë në realizim						

		RAPORTI MBIKËQYRËS					9	
Projekti :		Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qyteti, deblokimi i kanalizimit atmosferik-LOT 5					Vlera e projektit: 213,680.72 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		“ZAHIRI” SH.P.K –VITI 2020					Nr.616 18 025 211 dt.20/05/2019	
Menaxheri i projektit :		Bujar Abazi					Projekti i vitit: 2019-2022	
Organi mbikëqyrës :		Enver Kadriu						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A : 2 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë B : 7 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë C : 27 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë D : 115 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në muaj) : 2 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (4 herë në muaj) : 7 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (1 herë në muaj) : 27 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (1 herë në muaj) : 115 rrugë						
	Punët në realizim	Larja dhe fshirja e rrugëve të kategorisë A ,B, C, D Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A, B, C, D						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)-KRIPA DHE RËRA	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		13,275.39 €	24,735.23 €	17,953.00 €	17,515.45 €	10,480.15 €		
		Situacioni (VI)	Situacioni (VII)	Situacioni (VIII))-KRIPA DHE RËRA	Situacioni (IX)	Situacioni (X)		
		42,345.93 €	29,988.04 €	17,953.00 €	15,371.67 €	21,539.94 €		
Vonesat								
Shkalla e cilësisë								
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt		Punët janë në realizim						

10


Projekti :	Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qyteti, deblokimi i kanalizimit atmosferik-LOT 6	Vlera e projektit: 257,543.06 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik
Operatori :	“VE-MOR” SH.P.K –VITI 2020	Nr.616 18 025 211 dt.20/05/2019
Menaxheri i projektit :	Bujar Abazi	Projekti i vitit: 2019-2022
Organi mbikëqyrës :	Bashkim Sadiku	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara


Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A :8 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë B :5rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë C :38 rrugë Pastrimi i rrugëve me reshje me borë D :116 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në muaj) :8 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (4 herë në muaj) : 5 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (1 herë në muaj) : 38 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (1 herë në muaj) : 116 rrugë					
	Punët në realizim	Larja dhe fshirja e rrugëve të kategorisë A ,B, C, D Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A, B, C, D					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)- KRIPA DHE RËRA	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		36,972.34€	10,253.68€	16,822.61€	13,486.72€	12,655.82€	
		Situacioni (VI)	Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)- KRIPA DHE RËRA	
		39,503.64€	21,001.91€	7,812.92€	13,441.57€	36,965.65€	
Vonesat							
Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Punët janë në realizim					

		RAPORTI MBIKËQYRËS					11	
Projekti :		Mirëmbajtja e rrugëve rurale në loton 1					Vlera e projektit: 67.621,70€	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik 35 Ditë	
Operatori :		"EL-BAU" sh.p.k.					616 20 088 221 dt.20.05.2020	
Menaxheri i projektit :		Habib Qorri					Projekti i vitit: 2019	
Organi mbikëqyrës :		Xhemshit Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Mirëmbajtja e rrugëve rurale në loton 1 Pastrimi dhe largimi i borës nga rrugët rurale, hedhja e kripës dhe rërës si dhe largimi i shembjeve të dheut nga rrugët. Në loton 1 janë të planifikuara të mirëmbahen 37 rrugë.						
	Punët në realizim	Kontratë është në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		24,910.00€						
Vonesat Shkalla e cilësisë		Nuk kemi pasur vonesa						
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt		Kontrata është duke u realizuar sipas kushteve të kontratës dhe nevojave që paraqiten në teren nga defektet.						

		RAPORTI MBIKËQYRËS					12	
Projekti :		Mirëmbajtja e rrugëve rurale në loton 2					Vlera e projektit: 81.754,59€	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik 35 Ditë	
Operatori :		“VZ COMPANY” sh.p.k.					616 19 179 211 dt.20.05.2020	
Menaxheri i projektit :		Habib Qorri					Projekti i vitit: 2019	
Organi mbikëqyrës :		Sabri Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Mirëmbajtja e rrugëve rurale në loton 2 Pastrimi dhe largimi i borës nga rrugët rurale, hedhja e kripës dhe rërës si dhe largimi i shembjeve të dheut nga rrugët. Në loton 3 janë të planifikuara të mirëmbahen 30 rrugë.						
	Punët në realizim	Kontratë është në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		16.218,00€						
Vonesat Shkalla e cilësisë		Nuk kemi pasur vonesa						
Rekomandime masat për tu ndërmarre								
Vlerësimi i progresit në projekt		Kontrata është duke u realizuar sipas kushteve të kontratës dhe nevojave që paraqiten në teren nga defektet.						

		RAPORTI MBIKËQYRËS					13	
Projekti :		Mirëmbajtja e rrugëve rurale në loton 3					Vlera e projektit: 62.943,91€	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik Ditë	
Operatori :		“DARDANIA” sh.p.k.					616 19 179 211 dt.20.05.2020	
Menaxheri i projektit :		Habib Qorri					Projekti i vitit: 2019	
Organi mbikëqyrës :		Xhevdet Ibrahimaj						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Mirëmbajtja e rrugëve rurale në loton 3 Pastrimi dhe largimi i borës nga rrugët rurale, hedhja e kripës dhe rërës si dhe largimi i shembjeve të dheut nga rrugët. Në loton 3 janë të planifikuara të mirëmbahen 22 rrugë.						
	Punët në realizim	Kontratë është në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		15,594.00€						
Vonesat Shkalla e cilësisë		Nuk kemi pasur vonesa						
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt		Kontrata është duke u realizuar sipas kushteve të kontratës dhe nevojave që paraqiten në teren nga defektet.						

		RAPORTI MBIKËQYRËS					14	
Projekti :		Shërbimet e Transportit Publik në Komunën e Prishtinës					Vlera e projektit: 2,935,122.60 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik 60 dite	
Operatori :		“Trafiku Urbanë”					Nr.1449	
Menaxheri i projektit		Enver Kadriu					Projekti i vitit: 20.07.2018	
Organi mbikëqyrës :		Halil Halili						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara							
	Punët në realizim							
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		320,850.39€	296,991.84€	370,116.05€	229,233.01€	430,099.14€		
		Situacioni (VI)	Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)		
		438,073.47€	445,894.00€	403,864.70€	395,956.02€	358,596.20€		
		Situacioni (XI)						
		540,472.08€						
Vonesat								
Shkalla e cilësisë								
Rekomandime masat për tu ndërmarrë								
Vlerësimi i progresit në projekt								

		RAPORTI MBIKËQYRËS					15			
Projekti :		RIPARIMI DHE RREGULLIMI I ASHENSORËVE						Vlera e projektit: 200,000.00€		
Investuesi :		Komuna e Prishtinës						Plani dinamik 365 ditë		
Operatori :		SH.P.K “EJONA”						Nr.616 19 1538 521 dt.08.11.2019		
Menaxheri i projektit :		Bashkim Sadiku						Projekti i vitit: 2019		
Organi mbikëqyrës :		Enver Kadriu								
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara										
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Janë realizuar mirëmbajtje në institucione publike komunale, riparimet në hyrjet e përcaktuara me participim.								
	Punët në realizim	Mirëmbajtja në institucione publike komunale dhe fillimi i riparimit të ashensorëve në hyrjet e përcaktuara.								
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI	Situacioni VII	Situacioni VIII	Situacioni IX
		8,432.00 €	8,200.80€	4,699.00€	5,435.00 €	2,902.00 €	3,222.80 €	4,426.00 €	3,629.40€	4.429.00€
		Situacioni X	Situacioni XI	Situacioni XII	Situacioni XIII	Situacioni XIV	Situacioni XV	Situacioni XVI	Situacioni XVII	Situacioni
		4,023.00 €	25,710.40€	33,609.20€	34,450.40€	21,247.80€	27,432.80€	8,148.40 €		
Vonesat Shkalla e cilësisë										
Rekomandime masat për tu ndërmarrë										
Vlerësimi i progresit në projekt		Ka përfunduar Kontrata dhe janë realizuar punimet në Hyrjet:Ashensori në hyrje tek qafa, Ashensori në lakrishtë, Ashensori në Ulpianë, Ashensori rr.28 Nëntori-Dardani dhe Ashensori rr.Ilaz Kodra Dardani.								

		RAPORTI MBIKËQYRËS					16	
Projekti :		Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim atmosferik, Fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese Loto – I					Vlera e projektit: 84,249.20 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		“Agro Invest 1” Shpk & “Is Company” Shpk.					Nr.616 20 060 521 dt.10.08.2020	
Menaxheri i projektit :		Fatmir Bilalli					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :		Enver Kadriu						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Pastrimi i shtratit të lumit Llapit: 25,75 km - Pastrimi i Portave hyrëse rurale: 38 Copë - Pastrimi i Portave hyrëse urbane: 4 Copë - Furnizimi me ujëmbledhësa: 161 copë - Pastrimi i kolektorit atmosferik: 180,3 km - Pastrimi i përrockave rurale: 15.6km - Pastrimi i përrockave urbane: 10.14km						
	Punët në realizim							
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		6,743.50€	60,888.20€					
Vonesat		Nuk ka pasë vonesa						
Shkalla e cilësisë								
Rekomandime masat për tu ndërmarë		Puna është duke vazhduar sipas kontratës						
Vlerësimi i progresit në projekt								

		RAPORTI MBIKËQYRËS					17	
Projekti :		Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim atmosferik, Fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese Loto – II -					Vlera e projektit: 25,000.00 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		“NITI-N” SH.P.K					Nr.616 20 060 521 dt.10.08.2020	
Menaxheri i projektit :		Fatmir Bilalli					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :		Dukagjin Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Renovimi i Fontanave; Sheshi “Edit Durham”, “Ibrahim Rugova” izolim, vendosja e pllakave, reflektorve. Pastrimi dhe renovimi i fontanave sheshi “Zahir Pajaziti”, “Nëna Tereze” ndriçimi me reflektor i monumenteve sheshi “Skënderbeu” Sheshi “Edit Durham” monumenti i “KFOR”. Pastrimi i fontanave dhe monumenteve sipas kontratës ne gjith Komunen e Prishtinës.						
	Punët në realizim	Vendosja e reflektorëve dhe mirëmbajtja e fontanave Vazhdim I punëve nga muaji I kalua.						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		14,564.00 €						
Vonesat		Nuk ka vonesa						
Shkalla e cilësisë								
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt		Punët janë duke shkuar sipas kontratës						

		RAPORTI MBIKËQYRËS					18	
Projekti :		Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim atmosferik, Fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese Loto – III -					Vlera e projektit: 75,000.00 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		“Agro Invest 1” Shpk & “Is Company” Shpk.					Nr.616 20 060 521 dt.10.08.2020	
Menaxheri i projektit :		Fatmir Bilalli					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :		Xhevdet Ibrahimaj						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Intervenime Emergjente në disa rrugë rurale, hapja e kanaleve si dhe intervenim me eskavator, mbulimi i gropave të shkaktuara nga vërshimet dhe largimi i grumbullimit të mbeturinave nga rruga.						
	Punët në realizim	Është dërguar në prokurim për shkëputjen e kontratës nga OE.						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		6,780.00 €						
Vonesat Shkalla e cilësisë		Nuk e ka realizuar kërkesën në afatin e duhur për porosin e kërkuar						
Rekomandime masat për tu ndërmarë		Prokurimi ka kërkuar një raport, pasi OE ka bërë kërkesen për shkëputje të kontratës, ne i kemi dërguar raportin si menaxher i kontratës.						
Vlerësimi i progresit në projekt		Është ndërprerë kontrata për shkak të mos realizimit të punëve nga OE.						

PRISHTINA



RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA
19

Projekti :	“Riorganizimi i kontejnerëve, kontejnerëve të rinjë, rregullimi i platformave, furnizimi me komposter dhe shporta”	Vlera e projektit: 82,790.06 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 60 dite
Operatori :	N.N.P. “Ndërtimtari” - Podujevë	Nr.616 20 3070 5-2-1 dt.04.09.2020
Menaxheri i projektit :	Xhevdet Ibrahimaj	Projekti i vitit: 2020
Organi mbikëqyrës :	Lumnije Hyseni dhe Xhemshit Gashi	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Punët në projektin “Riorganizimi i kontejnerëve, kontejnerëve të rinjë, rregullimi i platformave, furnizimi me komposter dhe shporta”, kanë filluar më 04.09.2019 deri më datën 22.09.2020, ku pas kësaj date punimet janë ndërprerë për arsye të pezullimit të punime nga Kabineti i Kryetarit si rrjedhojë e ankesave dhe kundërshtimeve të qytetarëve. Pas fillimit të punimeve për muajin Dhjetor ka pas shumë pengesa në teren nga qytetarët, por gjatë kësaj periudhe janë realizuar këto punë : - Piketimi i lokacioneve, - Prerja e asfaltit – betonit, - Largimi i kubëzave varësisht nga terreni - Gërmimi i lokacioneve dhe largimi i materialit deri në deponi, - Vendosja e armaturës dhe betonimi i pllakave të lokacioneve për kontejner, - Betonimi i mureve të lokacioneve për kontejner, - Punimi i konstruksioneve për lokacionet e vendosjes së kontejnerëve, - Montimi dhe vendosja e platformave në pikat e caktuara (19 sosh)					
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		26.290,31 €					
Vonesat Shkalla e cilësisë		Nuk ka pas					
Rekomandime masat për tu ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Punët e parapara sipas kontratës nuk kanë mund të realizohen për arsye të pezullimit të punimeve nga kabineti i Kryetarit si rrjedhojë e ankesave dhe kundërshtive të qytetarëve					

		RAPORTI MBIKËQYRËS					20	
Projekti :		Mirëmbajtja e hapësirave publike te rrugëve dhe trotuareve në viset rurale Loto – I-					Vlera e projektit: 40,000.00 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		“Erë - Lisi” SH.P.K					Nr.616 20 106 521 dt.03.11.2020	
Menaxheri i projektit :		Xhymshit Gashi					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :		Xhemajl Vllasaliu						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Mbledhja e mbeturinave dhe fshirja e hapësirave publike, Mbledhja e mbeturinave, fshirja dhe larja e hapësirave publike						
	Punët në realizim							
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		2,763.01€						
Vonesat Shkalla e cilësisë		Nuk ka pasë vonesa në punë						
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt								

		RAPORTI MBIKËQYRËS					21	
Projekti :		Mirëmbajtja e hapësirave publike te rrugëve dhe trotuareve në viset rurale Loto – II -					Vlera e projektit: 100,000.00 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		“Light and More” Shpk & SH.P.K.N.N“Global Ing”					Nr.616 20 106 521 dt.03.11.2020	
Menaxheri i projektit :		Xhymshit Gashi					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :		Habib Qorri						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Rivendosja e pengesave nga goma, Nivelizim dhe grederim i rrugës, Vendosja e gomave për ndarje fizike të shiritave, Demontimi i trupave ndriçues të dëmtuar në nënkalime, Krasitje e degëve, barishteve, therrave dhe bimëve tjera, Montimi i kanaleve për kabllot 3-5mm në nënkalime, Instalimi i kablllove 3x2.5mm në nënkalime, Montimi i dritave modulare 45w në nënkalime,						
	Punët në realizim	Janë duke vazhduar .						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		14,188.00€						
Vonesat Shkalla e cilësisë		Nuk ka pasë vonesa në punë						
Rekomandime masat për tu ndërmarë		Puna është duke vazhduar sipas kontratës						
Vlerësimi i progresit në projekt								

		RAPORTI MBIKËQYRËS				22	
Projekti :		Mirëmbajtja e hapësirave publike te rrugëve dhe trotuareve në viset rurale Loto – III -				Vlera e projektit: 100,000.00 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës				Plani dinamik	
Operatori :		“Light and More” Shpk & SH.P.K.N.N“Global Ing”				Nr.616 20 106 521 dt.03.11.2020	
Menaxheri i projektit :		Xhymshit Gashi				Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :		Fatmir Bilalli					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Ngjyrosja e rrethojës me lartësi mbi 1.3m, Lyerja e fasadës në mure – 1.5mm, Ndjyrosja e mureve me ngjyrë.					
	Punët në realizim	Janë duke vazhduar ngjyrosjet ne te njejtat vende.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		26,848.47€					
Vonesat Shkalla e cilësisë		Nuk ka pasë vonesa në punë					
Rekomandime masat për tu ndërmarë		Puna është duke vazhduar sipas kontratës					
Vlerësimi i progresit në projekt							

		RAPORTI MBIKËQYRËS					23	
Projekti :		"Trajtimi i Qenve Endacak"					Vlera e projektit: 40,000.00€	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik Ditë	
Operatori :		VETERINA shpk					616 20 140 221 dt.10.11.2020	
Menaxheri i projektit :		Habib Qorri					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :		Seniha Bajraktari Afrim Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Trajtimi i qeneve endacak, nxënia (kontrollimi dhe trajtimi, ushqim, vaksinim, dhe matrikulim), sterilizimi, kastrimi, hospitalizomi dhe lëshimi i tyre. Deri më 31 Dhjetorë janë trajtuar 259 qenë endacak						
	Punët në realizim	Kontratë është në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		14,157.00€						
Vonesat Shkalla e cilësisë		Kontrata ka filluar të realizohet me 13.11.2020.						
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt		Kontrata është duke u realizuar sipas kushteve dhe planit.						

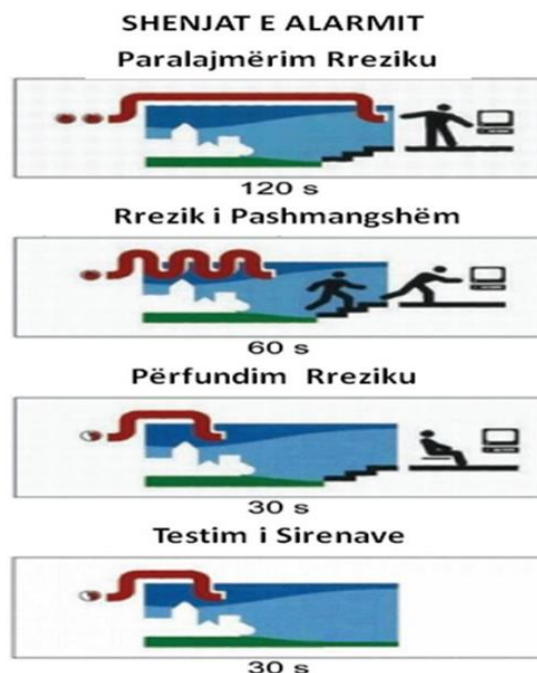
		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 24	
Projekti :	Mirëmbajtja e Semaforëve					Vlera e projektit: 50,000.00€		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik Ditë		
Operatori :	NTSH "Ekoinvest"					616 20 088 221 dt.04.09.2020		
Menaxheri i projektit :	Habib Qorri					Projekti i vitit: 2020		
Organi mbikëqyrës :	Bashkim Sadiku Enver Kadriu Halil Halili							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Intervenime të ndryshme në nyjet semaforike sipas nevojës dhe dëmtimeve të ndryshme.						
	Punët në realizim	Kontratë është në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		12,821.00€						
Vonesat Shkalla e cilësisë		Nuk kemi pasur vonesa						
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt		Kontrata është duke u realizuar sipas kushteve të kontratës dhe nevojave që paraqiten në teren nga defektet.						

Viti 2020 Rastet	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor
	455	425	427	333	499	516	471	591	474	422	348	404

Viti 2020	Te hyrat nga pag. e mbetur.	Te hyrat nga Hortikultura	Konfiskimi i Automjeteve	Parkingu te Pallati i Rinisë	Taks nga shfrytëzimi i Hapësirave publike	Gjithsej
Janar	179,712.50 €	20,260.00 €	4,607.25 €	6,765.65 €	15,109.20 €	219,689.05 €
Shkurt	170,995.65 €	23,335.50 €	4,498.75 €	0	1,701.00 €	207,296.55 €
Mars	124,027.61 €	18,832.00 €	3,212.00 €	0	598.00 €	146,669.61 €
Prill	63,005.31 €	3,011.00 €	895.00 €	0	0	66,911.31 €
Maj	102,494.46€	0	2,266.25€	0	2,124.78€	106,885.49€
Qershor	134,021.84€	15,270.00€	6,780.00€	0	10,397.00€	166,468.84€
Korrik	151,514.00€	20,937.00€	10,962.75€	0	0	183,413.75 €
Gusht	170,710.78€	14,253.00€	9,275.00€	0	2959.78€	197,198.56 €
Shtator	210,210.91€	9,988.00€	9,110.50€	0	980.00€	230,289.41 €
Tetor	209,380.34€	14,127.00€	6,668.00€	0	1,790.96€	231,966.30€
Nëntor	165,066.06 €	11,113.00 €	3,891.00€	0	54.40 €	180,124.46 €
Dhjetor	277,084.30€	13,863.00€	3,331.75€	0	0€	294,279.08€



Qendra Komunale, pranimi i rasteve-thirrjeve në telefonat kujdestar pa pagesë 24/7"



Testimi i sistemit të alarmimit publik pa zë, më 04.12.2020

RREZIK NGA AJRI - Sinjali i alarmimit rrezik nga ajri është: 60 sekonda zë valor pa ndërprerë.

RREZIK NGA MJETET KIMIKE, BIOLOGJIKE DHE RADIOLOGJIKE - Sinjali i alarmimit rrezik nga mjetet kimike, biologjike dhe radiologjike është: tre zëra valorë nga 20 sekonda, me dy pauza nga 15 sekonda në mes (20 sek. zë valor + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë valor + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë valor).

RREZIK NGA FATKEQËSITË ELEMENTARE DHE NATYRORE - Sinjali i alarmimit rrezik nga fatkeqësitë elementare dhe natyrore është: dy zëra të njëtrajtshëm me nga 20 sekonda dhe një zë valor prej 20 sekondave në mes (20 sek. zë i njëtrajtshëm + 20 sek. zë valor + 20 sek. zë i njëtrajtshëm).

RREZIK NGA ZJARRI - Sinjali i alarmimit rrezik nga zjarri është: tre zëra të njëtrajtshëm nga 20 sekonda dhe dy pauza nga 15 sekonda në mes (20 sek. zë i njëtrajtshëm + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë i njëtrajtshëm + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë i njëtrajtshëm).

KALIMI I RREZIKUT - Sinjali i alarmimit kalimi i rrezikut është: 60 sekonda zë i njëtrajtshëm pa ndërprerë.



Mirëmbajtja e sistemit të alarmimit publik dhe testimi i tyre çdo muaj, si dhe R-L, kamerave dhe pajisjeve tjera teknike në qendër.

**Zyrtarë i lartë i energjetikës
Bashkim Sadiku**

**Drejtores :
Medina Braha**

**Dhjetor 2020
Prishtinë.**
