



Raporti i vitit 2020

Nëntor 01-30.11.2020

1. Drejtoria e Shërbimeve Publike Mbrojtje dhe Shpëtim

Drejtoria e Shërbimeve Publike Mbrojtje dhe Shpëtim është e ndarë në katër sektorë;

- *Spektori për Shërbime Publike;*
- *Spektori për Menaxhimin e Mbeturinave dhe Ambientit;*
- *Spektori për Mbrojtje dhe Shpëtim;*
- *Spektori i Transportit dhe Trafikut;*

1.1 Spektori për Shërbime Publike

Drejtoria e Ky sektor merret me menaxhimin dhe shfrytëzimin e hapësirave publike në përputhje me planet komunale, është përgjegjëse për dhënien e lejeve për shfrytëzimin e hapësirave publike, mirëmbajtjen, modernizimin dhe zgjerimin e ndriçimit publik, përkujdeset për ashensorët (riparimi dhe rregullimi), kujdeset për mirëmbajtjen dhe funksionimin normal të fontanave dhe monumenteve publike, kryen edhe punë të tjera, në bazë të ligjeve të aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së Drejtorisë.

1.2 Spektori për menaxhimin e Mbeturinave dhe Ambientit:

Organizon mirëmbajtjen verore dhe dimërore të rrugëve lokale dhe në vendbanime, pastrimin e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, mbikëqyrë realizimin e punëve për rregullimin e gjelbërimit dhe shqyrton kërkesat e ndryshme, kujdeset për menaxhimin, kontrollimin dhe pastrimin e të gjitha shesheve që i përkasin komunës, organizon dhe menaxhon mbledhjen e mbeturinave dhe zhvillon projekte të ndryshme që ndikojnë në përmirësimin e shërbimit të mbledhjes së mbeturinave, zvogëlimin e ndotjes dhe promovimin e uljes së sasisë së mbeturinave, organizon mirëmbajtjen dhe zhbllokimin e rrjetit të kanalizimit atmosferik dhe planet për ngrohtoret lokale, organizon sigurimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike, hapësirave gjelbëruese, parqeve publike dhe varrezave, organizohet për zvogëlimin gradual të ndotjes, degradimit dhe të dëmit mjedisor, si dhe zvogëlimin ose ndalimin e atyre aspekteve ekonomike dhe të aktiviteteve të tjera që përbëjnë rrezik për shëndetin e njeriut dhe mjedisin.

1.3 Spektori për Mbrojtje dhe Shpëtim:

Merret me parandalimin e fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera, vlerëson rrezikshmërinë e tyre brenda territorit të komunës, shpëtimin e njerëzve dhe të mirave materiale, si dhe harton planet operative për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera siç janë; tërmetet, vërshimet, rrëshqitjet e dheut, ortekët e borës, erëra të fuqishme, breshër, borë me acar, thatësi, zjarre, bllokim të rrugëve, shpërthim i sëmundjeve infektive që ndikojnë në njerëz, kafshë ose bimë si dhe fatkeqësi tjera të shkaktuara nga natyra apo njerëzit.

1.4 Spektori i Transportit dhe Trafikut:

Koordinon aktivitetin dhe jep pëlqimin për veprimtarinë e transportit publik të udhëtarëve dhe mallrave, me kompanitë publike dhe shoqatat e taksistëve individualë dhe operatorëve

juridikë, sipas rregulloreve; cakton linjat dhe rendin e udhëtimit për transportin publik të udhëtarëve, menaxhon sektorin me "merimangë", sipas rregullores, organizon procedurat për ankand publik për automjetet e konfiskuara, që kalojnë afatin e paraparë me ligj, bashkëpunon me policinë për rregullimin e komunikacionit dhe ngritjen e sigurisë në komunikacion, kujdeset për sinjalizimin vertikal dhe horizontal të rrugëve ekzistuese dhe rregullon komunikacionin në qytetin e Prishtinës, vendos për mbylljen e përkohshme të rrugëve për shfrytëzimin e tyre.

2. Shqyrtimi i kërkesave

Gjatë muajit Nëntor drejtoria ka proceduar 258 kërkesa të ndryshme: për shfrytëzim të hapësira para lokaleve, reklama, transport, parkingje, siguri në trafik për emergjenca (vërshime, zjarre, shembje të rrugëve, trotuareve, drunjtëve të ndryshëm), për shitje ambulante, për mbeturina. Nga numri i përgjithshëm prej 258 kërkesave të pranuar, 26 janë në proces ndërsa të tjerat janë të përfunduara.

Rastet e intervenimeve Emergjente 04

Lëndet e Komisionit për mbeturina 371

Rastet e pranuar në Qendren e thirrjeve 348


2.1. Dërgimi i kërkesave për Hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimi i nevojave

Pergatitja e projekteve paramasave dhe specifikimeve për projektet e planifikuara gjatë kësaj periudhe.

3.1. Raportimi i Menaxhereve te projekteve dhe Kontratave

Drejtoria	Drejtoria e Shërbimeve Publike Mbrojtje dhe Shëtim
Sektori	Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim, Menaxhimin e mbeturinave dhe Ambientit, Transportit dhe Trafikut.
Drejtores	Medina Braha
Raportoi	Habib Qorri, Fatmir Bilalli, Dukagjin Gashi / shef sektori
Kontrolloi – Përpunoi	
Periudha raportuese	01- 30.11.2020 muaji Nëntor
Menaxhëret e projekteve dhe Organi mbikqyrës	Habib Qorri Dukagjin Gashi Fatmir Bilalli Xhemshit Gashi Bashkim Gashi Enver Kadriu Afrim Gashi

	Xhevdet Ibrahimaj Halil Halili Lumnije Hyseni Xhemile Gashi Sabri Gashi
--	---

		RAPORTI MBIKËQYRËS				SHIFRA 01	
Projekti :		Mobilieria urbane-Furnizimi dhe vendosja priturve për autobus të transportit publik të udhëtareve				Vlera e projektit: 292,500.00€	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës				Plani dinamik	
Operatori :		“Selmans Network” shpk “BM Group”				Nr.616-19-5545-1-1-1 dt.30.10.2019	
Menaxheri i projektit :		Halil Halili				Projekti i vitit: 2019	
Organi mbikëqyrës :		Habib Qorri Enver Kadru					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Deri me tani janë instaluar 35 konstruksionet të pritoreve sipas lokacionet të kërkuara nga Komuna e Prishtinës					
	Punët në realizim	Janë duke u realizuar bazamentet në lokacionet dhe prodhimin dhe furnizimin me elementet baze të pritores (LCD).					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		/	/	/		/	
Vonesat Shkalla e cilësisë		Vonesa janë për shkaqe qe ndryshimeve ne projekte dhe mangësi në specifika teknike për të kompletuar pritoren					
Rekomandime masat për tu ndërmarrë		Rekomandimet qe duhen të ndermirën për shkak të vonesave nga OE duke bazuar në kushtet e kontratës duhen të ndërmarrën masa për ndërprerje të kontratës					
Vlerësimi i progresit në projekt							

		RAPORTI MBIKËQYRËS					02	
Projekti :		Rregullimi dhe rrethimi i varrezave të Komunës së Prishtinës					Vlera e projektit: 100,00.00 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		I.P.N.EU SHPK					Nr.616 19 059 521 dt.29.04.2020	
Menaxheri i projektit :		Habib Qorri					Projekti i vitit: 2019	
Organi mbikëqyrës :		Xhemshit Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara							
	Punët në realizim							
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		9,711.00€						
Vonesat Shkalla e cilësisë		Nuk është punuar asgjë jemi ne pritje.						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë		Për shkak të vonesave për realizimin e kontratës kemi propozuar të ndërmerren masat ligjore për shkëputje të kontratës pasi që deri më tani kompania nuk ka vazhduar me punime.						
Vlerësimi i progresit në projekt								

		RAPORTI MBIKËQYRËS					03	
Projekti :		Kontrata në Shtëpi					Vlera e projektit: 1,440,000.00 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		KRM ‘Pastrimi’					Nr.	
Menaxheri i projektit :		Lumnije Hyseni					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :		1. Xhevdet Ibrahimaj 2. Afrim Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	1.Mbledhja,largimi dhe transportimi i mbeturinave të amvisërisë. 2.Mbledhja,largimi dhe transportimi i mbetjeve urbane 44,05 ton 3.Mbledhja dhe largimi i mbetjeve inerte 178.31 ton. 4. Faturimi dhe shpërndarje e faturave për mbeturina 58.000 5. Larja dhe dezinfektimi i lokacioneve edhe kontejnerëve 6.Lokimi dhe dislokimi i kontejnerëve sipas kërkesës nga ana e komunës 02.						
	Punët në realizim	Të gjitha pikat e lartë cekura						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V		
		222,455.29€	222,335.00€	342,818.00€	222,311.00€	243,593.00		
Vonesat Shkalla e cilësisë								
Rekomandime masat për tu ndërmarë		Për arritjen e evitimit të deponive ilegale rekomandojmë që pas largimit të mbeturinave të vendosen rrethojat në hapësirat e pastruara dhe mundësisht të gjelbërimi i tyre						
Vlerësimi i progresit në projekt		Gjatë këtij muaji janë eliminuar dy deponi masive të mbeturinave inerte, njëra në Matëçan ku jane larguar 4.733 m³ dhe në rr.Shpëtim Robaj 2107m³, gjithsejt 6840m³.						



Largimi i mbeturinave nga kompania Pastrimi

		RAPORTI MBIKËQYRËS				04	
Projekti :		Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve te qytetit – pjesa e pare				Vlera e projektit: 138,255.87 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës				Plani dinamik	
Operatori :		VZ Company Sh.p.k				Nr.616 18 015 211 dt.29/05/2018	
Menaxheri i projektit :		Dukagjin Gashi				Projekti i vitit: 2018-2020	
Organi mbikëqyrës :		Halil Halili Xhemajl Vllasaliu					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 1 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 6 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 29 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 166 rrugë					
	Punët në realizim	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 1 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 6 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 29 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 166 rrugë					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)	
		15,346.49€	15,704.34€	15,704.34€	14,298.98€	12,403.19 €	
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS				05	
Projekti :		Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve te qytetit – pjesa e dyte				Vlera e projektit: 113,177.98 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës				Plani dinamik	
Operatori :		Toifor Sh.p.k				Nr.616 18 015 211 dt.03/04/2019	
Menaxheri i projektit :		Dukagjin Gashi				Projekti i vitit: 2019-2020	
Organi mbikëqyrës :		Halil Halili Bashkim Sadiku					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 2 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 2 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 27 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 128 rrugë					
	Punët në realizim	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 2 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 2 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 27 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 128 rrugë					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)	
		18,749.96€	19,256.13€	12,875.83€	11,241.94€	7,253.70 €	
Vonesat							
Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							

		RAPORTI MBIKËQYRËS				06	
Projekti :		Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve te qytetit – pjesa e tretë				Vlera e projektit: 284,997.96 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës				Plani dinamik	
Operatori :		NPN Dardania				Nr.616 18 015 211 dt.29/05/2018	
Menaxheri i projektit :		Dukagjin Gashi				Projekti i vitit: 2018-2020	
Organi mbikëqyrës :		Halil Halili Xhemajl Vllasaliu					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Larja e rrugëve të kategorisë A/ shesheve (rrugët 4 herë në javë/ sheshet 7herë në javë) : 16 hapësira publike Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 24 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 20 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 60 rrugë					
	Punët në realizim	Larja e rrugëve të kategorisë A/ shesheve (rrugët 4 herë në javë/ sheshet 7herë në javë) : 16 hapësira publike Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 24 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 20 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 60 rrugë					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)	
		23,515.92€	23,710.65€	24,164.73€	23,280.84€	15,689.11 €	
Vonesat							
Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarë							
Vlerësimi i progresit në projekt							


		RAPORTI MBIKËQYRËS				07	
Projekti :		Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve te qytetit – pjesa e katerte				Vlera e projektit: 187,823.26 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës				Plani dinamik	
Operatori :		Niti – N				Nr.616 18 015 211 dt.29/05/2018	
Menaxheri i projektit :		Dukagjin Gashi				Projekti i vitit: 2018-2020	
Organi mbikëqyrës :		Bashkim Sadiku Enver Kadriu					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 2 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 5 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 35 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 99 rrugë					
	Punët në realizim	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 2 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 5 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 35 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 99 rrugë					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)	
		20,779.27€	21,360.19€	20,243.73€	20,643.85€	16,557.82 €	
Vonesat							
Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							

		RAPORTI MBIKËQYRËS				08	
Projekti :		Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e peste				Vlera e projektit: 192,896.00 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës				Plani dinamik	
Operatori :		NShT Zahiri				Nr.616 18 015 211 dt.29/05/2018	
Menaxheri i projektit :		Dukagjin Gashi				Projekti i vitit: 2018-2020	
Organi mbikëqyrës :		Afrim Gashi Enver Kadriu					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 7 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 27 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 114 rrugë					
	Punët në realizim	Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 7 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 27 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 114 rrugë					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)	
		18,436.48€	19,637.14€	20,243.73€	16,761.83€	8,656.56 €	
Vonesat							
Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarë							
Vlerësimi i progresit në projekt							

LLOTO 5

		RAPORTI MBIKËQYRËS				09	
Projekti :		Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e gjashtë				Vlera e projektit: 192,896.00 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës				Plani dinamik	
Operatori :		KRM Pastrimi				Nr.616 18 015 211 dt.29/05/2018	
Menaxheri i projektit :		Dukagjin Gashi				Projekti i vitit: 2018-2020	
Organi mbikëqyrës :		Afrim Gashi Enver Kadriu					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 8 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 5 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 38 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 116 rrugë					
	Punët në realizim	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 8 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 5 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 38 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 116 rrugë					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)	
		24,624.08€	25,449.03€	24,773.92€	24,384.28€	17,400.37 €	
Vonesat							
Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarë							
Vlerësimi i progresit në projekt							



LLOTO 6

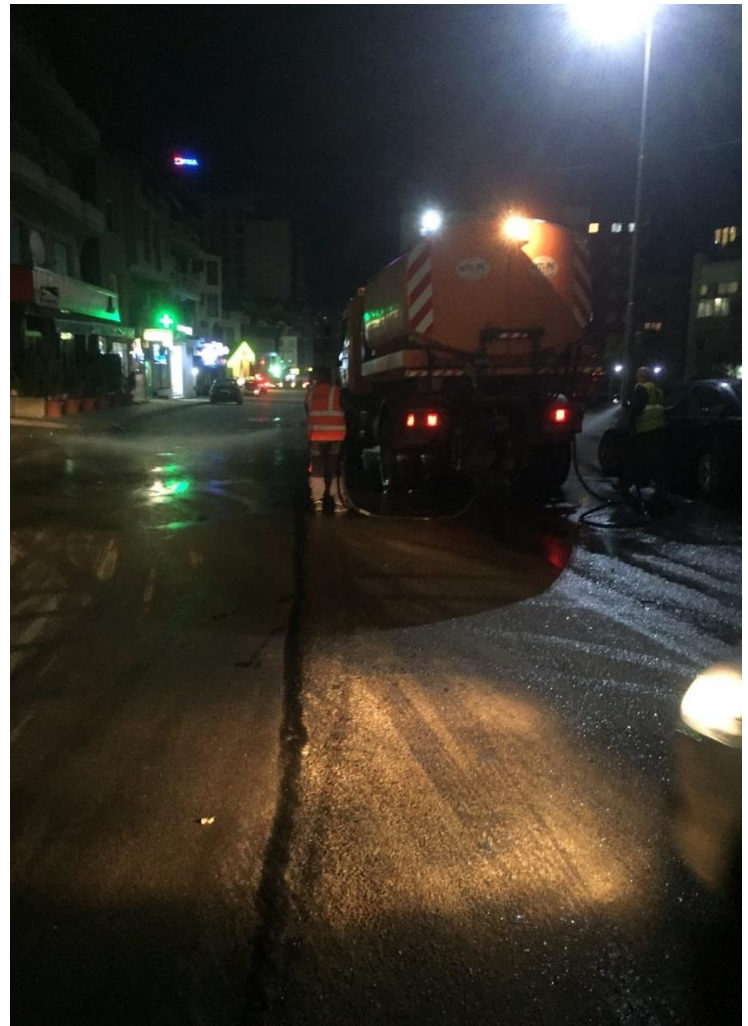

		RAPORTI MBIKËQYRËS					10	
Projekti :		Shërbimet e Transportit Publik në Komunën e Prishtinës					Vlera e projektit: 2,935,122.60 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik 60 dite	
Operatori :		“Trafiku Urbanë”					Nr.1449	
Menaxheri i projektit :		Enver Kadriu					Projekti i vitit: 20.07.2018	
Organi mbikëqyrës :		Halil Halili						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara							
	Punët në realizim							
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)	Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)		
		430,099.14€	438,073.47€	445,894.00€	403,864.70€	358,596.20€		
Vonesat Shkalla e cilësisë								
Rekomandime masat për tu ndërmarrë								
Vlerësimi i progresit në projekt								


		RAPORTI MBIKËQYRËS					11			
Projekti :		RIPARIMI DHE RREGULLIMI I ASHENSORËVE					Vlera e projektit: 200,000.00€			
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik 365 ditë			
Operatori :		SH.P.K “EJONA”					Nr.616 19 1538 521 dt.08.11.2019			
Menaxheri i projektit :		Bashkim Sadiku					Projekti i vitit: 2019			
Organi mbikëqyrës :		Enver Kadriu								
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara										
Vëllimi	Punët e realizuara	Janë realizuar vetëm mirëmbajtje në institucione publike komunale.								
	Punët në realizim	Mirëmbajtja në institucione publike komunale dhe fillimi i riparimit të ashensorëve në hyrjet e përcaktuara.								
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI	Situacioni VII	Situacioni VIII	Situacioni IX	Situacioni X	Situacioni XI
		4,699.00€	5,435.00€	2,902.00€	3,222.80€	4,426.00€	3,629.40€	4,429.00€	4,023.00€	25,710.40€
Vonesat Shkalla e cilësisë										
Rekomandime masat për tu ndërmarrë										
Vlerësimi i progresit në projekt		Ka përfunduar ashensori në hyrje tek qafa dhe ashensori në lakrishtë.								

		RAPORTI MBIKËQYRËS					12	
Projekti :		Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim atmosferik, Fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese Loto – I -					Vlera e projektit: 84,249.20 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		“Agro Invest 1” Shpk & “Is Company” Shpk.					Nr.616 20 060 521 dt.10.08.2020	
Menaxheri i projektit :		Fatmir Bilalli					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :		Enver Kadriu						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	1. Pastrimi i shtratit të lumit Llapit: 12,000.00 m’; 2. Pastrimi i Portave hyrëse: 3 Copë 3. Furnizimi i me ujëmbledhëse: 50 copë; 4. Pastrimi i kolektorit atmosferik: 8,000.00 m’.						
	Punët në realizim							
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		6,743.50						
Vonesat Shkalla e cilësisë		Nuk ka pasë vonesa						
Rekomandime masat për tu ndërmarë		Puna është duke vazhduar sipas kontratës						
Vlerësimi i progresit në projekt								

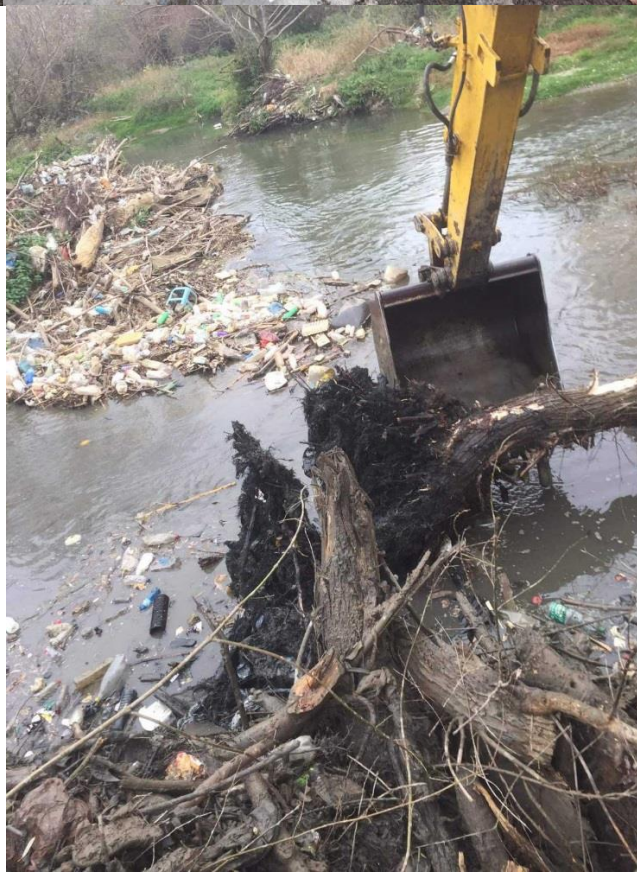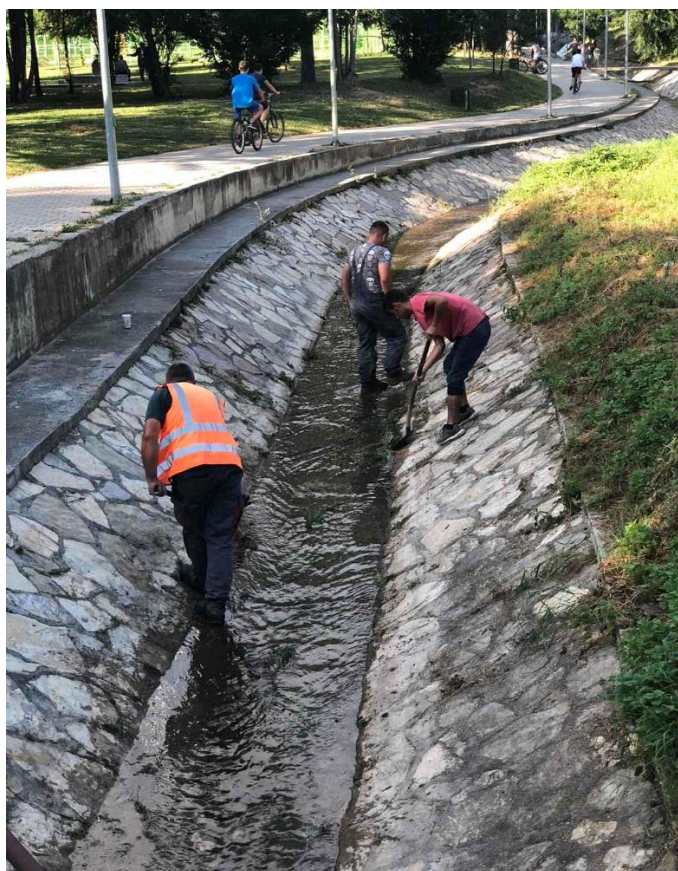

Pastrimi i shtratit tëlumenjeve, proçkave dhe ujëmbledhësve

		RAPORTI MBIKËQYRËS					13	
Projekti :		Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim atmosferik, Fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese Loto – II -					Vlera e projektit: 25,000.00 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		“NITI-N” SH.P.K					Nr.616 20 060 521 dt.10.08.2020	
Menaxheri i projektit :		Fatmir Bilalli					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :		Dukagjin Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Renovimi i Fontanave; Sheshi “Edit Durham”, “Ibrahim Rugova” izolim, vendosja e pllakave, reflektorve. Pastrimi dhe renovimi i fontanave sheshi “Zahir Pajaziti”, “Nëna Tereze” ndriçimi me reflektor i monumenteve sheshi “Skënderbeu” Sheshi “Edit Durham” monumenti i “KFOR”. Pastrimi i fontanave dhe monumenteve sipas kontratës ne gjith Komunen e Prishtinës.						
	Punët në realizim	Vendosja e reflektorëve dhe mirëmbajtja e fontanave Vazhdim I punëve nga muaji I kalua.						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		14,564.00 €						
Vonesat		Nuk ka vonesa						
Shkalla e cilësisë								
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt		Punët janë duke shkuar sipas kontratës						

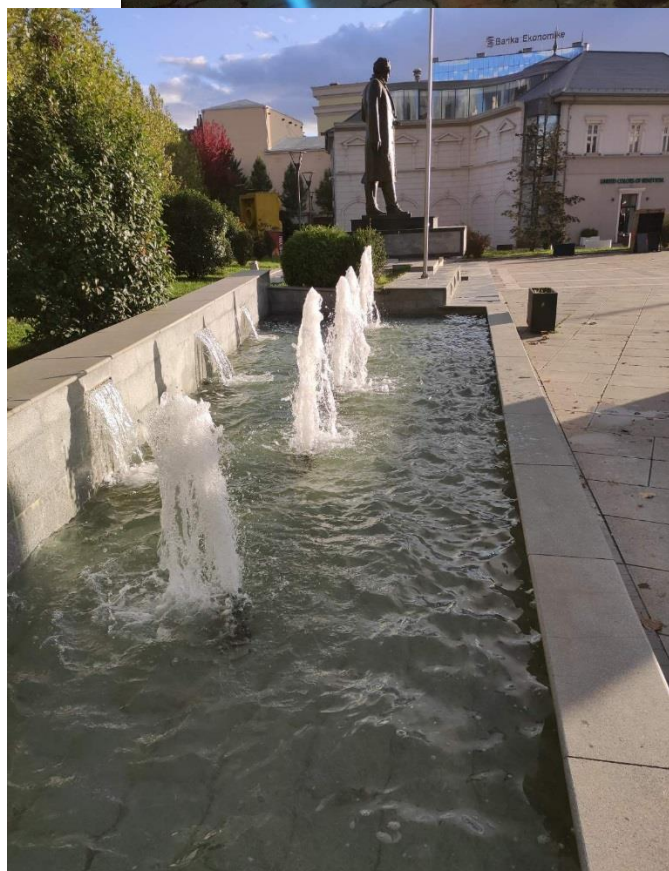

Mirëmbajtja e monumenteve dhe fontanave


		RAPORTI MBIKËQYRËS					14	
Projekti :		Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim atmosferik, Fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese Loto – III -					Vlera e projektit: 75,000.00 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		“Agro Invest 1” Shpk & “Is Company” Shpk.					Nr.616 20 060 521 dt.10.08.2020	
Menaxheri i projektit :		Fatmir Bilalli					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :		Xhevdet Ibrahimaj						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Intervenime Emergjente në disa rrugë rurale, hapja e kanaleve si dhe intervenim me eskavator, mbulimi i gropave të shkaktuara nga vërshimet dhe largimi i grumbullimit të mbeturinave nga rruga.						
	Punët në realizim	Eshtë dërguar në prokurim për shkëputjen e kontratës nga OE.						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		6,780.00 €						
Vonesat Shkalla e cilësisë		Nuk e ka realizuar kërkesën në afatin e duhur për porosin e kërkuar						
Rekomandime masat për tu ndërmarë		Prokurimi ka kërkuar një raport, pasi OE ka bërë kërkesen për shkëputje të kontratës, ne I kemi dërguar raportin si menaxher I kontratës.						
Vlerësimi i progresit në projekt								

		RAPORTI MBIKËQYRËS					15	
Projekti :		Mirëmbajtja e hapësirave publike te rrugëve dhe trotuareve në viset rurale Loto – I-					Vlera e projektit: 40,000.00 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		“Erë - Lisi” SH.P.K					Nr.616 20 106 521 dt.03.11.2020	
Menaxheri i projektit :		Xhymshit Gashi					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :		Xhemajl Vllasaliu						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Fshirja dhe larja e rrugëve; Bardhosh rruga kryesore dhe te gjitha rrugicat. Fshirja e rrugëve; Bernicë e poshtme rruga kryesore, Bërnice e Epërme rruga kryesore (Beteja e Kaqanollit).						
	Punët në realizim							
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
Vonesat Shkalla e cilësisë		Nuk ka pasë vonesa në punë						
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt								

		RAPORTI MBIKËQYRËS					16	
Projekti :		Mirëmbajtja e hapësirave publike te rrugëve dhe trotuareve në viset rurale Loto – II -					Vlera e projektit: 100,000.00 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		“Light and More” Shpk & SH.P.K.N.N“Global Ing”					Nr.616 20 106 521 dt.03.11.2020	
Menaxheri i projektit :		Xhymshit Gashi					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :		Habib Qorri						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Rivendosja e pengesave nga goma për ndarje të shiritave qarkullues në rrethrotullime; ; Te Ambasada Amerikane, Rruga “B” te rr. M.Fejza, te Komuna e vjetër. Instalimi i ndriqimit dhe rregullimi i ujëmbledhesve në nënkalimet në Kalabri (banesat e Arabëve dhe Termokisi),						
	Punët në realizim	Janë duke vazhduar .						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
Vonesat Shkalla e cilësisë		Nuk ka pasë vonesa në punë						
Rekomandime masat për tu ndërmarë		Puna është duke vazhduar sipas kontratës						
Vlerësimi i progresit në projekt								



		RAPORTI MBIKËQYRËS					17	
Projekti :		Mirëmbajtja e hapësirave publike te rrugëve dhe trotuareve në viset rurale Loto – III -					Vlera e projektit: 100,000.00 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		“Light and More” Shpk & SH.P.K.N.N“Global Ing”					Nr.616 20 106 521 dt.03.11.2020	
Menaxheri i projektit :		Xhymshit Gashi					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :		Fatmir Bilalli						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Ngjyrosja e mureve te nënkalimet; Te Banesat e Arabëve, te Termokisi, te Xhamia e Llapit, dhe në Bardhosh. Lyerja e mureve te nënkalimet; Te Banesat e Arabëve, te Termokisi. Ngjyrosja e skajorëve te rreth rrotullimi: te Ambasada Amerikane, i Arbërisë, rruga “B”, rruga Tirana. Ngjyrosja e rrethojave te varrezat – rr. Ismet Krasniqi.						
	Punët në realizim	Janë duke vazhduar ngjyrosjet ne te njejtat vende.						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
Vonesat Shkalla e cilësisë		Nuk ka pasë vonesa në punë						
Rekomandime masat për tu ndërmarë		Puna është duke vazhduar sipas kontratës						
Vlerësimi i progresit në projekt								

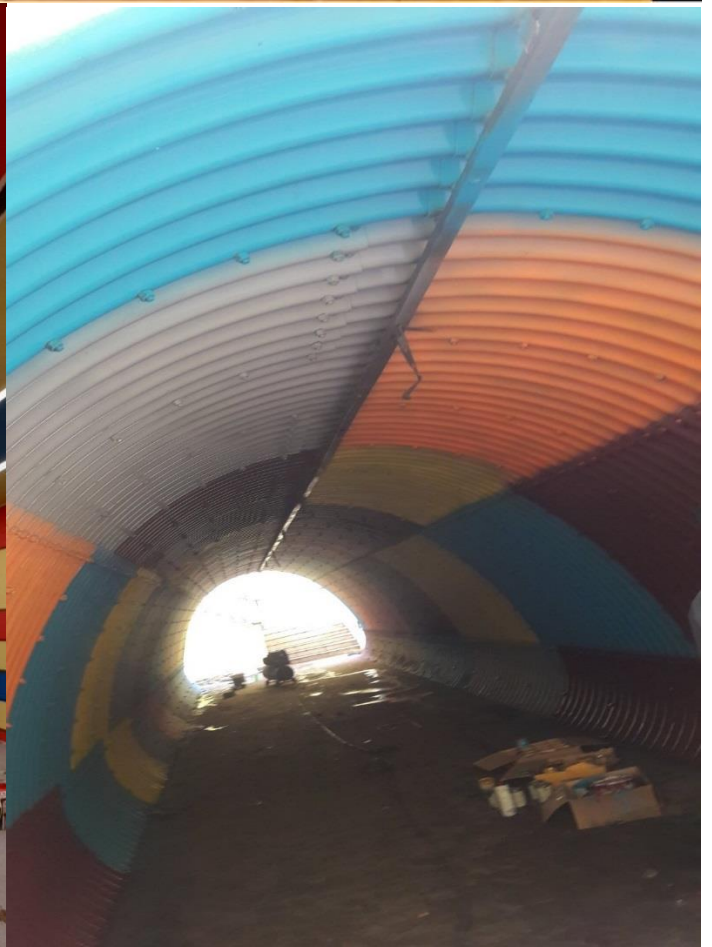

		RAPORTI MBIKËQYRËS					18	
Projekti :		"Trajtimi i Qenve Endacak"					Vlera e projektit: 40,000.00€	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik Ditë	
Operatori :		VETERINA shpk					616 20 140 221 dt.10.11.2020	
Menaxheri i projektit :		Habib Qorri					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :		Seniha Bajraktari Afrim Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Trajtimi i qeneve endacak, nxënia (kontrollimi dhe trajtimi, ushqim, vaksinim, dhe matrikulim), sterilizimi, kastrimi, hospitalizomi dhe lëshimi i tyre. Nga dt. 13 deri me 30 Nëntor janë trajtuar 150 qenë endacak						
	Punët në realizim	Kontratë është në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
Vonesat Shkalla e cilësisë		Kontrata ka filluar të realizohet me 13.11.2020.						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë								
Vlerësimi i progresit në projekt		Kontrata është duke u realizuar sipas kushteve dhe planit.						

		RAPORTI MBIKËQYRËS					19	
Projekti :		“Riorganizimi i kontejnerëve, kontejnerëve të rinjë, rregullimi i platformave, furnizimi me komposter dhe shporta”					Vlera e projektit: 82,790.06 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik 60 dite	
Operatori :		N.N.P. “Ndërtimtari” - Podujevë					Nr.616 20 3070 5-2-1 dt.04.09.2020	
Menaxheri i projektit :		Xhevdet Ibrahimaj					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :		Lumnije Hyseni dhe Xhemshit Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Punët në projektin kanë filluar më 04.09.2019 deri më datën 22.09.2020, ku pas kësaj date punimet janë ndërprerë për arsye të pezullimit të punime nga Kabineti i Kryetarit si rrjedhojë e ankesave dhe kundërshtive të qytetarëve dhe kanë filluar me 24.10.2020. Edhe pas fillimit të punimeve nga kjo datë ka pas shumë pengesa në teren nga qytetarët. Gjatë kësaj përfunduar janë realizuar këto punë : Piketimi i lokacioneve,Prerja e asfaltit – betonit,Largimi i kubëzave varësisht nga terreni, Gërmimi i lokacioneve dhe largimi i materialit deri në deponi,Vendosja e armaturës dhe betonimi i pllakave të lokacioneve për kontejner,Betonimi i mureve të lokacioneve për kontejner,Punimi i konstruksioneve për lokacionet e vendosjes së kontejnerëve.						
	Punët në realizim							
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
Vonesat Shkalla e cilësisë		Nuk ka pas						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë								
Vlerësimi i progresit në projekt		Punët e parapara sipas kontratës nuk kanë mund të realizohen për arsye të pezullimit të punimeve nga kabineti i Kryetarit si rrjedhojë e ankesave dhe kundërshtive të qytetarëve						




		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 01	
Projekti :							Vlera e projektit: 50,000.00€	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik Ditë	
Operatori :		NTSH “Ekoinvest”					616 20 088 221 dt.04.09.2020	
Menaxheri i projektit :		Habib Qorri					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :		Bashkim Sadiku Enver Kadriu Halil Halili						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Intervenime të ndryshme në nyjet semaforike sipas nevojës dhe dëmtimeve të ndryshme.						
	Punët në realizim	Kontratë është në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
Vonesat Shkalla e cilësisë		Nuk kemi pasur vonesa						
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt		Kontrata është duke u realizuar sipas kushteve të kontratës dhe nevojave që paraqiten në teren nga defektet.						

Viti 2020	Te hyrat nga pag. e mbetur.	Te hyrat nga Hortikultura	Konfiskimi i Automjeteve	Parkingu te Pallati i Rinisë	Taks nga shfrytëzimi i Hapësirave publike	Gjithsej
Janar	179,712.50 €	20,260.00 €	4,607.25 €	6,765.65 €	15,109.20 €	219,689.05 €
Shkurt	170,995.65 €	23,335.50 €	4,498.75 €	0	1,701.00 €	207,296.55 €
Mars	124,027.61 €	18,832.00 €	3,212.00 €	0	598.00 €	146,669.61 €
Prill	63,005.31 €	3,011.00 €	895.00 €	0	0	66,911.31 €
Maj	102,494.46€	0	2,266.25€	0	2,124.78€	106,885.49€
Qershor	134,021.84€	15,270.00€	6,780.00€	0	10,397.00€	166,468.84€
Korrik	151,514.00€	20,937.00€	10,962.75€	0	0	183,413.75 €
Gusht	170,710.78€	14,253.00€	9,275.00€	0	2959.78€	197,198.56 €
Shtator	210,210.91€	9,988.00€	9,110.50€	0	980.00€	230,289.41 €
Tetor	209,380.34€	14,127.00€	6,668.00€	0	1,790.96€	231,966.30€
Nëntor	165,066.06 €	11,113.00 €	3,891.00€	0	54.40 €	180,124.46 €



	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor
Rastet	455	425	427	333	499	516	471	591	474	422	348

Qendra Komunale, pranimi i rasteve-thirrjeve në telefonat kujdestar pa pagesë 24/7"

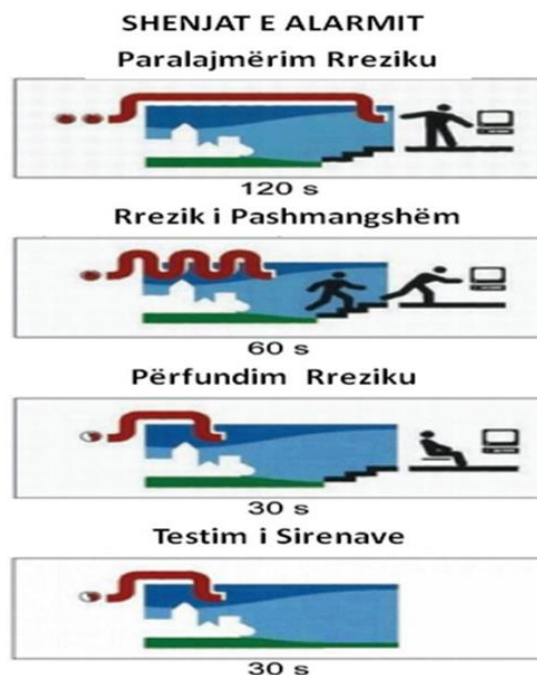

Testimi i sistemit të alarmimit publik pa zë, më 05.11.2020

RREZIK NGA AJRI - Sinjali i alarmimit rrezik nga ajri është: 60 sekonda zë valor pa ndërprerë.

RREZIK NGA MJETET KIMIKE, BIOLOGJIKE DHE RADIOLOGJIKE - Sinjali i alarmimit rrezik nga mjetet kimike, biologjike dhe radiologjike është: tre zëra valorë nga 20 sekonda, me dy pauza nga 15 sekonda në mes (20 sek. zë valor + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë valor + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë valor).

RREZIK NGA FATKEQËSITË ELEMENTARE DHE NATYRORE - Sinjali i alarmimit rrezik nga fatkeqësitë elementare dhe natyrore është: dy zëra të njëtrajtshëm me nga 20 sekonda dhe një zë valor prej 20 sekondave në mes (20 sek. zë i njëtrajtshëm + 20 sek. zë valor + 20 sek. zë i njëtrajtshëm).

RREZIK NGA ZJARRI - Sinjali i alarmimit rrezik nga zjarri është: tre zëra të njëtrajtshëm nga 20 sekonda dhe dy pauza nga 15 sekonda në mesë (20 sek. zë i njëtrajtshëm + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë i njëtrajtshëm + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë i njëtrajtshëm).

KALIMI I RREZIKUT - Sinjali i alarmimit kalimi i rrezikut është: 60 sekonda zë i njëtrajtshëm pa ndërprerë.



Mirëmbajtja e sistemit të alarmimit publik dhe testimi i tyre çdo muaj, si dhe R-L, kamerave dhe pajisjeve tjera teknike në qendër.

Drejtore :
Medina Braha

Nëntor 2020
Prishtinë.
