



Raporti i vitit 2020

Gusht: 01 - 31.08.2020

1. Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit është e ndarë në katër sektorë:

- *Spektori për shërbime publike;*
- *Spektori për menaxhimin e mbeturinave dhe ambientit;*
- *Spektori për mbrojtje dhe shpëtim;*
- *Spektori i transportit dhe trafikut.*

1.1 Spektori për shërbime publike

Ky sektor merret me menaxhimin dhe shfrytëzimin e hapësirave publike në përputhje me planet komunale, është përgjegjëse për dhënien e lejeve për shfrytëzimin e hapësirave publike, mirëmbajtjen, modernizimin dhe zgjerimin e ndriçimit publik, përkujdeset për ashensorët (riparimi dhe rregullimi), kujdeset për mirëmbajtjen dhe funksionimin normal të fontanave dhe monumenteve publike, kryen edhe punë të tjera, në bazë të ligjeve të aplikueshme në kuadër të fushëveprimtarisë së Drejtorisë.

1.2 Spektori për menaxhimin e mbeturinave dhe ambientit:

Organizon mirëmbajtjen verore dhe dimërore të rrugëve lokale dhe në vendbanime, pastrimin e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, mbikëqyrë realizimin e punëve për rregullimin e gjelbërimit dhe shqyrton kërkesat e ndryshme, kujdeset për menaxhimin, kontrollimin dhe pastrimin e të gjitha shesheve që i përkasin komunës, organizon dhe menaxhon mbledhjen e mbeturinave dhe zhvillon projekte të ndryshme që ndikojnë në përmirësimin e shërbimit të mbledhjes së mbeturinave, zvogëlimin e ndotjes dhe promovimin e uljes së sasisë së mbeturinave, organizon mirëmbajtjen dhe zhbllokimin e rrjetit të kanalizimit atmosferik dhe planet për ngrohtoret lokale, organizon sigurimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike, hapësirave gjelbëruese, parqeve publike dhe varrezave, organizohet për zvogëlimin gradual të ndotjes, degradimit dhe të dëmit mjedisor, si dhe zvogëlimin ose ndalimin e atyre aspekteve ekonomike dhe të aktiviteteve të tjera që përbëjnë rrezik për shëndetin e njeriut dhe mjedisin.

1.3 Spektori për mbrojtje dhe shpëtim:

Merret me parandalimin e fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera, vlerëson rrezikshmërinë e tyre brenda territorit të komunës, shpëtimin e njerëzve dhe të mirave materiale, si dhe harton planet operative për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera, siç janë: tërmetet, vërshimet, rrëshqitjet e dheut, ortekët e borës, erëra të fuqishme, breshër, borë me acar, thatësi, zjarre, bllokim të rrugëve, shpërthim i sëmundjeve infektive që ndikojnë në njerëz, kafshë ose bimë, si dhe fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga natyra apo njerëzit.

1.4 Spektori i transportit dhe trafikut:

Koordinon aktivitetin dhe jep pëlqimin për veprimtarinë e transportit publik të udhëtarëve dhe mallrave, me kompanitë publike dhe shoqatat e taksistëve individualë dhe

operatorëve juridikë, sipas rregulloreve; cakton linjat dhe rendin e udhëtimit për transportin publik të udhëtarëve, menaxhon sektorin me "merimangë", sipas rregullores, organizon procedurat për ankand publik për automjetet e konfiskuara, që kalojnë afatin e paraparë ligjor, bashkëpunon me policinë për rregullimin e komunikacionit dhe ngritjen e sigurisë në komunikacion, kujdeset për sinjalizimin vertikal dhe horizontal të rrugëve ekzistuese dhe rregullon komunikacionin në qytetin e Prishtinës, vendos për mbylljen e përkohshme të rrugëve për shfrytëzimin e tyre.

2. Shqyrtimi i kërkesave

Gjatë muajit gusht, 2020, Drejtoria ka proceduar 218 kërkesa të ndryshme: për shfrytëzim të hapësirave para lokaleve, reklama, transport, parkingje, siguri në trafik për emergjenca (vërshime, zjarre, shembje të rrugëve, trotuareve, drurëve të ndryshëm), për shitje ambulante, mbeturina etj. Nga numri i përgjithshëm prej 218 kërkesave të pranuar, 62 janë në proces, ndërsa të tjerat janë të përfunduara.

Rastet e intervenimeve emergjente – 23.

Rastet e pranuar në Qendrën e thirrjeve – 591.


2.1. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimi i nevojave

Pergatitja e projekteve, paramasave dhe specifikimeve për projektet e planifikuara gjatë kësaj perjudhe.

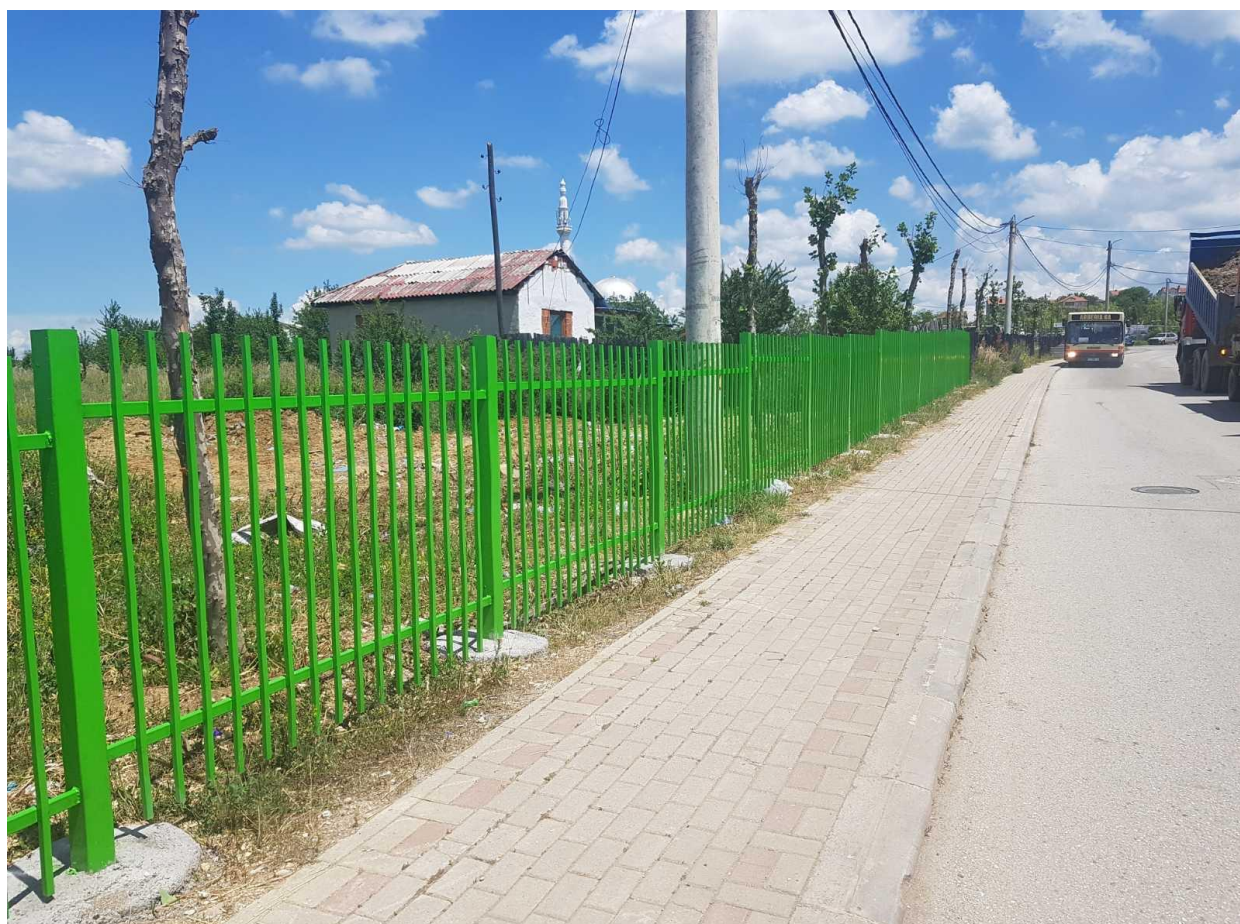
3.1. Raportimi i Menaxherëve të projekteve dhe kontratave

Drejtoria	Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shëtimit
Sektori	Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit, Menaxhimit të mbeturinave dhe Ambientit, Transportit dhe Trafikut.
Drejtore	Medina Braha
Raportoi	Habib Qorri, Fatmir Bilalli, Dukagjin Gashi / shef sektori
Kontrolloi – Përpunoi	
Periudha raportuese	01- 31.08.2020, muaji gusht
Menaxhëret e projekteve dhe Organi mbikqyrës	Habib Qorri Dukagjin Gashi Fatmir Bilalli Xhemshit Gashi Bashkim Gashi Enver Kadriu Afrim Gashi


	Xhevdet Ibrahimaj Halil Halili Lumnije Hyseni Xhemile Gashi Sabri Gashi
--	---

		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 01	
Projekti :		Mobilieria urbane-Furnizimi dhe vendosja e pritoreve për autobusë të transportit publik të udhëtareve					Vlera e projektit: 292,500.00€	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		“Selmans Network” SHPK “BM Group”					Nr.616-19-5545-1-1-1 dt. 30.10.2019	
Menaxheri i projektit :		Halil Halili					Projekti i vitit: 2019	
Organi mbikëqyrës :		Habib Qorri Enver Kadru						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Deri më tani janë instaluar 7 konstruksionet të pritoreve sipas lokacioneve të kërkuara nga Komuna e Prishtinës						
	Punët në realizim	Janë duke u realizuar bazamentet në lokacione, si dhe prodhimi dhe furnizimin me elementet bazë të pritores (LCD).						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		/	/	/		/		
Vonesat Shkalla e cilësisë		Vonesat janë për shkaqe të ndryshimeve në projekte dhe mangësi në specifika teknike për të kompletuar pritoren.						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		Rekomandimet që duhen të ndermirren për shkak të vonesave nga OE, duke u bazuar në kushtet e kontratës, duhen të ndërmarrin masa për ndërprerje të kontratës.						
Vlerësimi i progresit në projekt								


		RAPORTI MBIKËQYRËS					02	
Projekti :		Rregullimi dhe rrethimi i varrezave të komunës së Prishtinës					Vlera e projektit: 100,00.00 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		“IPN EU” SHPK					Nr.616 19 059 521 dt. 29.04.2020	
Menaxheri i projektit :		Habib Qorri					Projekti i vitit: 2019	
Organi mbikëqyrës :		Xhemshit Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Vazhdim i punimeve për rrethoja të komunës së Prishtinës						
	Punët në realizim	Vendosja e rrethojave në varrezat e fshatrave, me të njëjtat pozicione.						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
Vonesat Shkalla e cilësisë								
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		Kërkesat tona për punëkryesin për vazhdimin e punëve.						
Vlerësimi i progresit në projekt								




Rrethimi i varrezave


		RAPORTI MBIKËQYRËS				03	
Projekti :						Vlera e projektit: 1,440,000.00 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës				Plani dinamik	
Operatori :		KRM "Pastrimi"				Nr.	
Menaxheri i projektit :		Lumnije Hyseni				Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :		1.Xhevdet Ibrahimaj, 2. Qëndresa Ramadani.					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	1. Mbledhja, largimi dhe transportimi i mbeturinave të amvisërisë, bizneseve dhe shtazore; 2. Mbledhja, largimi dhe transportimi i mbetjeve urbane-inerte dhe atyre të vëllimshme; 3. Mbledhja dhe largimi i mbetjeve inerte; 4. Faturimi dhe shpërndarje e faturave për mbeturina; 5. Larja dhe dezinfektimi i lokacioneve dhe kontejnerëve; 6. Lokimi dhe dislokimi i kontejnerëve sipas kërkesës nga ana e Komunës.					
	Punët në realizim	Të gjitha pikat e lartcekura					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni (VII)	
Vonesat, Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		Për arritjen e evitimit të deponive ilegale rekomandojmë që pas largimit të mbeturinave, të vendosen rrethojat në hapësirat e pastruara dhe mundësisht të bëhet gjelbërimi i tyre.					
Vlerësimi i progresit në projekt							




		RAPORTI MBIKËQYRËS				04	
Projekti :		Ngritja e vendkalimeve të këmbësorëve dhe vendosja e paneleve ndriçuese				Vlera e projektit: €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës				Plani dinamik	
Operatori :		"Infotrast" SHPK				Nr.616-19-5692-5-2-1 dt. 04,10,2019	
Menaxheri i projektit :		Xhymshit Gashi				Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :		Halil Halili					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Vendosja e paneleve ndriçuese; Ngritja e vendkalimeve të këmbësorëve.					
	Punët në realizim	Ndërtimi i ishujve, Vendosja e zebrave drithëruese.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
Vonesat, Shkalla e cilësisë		Punimi i ishujve neglizhim i punës, ende nuk është mbjellur bari. Problemi i vendosjes së zebrave drithëruese është që nga përshkrimi teknik i tyre, e deri te dëmtimi i tyre brenda një periudhe të shkurtër kohore. Neglizhimi i punëve dhe tejkalimi i afateve kohore për realizimin e kontratës edhe përkundër angazhimit, thirrjeve dhe vërejtjeve tona të vazhdueshme për ngritje të cilësisë së punimeve dhe për përfundim të projektit.					
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		Kompania ka bërë vazhdim të sigurimit të ekzekutimit të punimeve, në bazë të kërkesës sonë. Ftesa për ngritje të cilësisë së punimeve, për përmirësim të zebrave të dëmtuara dhe vazhdimi i vendosjes së zebrave drithëruese në lokacionet e reja të përcaktuara nga ana jonë. Përfundimi i punës së ishujve.					


	Ende nuk ka filluar me përmirësimin e zebrave të dëmtuara dhe ishujve të papërfunduar.
Vlerësimi i progresit në projekt	Edhe pas rekomandimeve tona për përmirësime të cilësisë dhe përfundim të punimeve ende nuk i ka filluar.


		RAPORTI MBIKËQYRËS				05	
Projekti :		Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e parë				Vlera e projektit: 138,255.87 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës				Plani dinamik	
Operatori :		“VZ Company” SHPK				Nr.616 18 015 211 dt. 29.05.2018	
Menaxheri i projektit :		Dukagjin Gashi				Projekti i vitit: 2018-2020	
Organi mbikëqyrës :		Halil Halili Xhemajl Vllasaliu					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 1 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 6 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 29 rrugë; Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 166 rrugë.					
	Punët në realizim	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 1 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 6 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 29 rrugë; Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 166 rrugë.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		15,704.34	15,346.49	15,704.34			
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							

		RAPORTI MBIKËQYRËS				06	
Projekti :		Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e dytë				Vlera e projektit: 113,177.98 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës				Plani dinamik	
Operatori :		"Toifor" SHPK				Nr.616 18 015 211 dt. 03.04.2019	
Menaxheri i projektit :		Dukagjin Gashi				Projekti i vitit: 2019-2020	
Organi mbikëqyrës :		Halil Halili Bashkim Sadiku					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 2 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 2 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 27 rrugë; Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 128 rrugë.					
	Punët në realizim	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 2 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 2 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 27 rrugë; Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 128 rrugë.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		19,256.13	18,749.96	19,256.13			
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							


LOTI 2

		RAPORTI MBIKËQYRËS				07	
Projekti :		Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e tretë				Vlera e projektit: 284,997.96 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës				Plani dinamik	
Operatori :		NPN "Dardania"				Nr.616 18 015 211 dt.29.05.2018	
Menaxheri i projektit :		Dukagjin Gashi				Projekti i vitit: 2018-2020	
Organi mbikëqyrës :		Halil Halili Xhemajl Vllasaliu					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Larja e rrugëve të kategorisë A/ shesheve (rrugët 4 herë në javë/ sheshet 7 herë në javë) : 16 hapësira publike; Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 24 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 20 rrugë; Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 60 rrugë.					
	Punët në realizim	Larja e rrugëve të kategorisë A/ shesheve (rrugët 4 herë në javë/ sheshet 7 herë në javë) : 16 hapësira publike; Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 24 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 20 rrugë; Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 60 rrugë.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		24,224.48	23,515.92	23,710.65			
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							

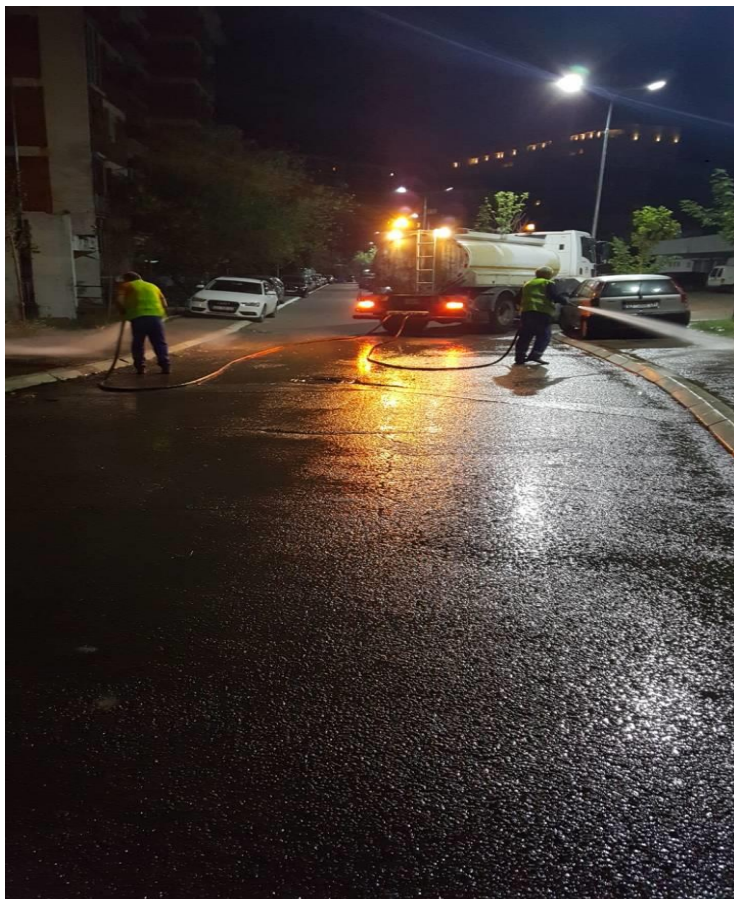
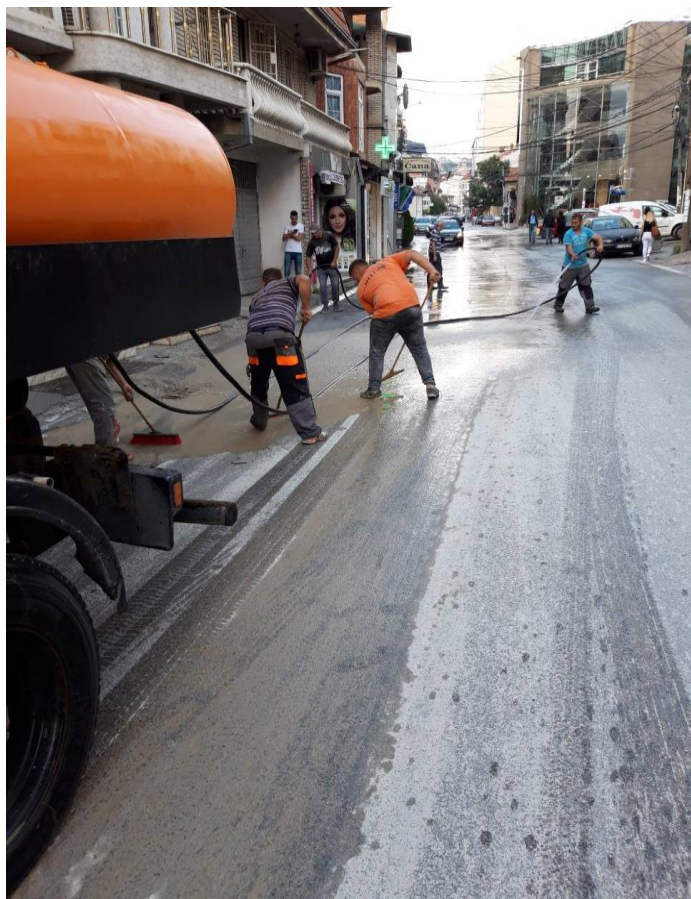
		RAPORTI MBIKËQYRËS				08	
Projekti :		Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e katërt				Vlera e projektit: 187,823.26 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës				Plani dinamik	
Operatori :		Niti - N				Nr.616 18 015 211 dt.29.05.2018	
Menaxheri i projektit :		Dukagjin Gashi				Projekti i vitit: 2018-2020	
Organi mbikëqyrës :		Bashkim Sadiku Enver Kadriu					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 2 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 5 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 35 rrugë; Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 99 rrugë.					
	Punët në realizim	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 2 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 5 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 35 rrugë; Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 99 rrugë.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		20,459.26	20,779.27	21,360.19			
Vonesat							
Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							


		RAPORTI MBIKËQYRËS				09	
Projekti :		Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e pestë				Vlera e projektit: 192,896.00 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës				Plani dinamik	
Operatori :		NSHT “Zahiri”				Nr.616 18 015 211 dt.29.05.2018	
Menaxheri i projektit :		Dukagjin Gashi				Projekti i vitit: 2018-2020	
Organi mbikëqyrës :		Afrim Gashi Enver Kadriu					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 7 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 27 rrugë; Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 114 rrugë.					
	Punët në realizim	Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 7 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 27 rrugë; Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 114 rrugë.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		21,327.55	18,436.48	19,637.14			
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							

LOTI 5


		RAPORTI MBIKËQYRËS				10	
Projekti :		Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e gjashtë				Vlera e projektit: 192,896.00 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës				Plani dinamik	
Operatori :		KRM "Pastrimi"				Nr.616 18 015 211 dt.29.05.2018	
Menaxheri i projektit :		Dukagjin Gashi				Projekti i vitit: 2018-2020	
Organi mbikëqyrës :		Afrim Gashi Enver Kadriu					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 8 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 5 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 38 rrugë; Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 116 rrugë.					
	Punët në realizim	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 8 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 5 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 38 rrugë; Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 116 rrugë.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		24,879.59	24,624.08	25,449.03			
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							

LOTI 6



		RAPORTI MBIKËQYRËS					11	
Projekti :		Furnizimi i shtyllave antiparking dhe shtyllave lëvizëse në formë pistoni					Vlera e projektit: 41,500.00 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		“Armakos” SHPK					Nr.616 19 1534 521 121 dt.30.05.2020	
Menaxheri i projektit :		Fatmir Bilalli					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :		Xhemshit Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Vendosja e shtyllave U profil - 10 copë ; Ngjyrosja e rrethojave metalike - 60 m						
	Punët në realizim							
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
Vonesat Shkalla e cilësisë		Nuk ka vonesa, por e kemi shfrytëzuar 30%, për arsye të kërkesës së madhe.						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë								
Vlerësimi i progresit në projekt		Punët kanë përfunduar sipas kontratës.						

PRISHTINA




RAPORTI MBIKËQYRËS

12

Projekti :	RIPARIMI DHE RREGULLIMI I ASHENSORËVE				Vlera e projektit: 200,000.00€
Investuesi :	Komuna e Prishtinës				Plani dinamik
Operatori :	SHPK “EJONA”				Nr.616 19 1538 521 dt. 08.11.2019
Menaxheri i projektit :	Bashkim Sadiku				Projekti i vitit: 2019
Organi mbikëqyrës :	Enver Kadriu				


				Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara					
Vëllimi	Punët e realizuara	Është realizuar vetëm mirëmbajtje në institucione publike komunale.							
	Punët në realizim	Mirëmbajtja në institucione publike komunale dhe fillimi i riparimit të ashensorëve në hyrjet e përcaktuara.							
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)	Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)
		8,432.00 €	8,200.80 €	4,699.00 €	5,435.00 €	2,902.00 €	3,222.80 €	4,426.00 €	3,629.40 €
Vonesat Shkalla e cilësisë		Vonesa ka pasur në caktimin e lokacioneve të ashensorëve për riparim dhe participimi nga qytetarët.							
Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë		Pagesat nga banorët në hyrjet e përcaktuara.							
Vlerësimi i progresit në projekt		Pas pagesave, nga 5 hyrjet të cilaj janë kryer, në pikat e caktuara fillon pastrimi dhe largimi i pjesëve të vjetra dhe përgaditja për vendosjen e pajisjeve të reja.							



		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 13	
Projekti :		Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve dhe vendbanimeve					Vlera e projektit: 593,650.00 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		SHPK "RSM Company"					Nr.616 19 146 511 dt.31.03.2020	
Menaxheri i projektit :		Enver Kadriu					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës		Halil Halili						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Sinjalizimi horizontal – vendkalimet: m ² Sinjalizimi vertikal: copë Lokacionet :						
	Punët në realizim	Sinjalizimi horizontal – vendkalimet, vija ndarëse e shiritave Sinjalizimi vertikal						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		9,400.00						
Vonesat Shkalla e cilësisë		95% janë vonuar porositë dhe realizmi i tyre në terren						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		Nëse OE nuk tregohet më i përgjegjshëm në realizimin e punëve, duhet të shikohet mundësia e shkëputjes së kontratës.						
Vlerësimi i progresit në projekt								




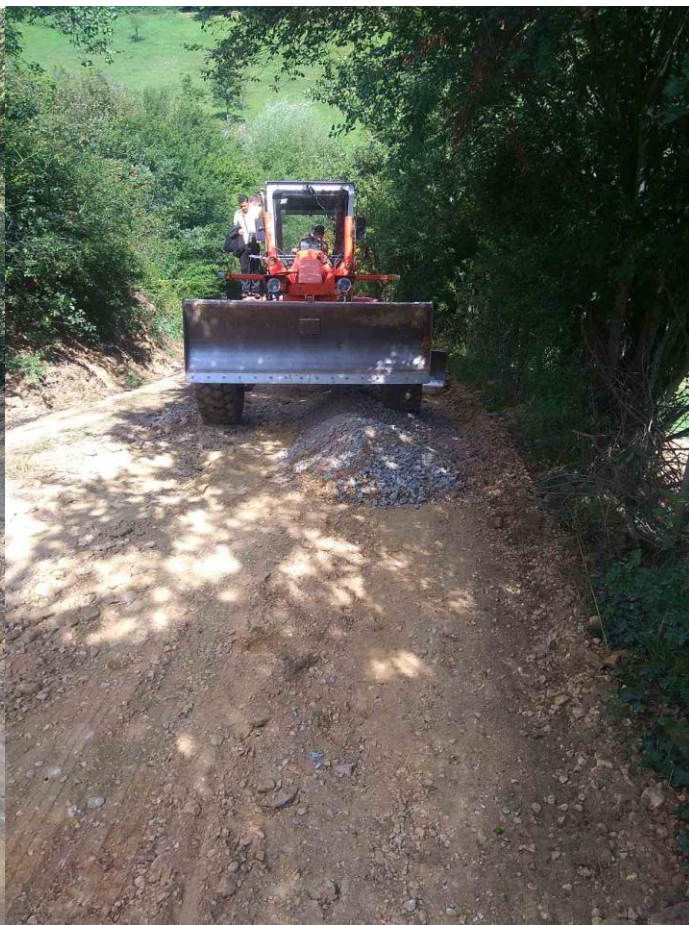
Sinjalizimi horizontal dhe vertikal

		RAPORTI MBIKËQYRËS					14	
Projekti :		Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim atmosferik, fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese, Loti 2.					Vlera e projektit: 25,000.00 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		“NITI-N” SHPK					Nr.616 20 060 521 dt.10.08.2020	
Menaxheri i projektit :		Fatmir Bilalli					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :		Dukagjin Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Fillimi i punëve për renovimin e fontanave; izolim, vendosja e pllakave, dritave dhe reflektorëve; Pastrimi i fontanave dhe monumenteve; Vendosja e dritave – reflektorëve në fontana dhe monumente.						
	Punët në realizim							
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
Vonesat Shkalla e cilësisë		Nuk ka vonesa						
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt		Punët kanë përfunduar sipas kontratës.						




Mirëmbajtja e monumenteve dhe fontanave

		RAPORTI MBIKËQYRËS					15	
Projekti :		Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim atmosferik, fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese, Loti – III					Vlera e projektit: 75,000.00 €	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		“Agro Invest 1” SHPK “Is Company” SHPK					Nr.616 20 060 521 dt.10.08.2020	
Menaxheri i projektit :		Fatmir Bilalli					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :		Xhevdet Ibrahimaj						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Intervenime emergjente në disa rrugë rurale, hapja e kanaleve, si dhe intervenim me eskavator, mbulimi i gropave të shkaktuara nga vërshimet dhe largimi i grumbullimit të mbeturinave nga rruga.						
	Punët në realizim							
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
Vonesat Shkalla e cilësisë								
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë								
Vlerësimi i progresit në projekt								



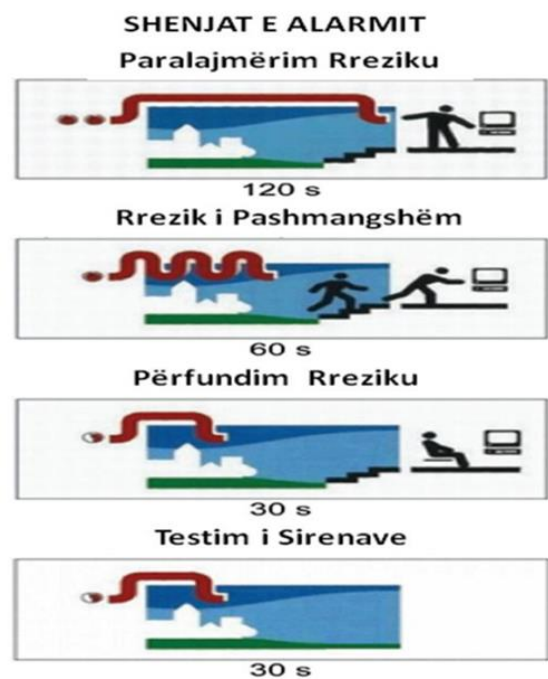


Intervenimet Emergjente

		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 16	
Projekti :		Shërbimi i transportit publik në Komunën e Prishtinës					Vlera e projektit:	
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :		KKP					Nr.616-18-84-215 dt.18.07.2018	
Menaxheri i projektit :		Enver Kadriu Halill Halili					Projekti i vitit: 2018	
Organi mbikëqyrës :								
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara							
	Punët në realizim							
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		438,073.47 €	/	/		/		
Vonesat Shkalla e cilësisë								
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë								
Vlerësimi i progresit në projekt								



Qendra Komunale, pranimi i rasteve-thirrjeve në telefonat kujdestar pa pagesë 24/7"



Testimi i sistemit të alarmimit publik pa zë, më 01.08.2020

RREZIK NGA AJRI - Sinjali i alarmimit rrezik nga ajri është: 60 sekonda zë valor pa ndërprerë.

RREZIK NGA MJETET KIMIKE, BIOLOGJIKE DHE RADIOLOGJIKE - Sinjali i alarmimit rrezik nga mjetet kimike, biologjike dhe radiologjike është: tre zëra valorë nga 20 sekonda, me dy pauza nga 15 sekonda në mes (20 sek. zë valor + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë valor + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë valor).

RREZIK NGA FATKEQËSITË ELEMENTARE DHE NATYRORE - Sinjali i alarmimit rrezik nga fatkeqësitë elementare dhe natyrore është: dy zëra të njëtrajtshëm me nga 20 sekonda dhe një zë valor prej 20 sekondave në mes (20 sek. zë i njëtrajtshëm + 20 sek. zë valor + 20 sek. zë i njëtrajtshëm).

RREZIK NGA ZJARRI - Sinjali i alarmimit rrezik nga zjarri është: tre zëra të njëtrajtshëm nga 20 sekonda dhe dy pauza nga 15 sekonda në mesë (20 sek. zë i njëtrajtshëm + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë i njëtrajtshëm + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë i njëtrajtshëm).

KALIMI I RREZIKUT - Sinjali i alarmimit kalimi i rrezikut është: 60 sekonda zë i njëtrajtshëm pa ndërprerë.



Mirëmbajtja e sistemit të alarmimit publik dhe testimi i tyre çdo muaj, si dhe R-L, kamerave dhe pajisjeve tjera teknike në Qendër.

**Drejtore :
Medina Braha**

Prishtinë, gusht 2020
